


总体城市设计 | 一条不断线的公共基线，三座不同的城市地标


公开城市肌理承担关系判断；所有边界和尺寸仍待官方底图与测绘复核

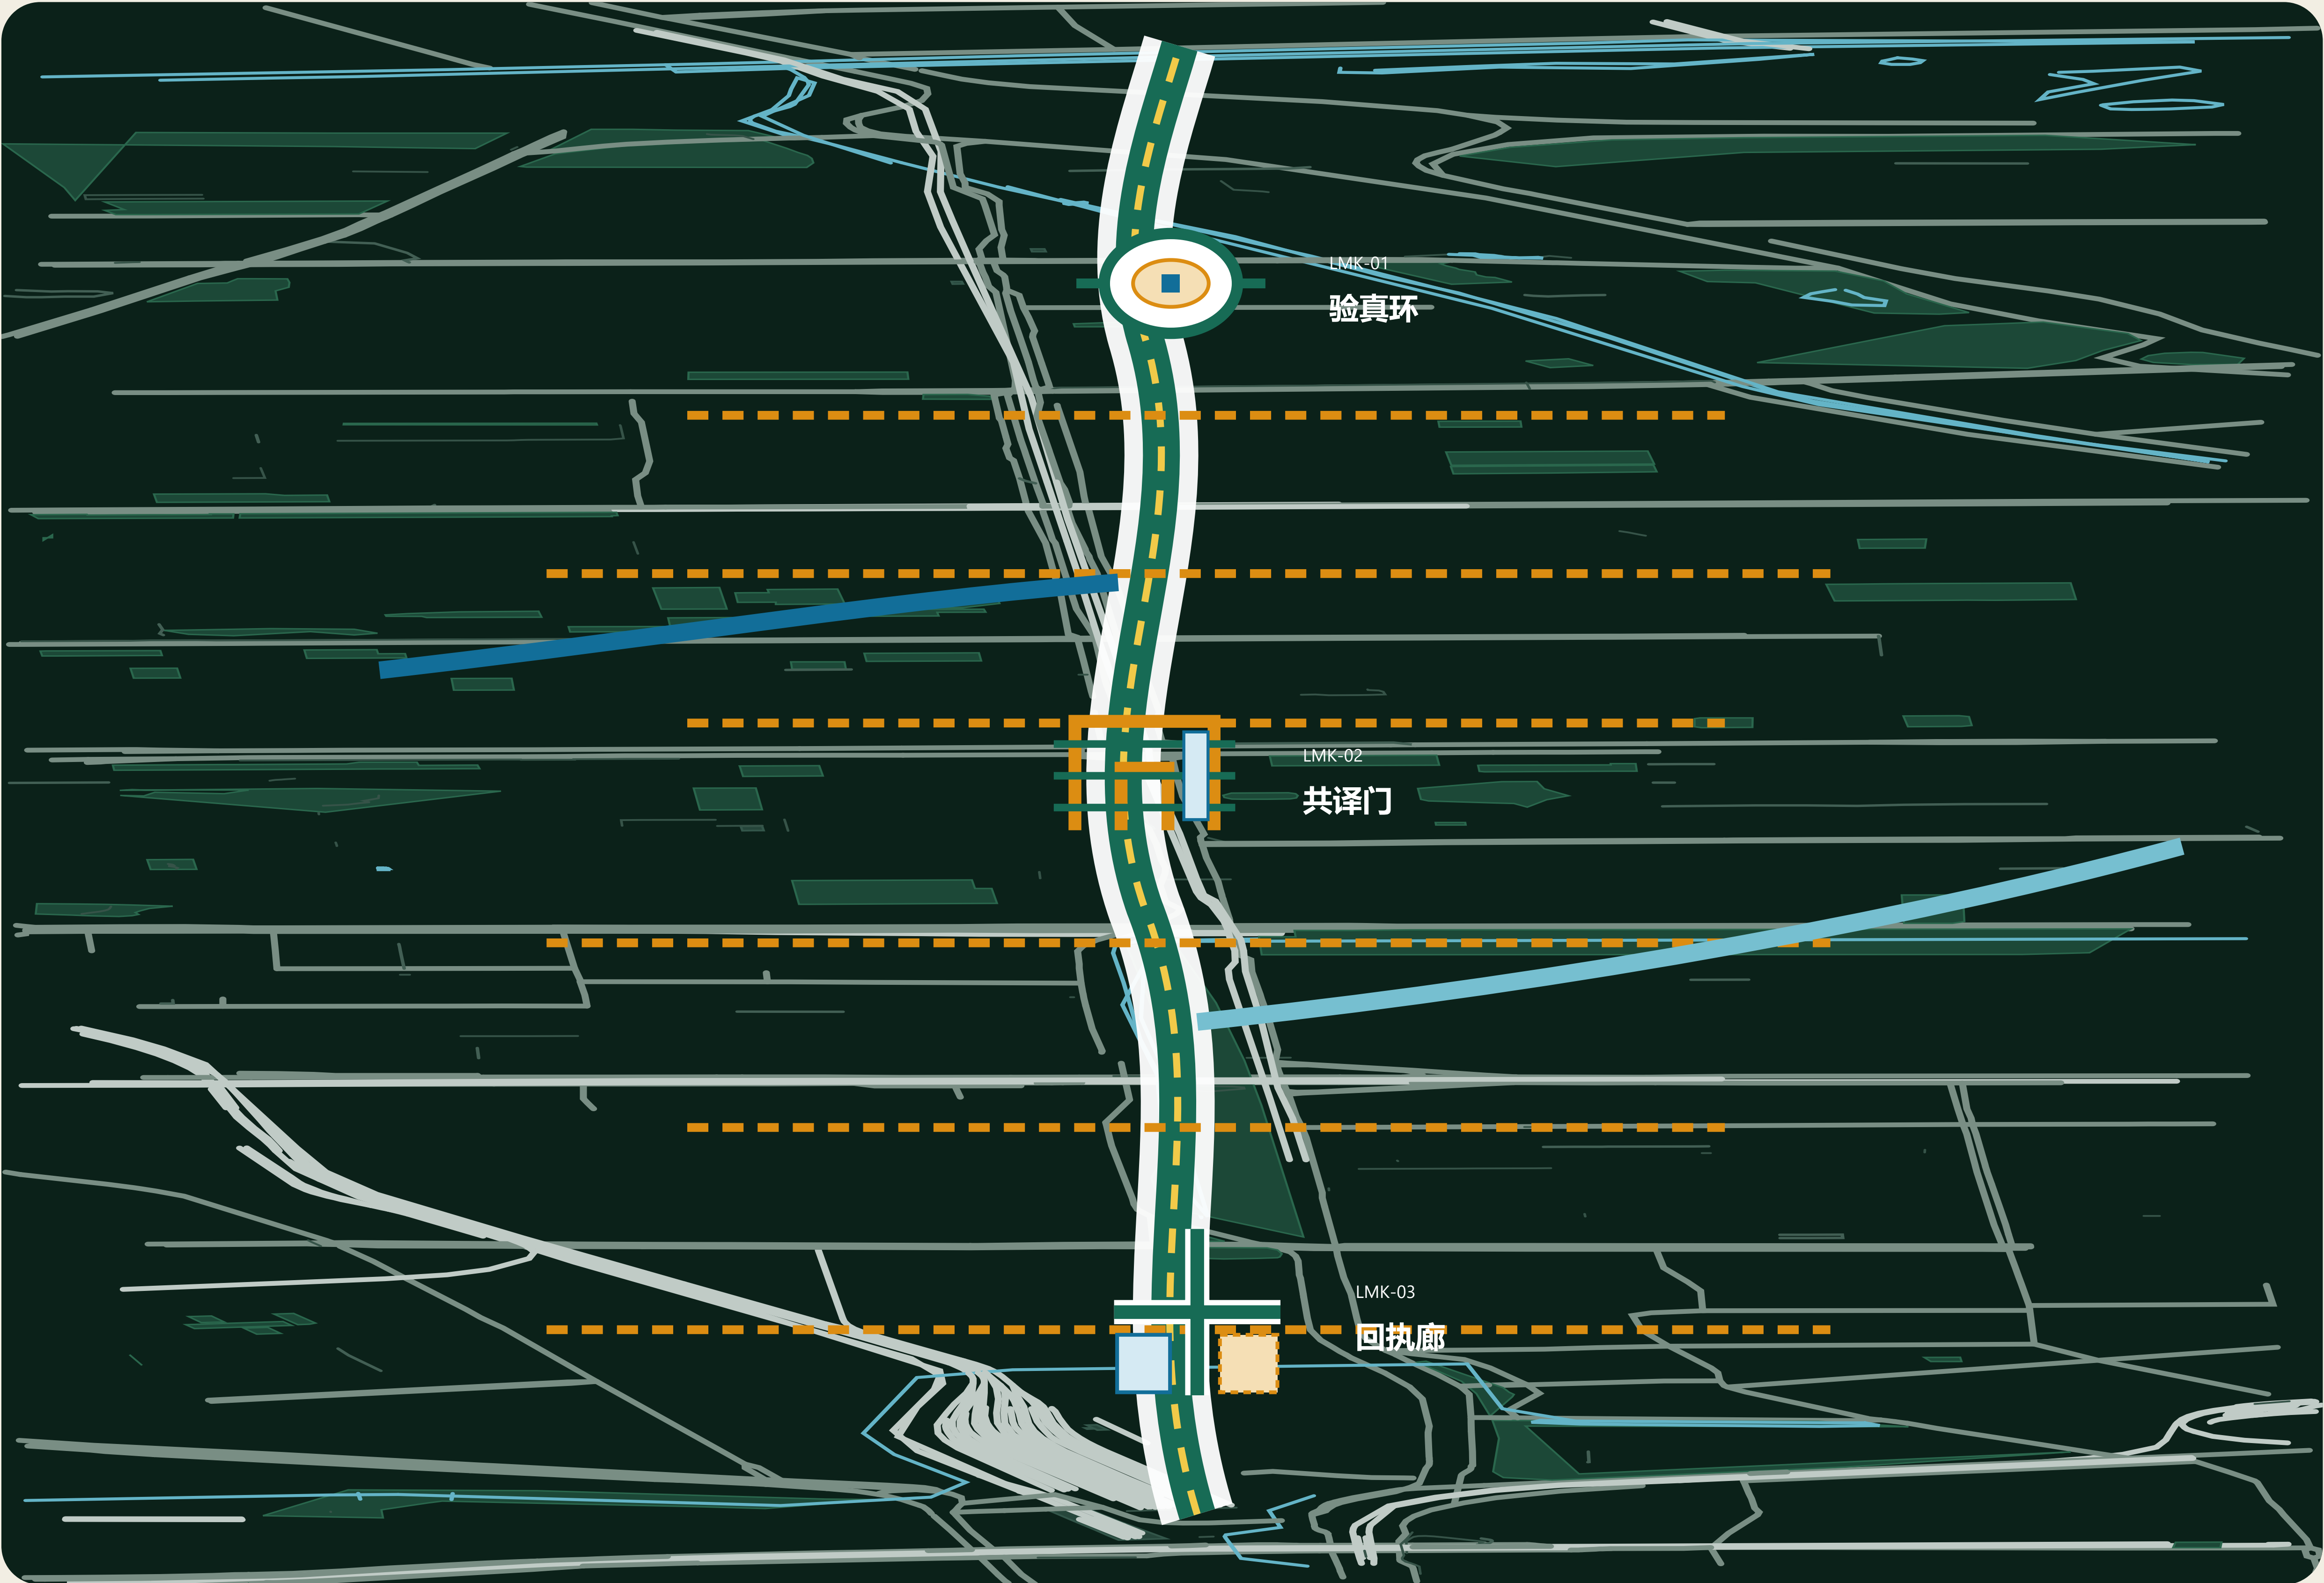

Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13 · 方向性参照 / 临时边界 / 非法定总平面

三座建筑地标 | 环、门、廊共享材料语言，却有不同空间骨架

图关联平面——指同一建筑类型：关联特征仍可关联。入口和内部结构

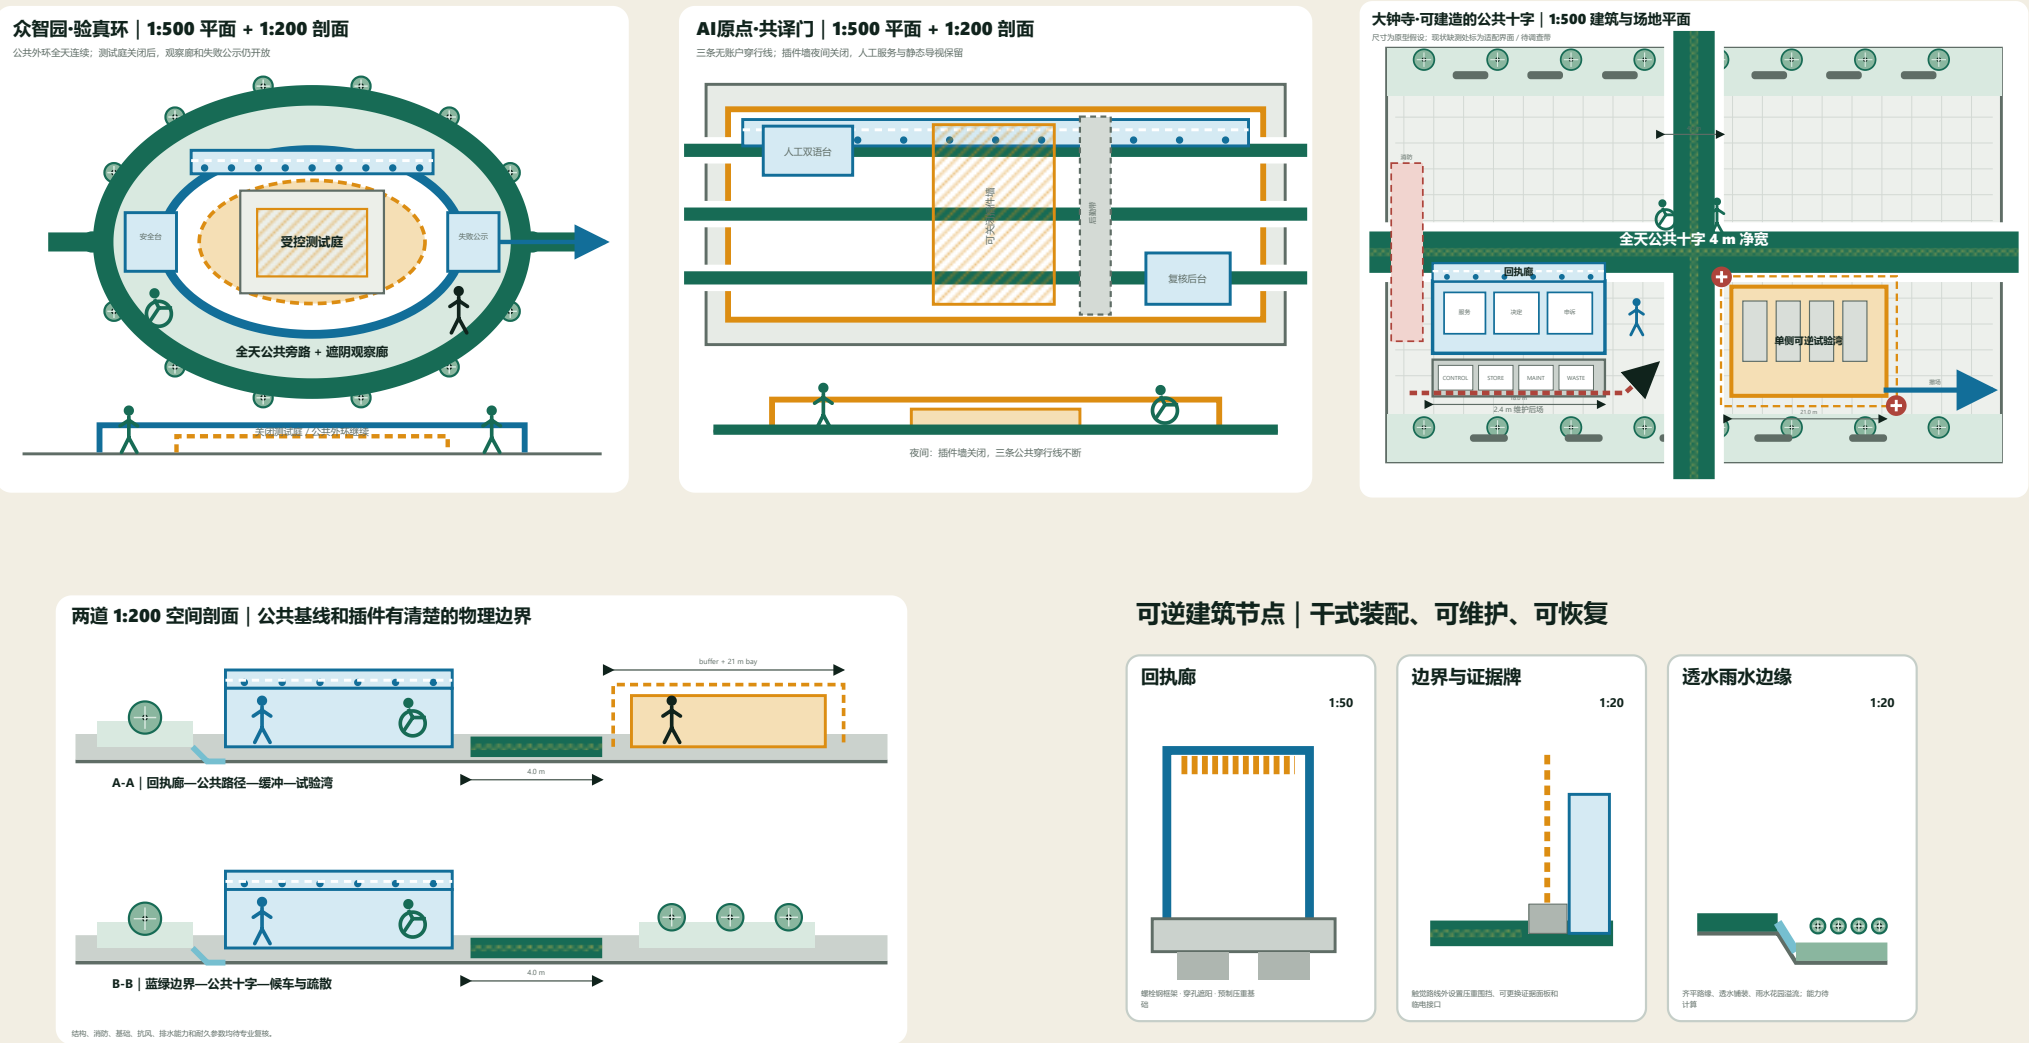

空间判断，不是图标目录

一脊

步行、自行车、无障碍、蓝绿与人工服务先连续

六缝合

每座地标两条东西公共接口，不推定道路红线

两翼

科技服务交换与社区问题进入同一证据链

第一眼结论

ALT-A REJECT


ALT-B REVISE

ALT-C ADVANCE


公共路线一旦被牺牲，空间方案立即出局。

大钟寺·可建造的公共十字 | 1:500 建筑与场地平面

尺寸为原型假设；现状缺测处标为适配界面 / 待调查带

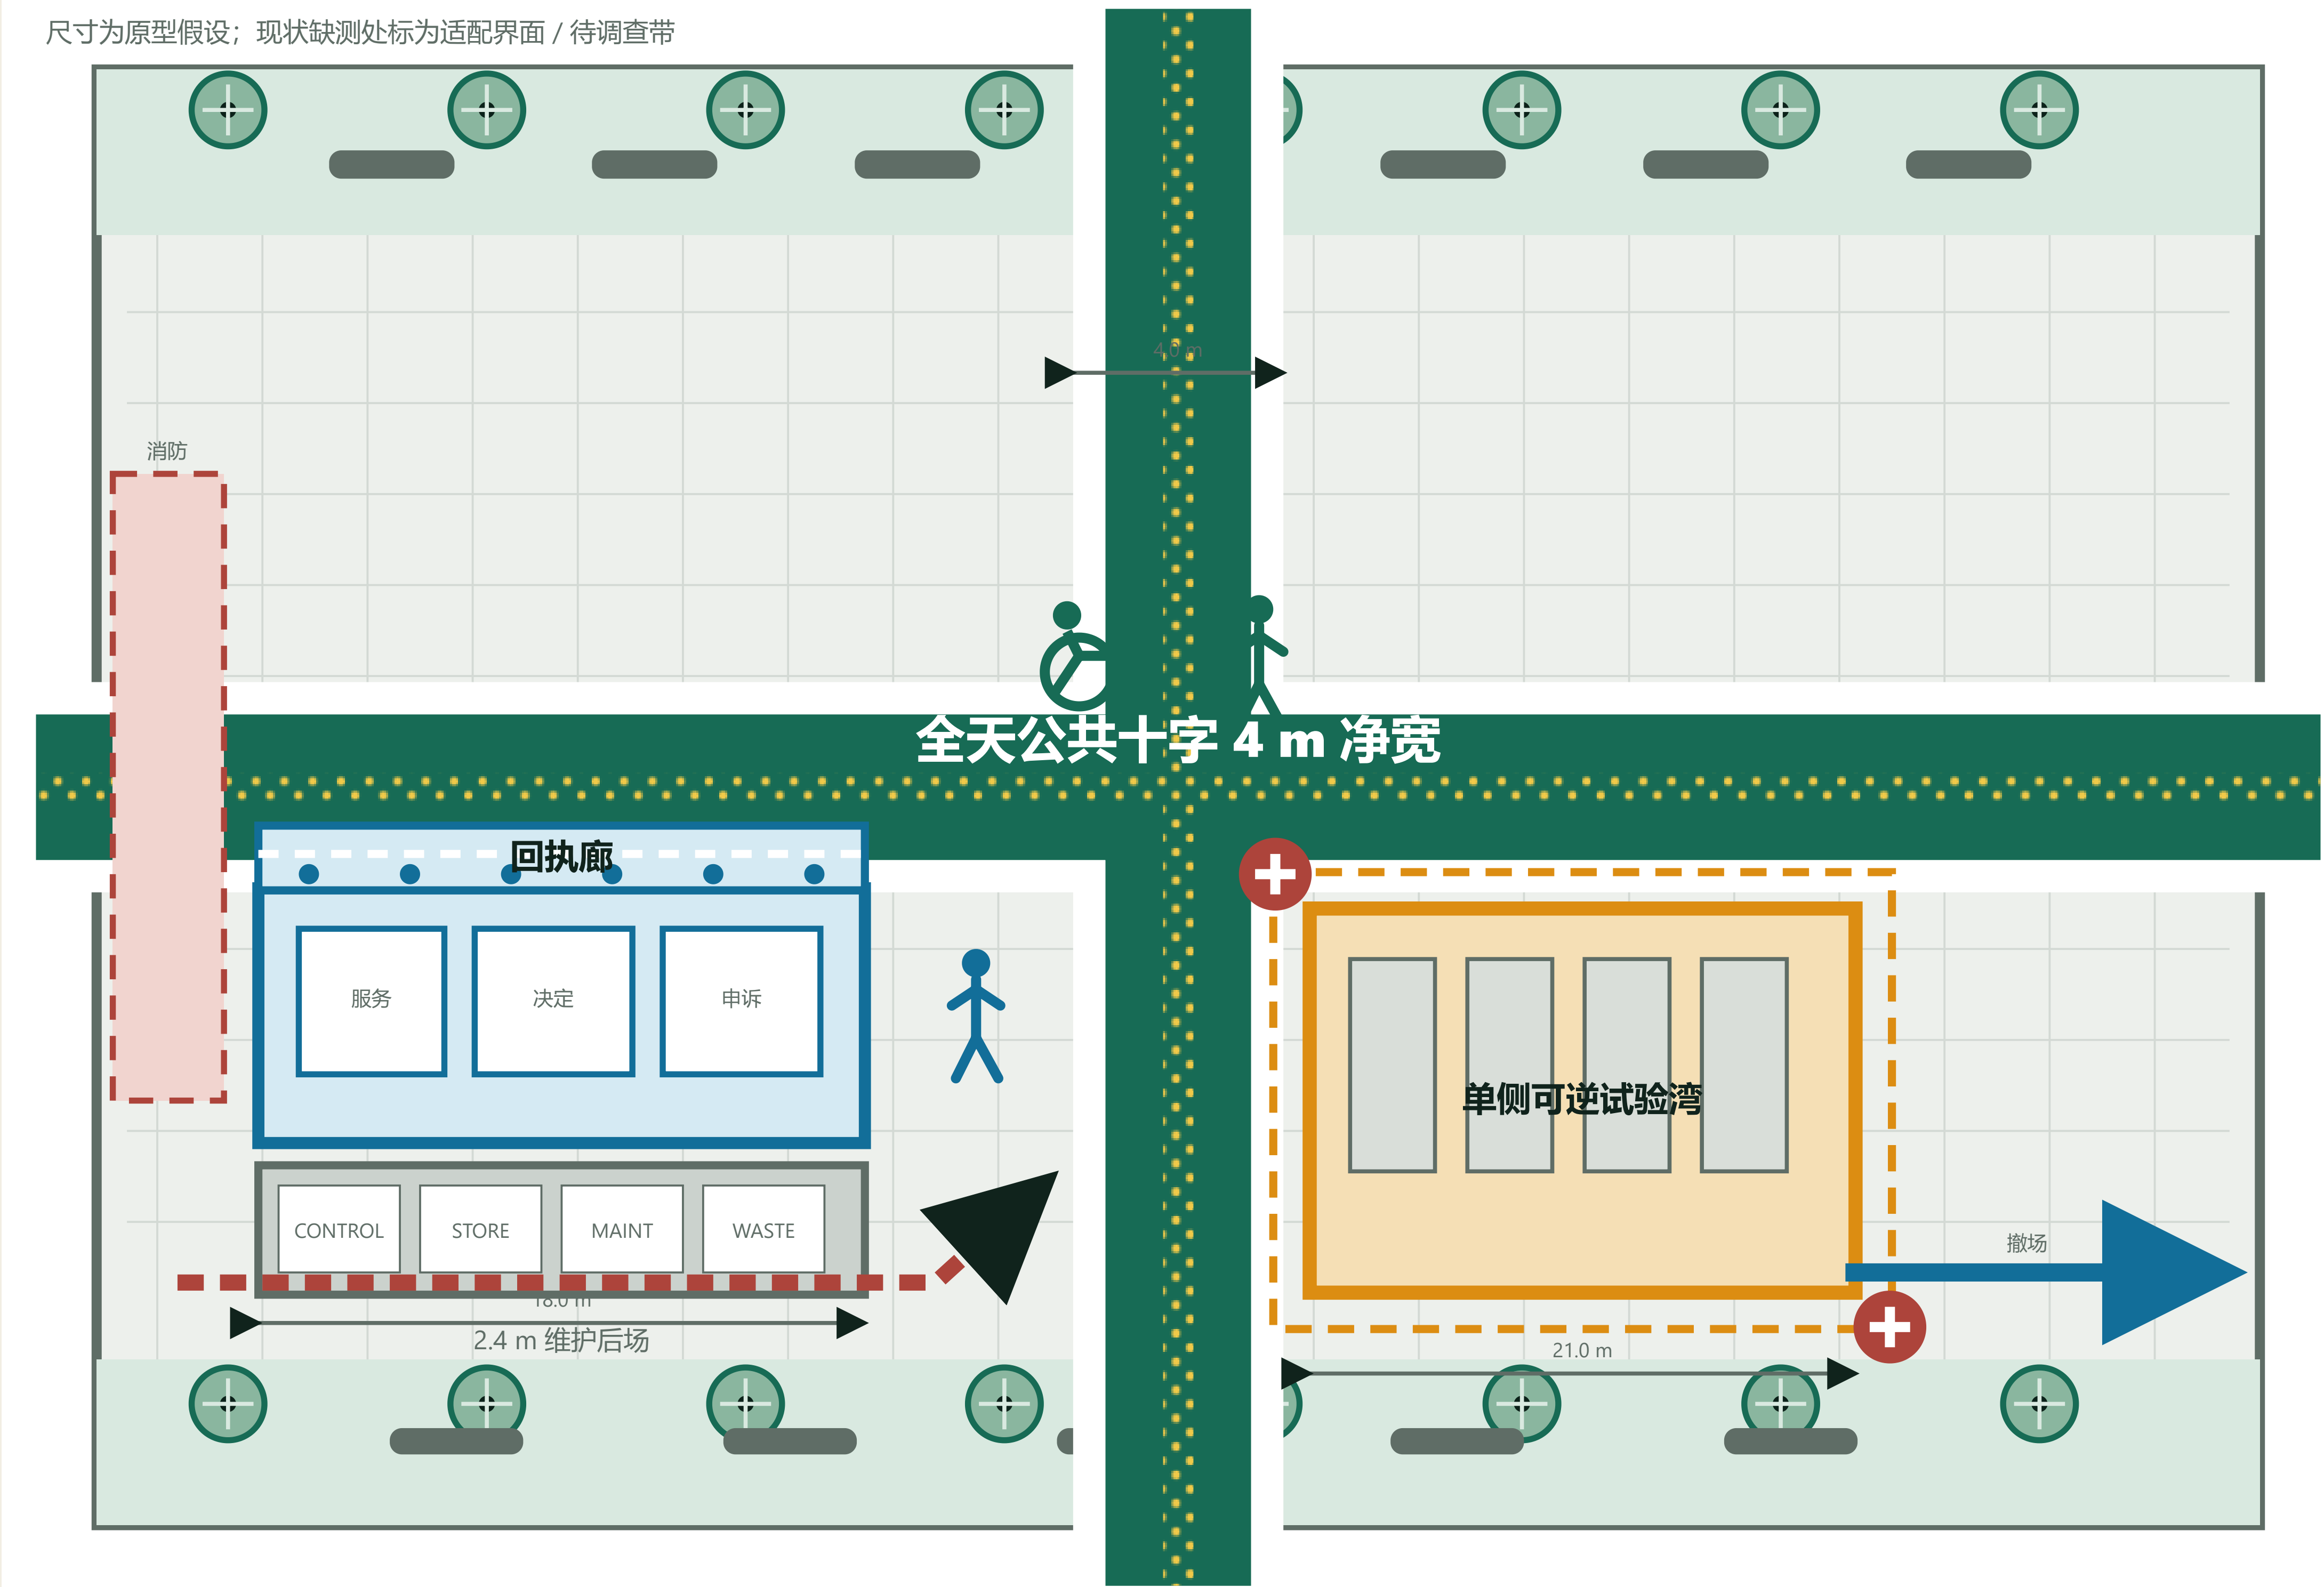


大钟寺剖切装配轴测 | 公共层先建，插件层可拆，证据层有人负责

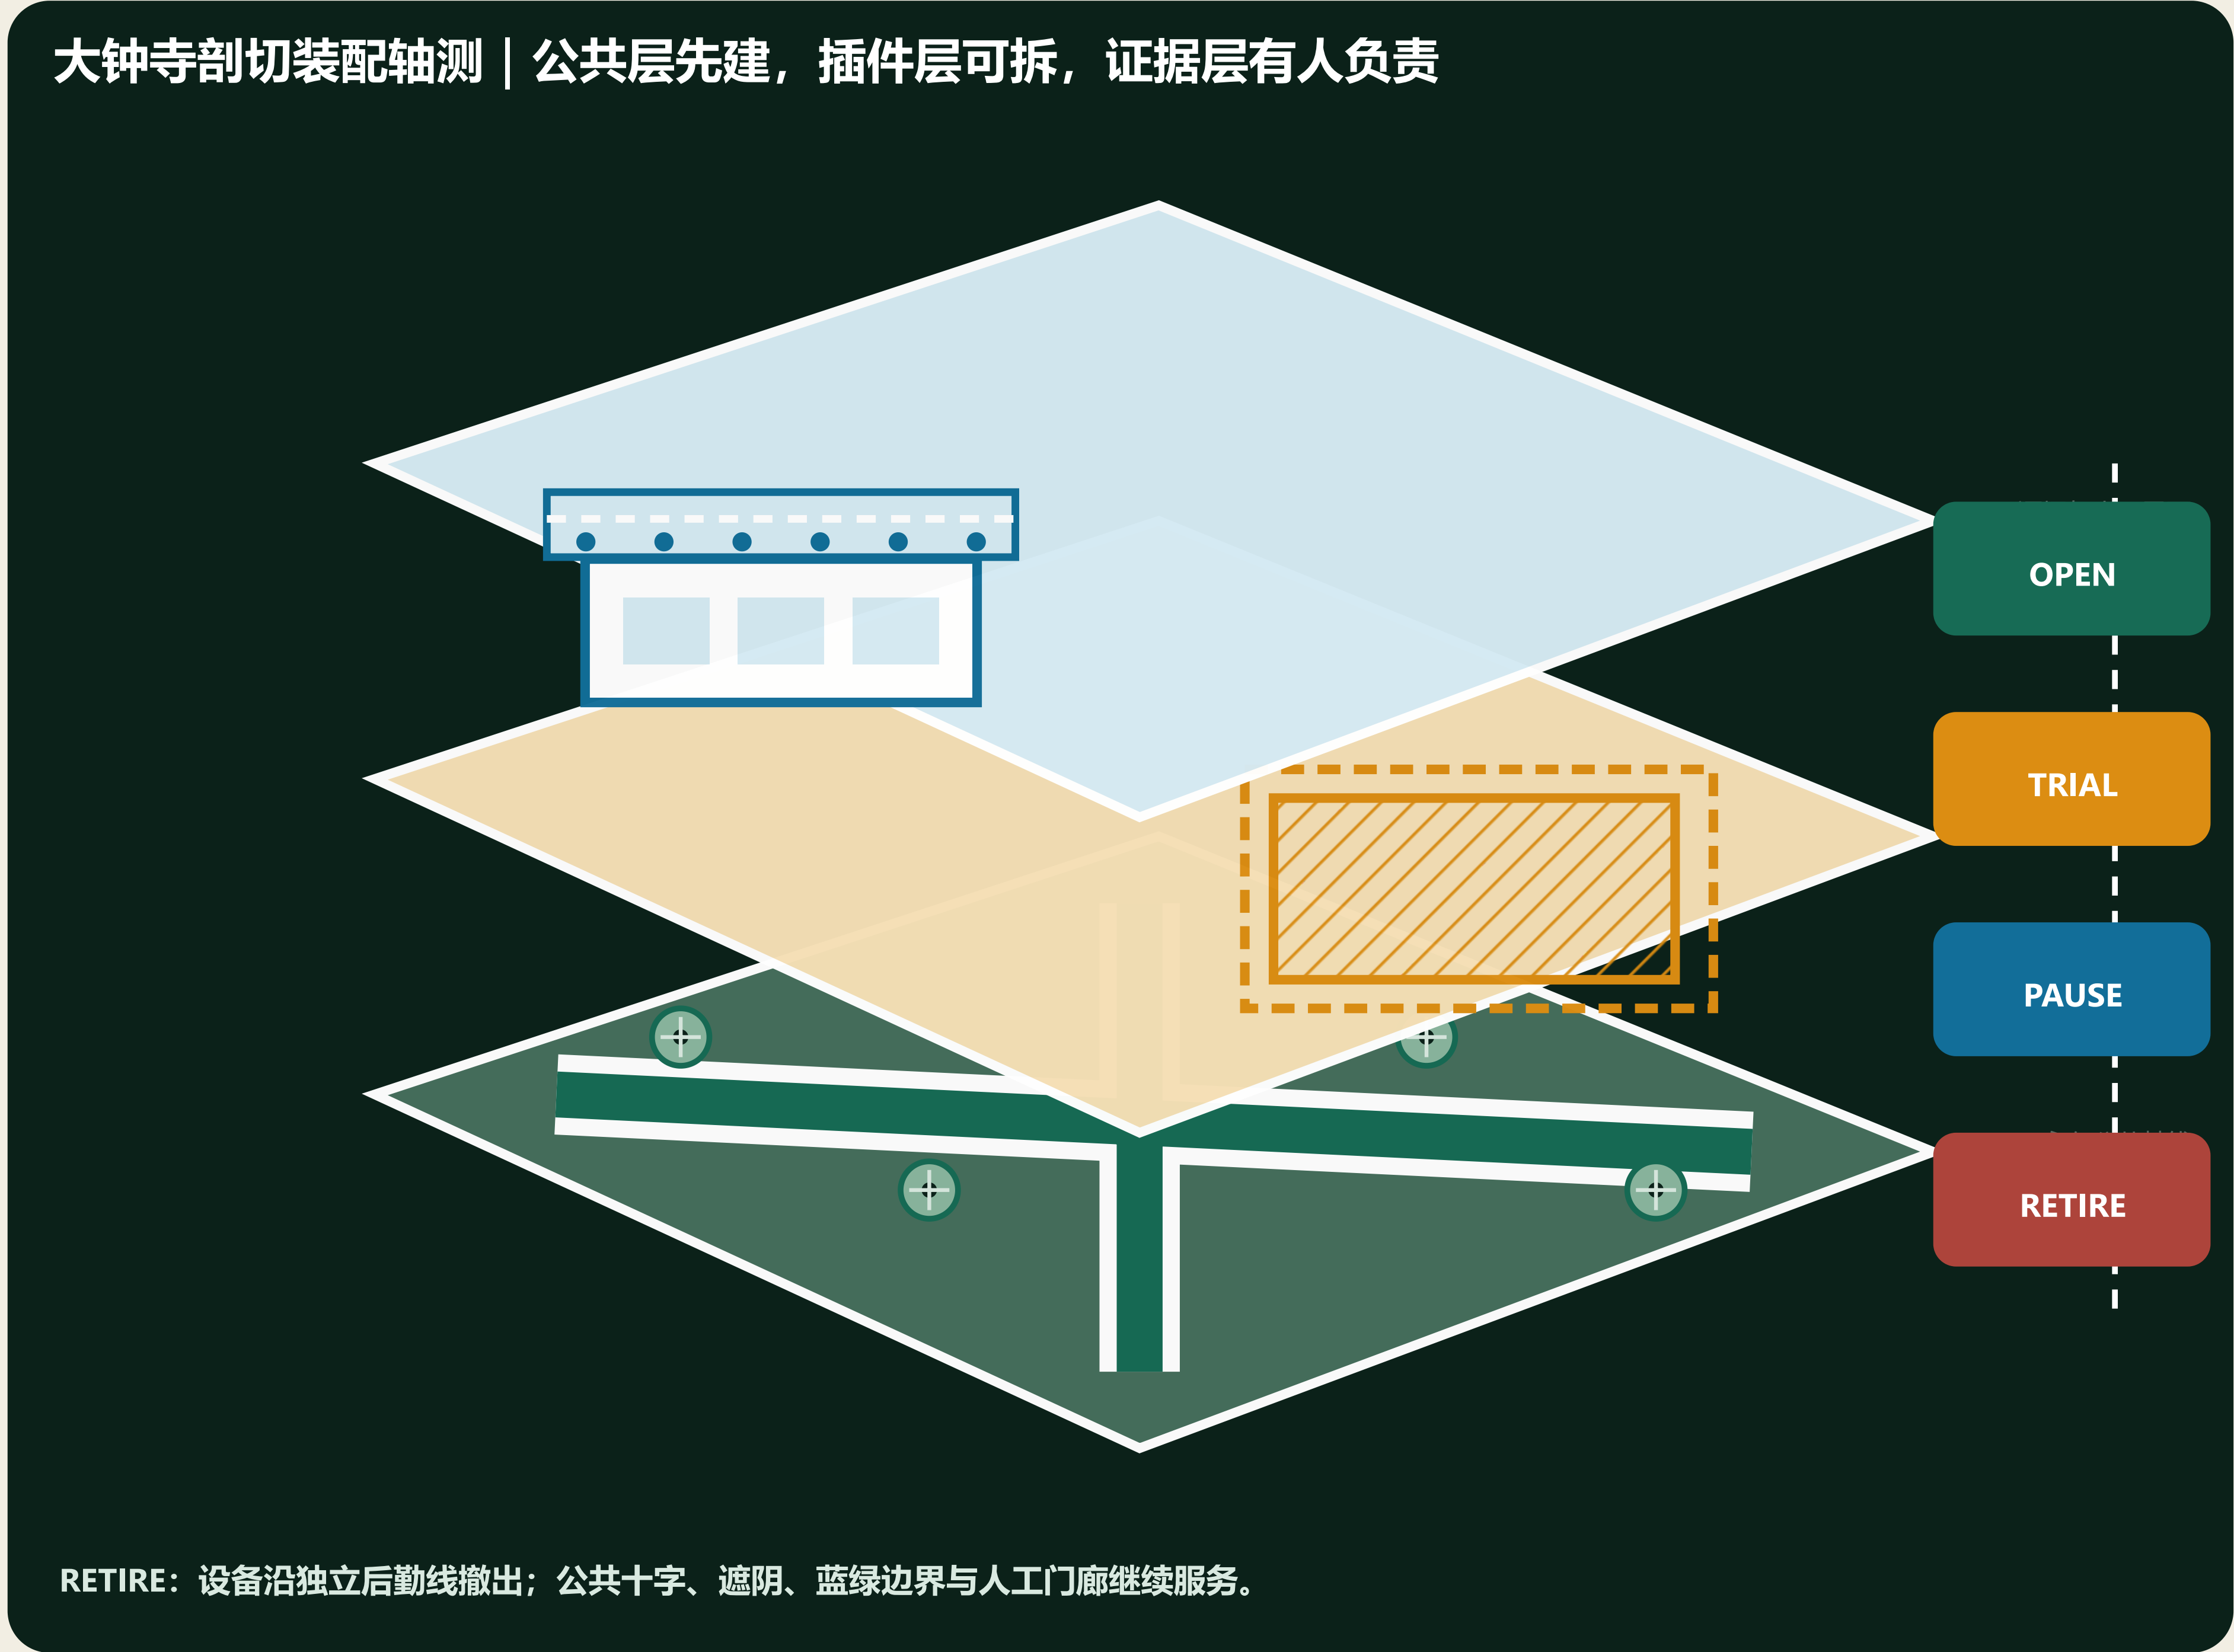


RETIRE：设备沿独立后勤线撤出；公共十字、遮阴、蓝绿边界与人工门廊继续服务。

两道 1:200 空间剖面 | 公共基线和插件有清楚的物理边界

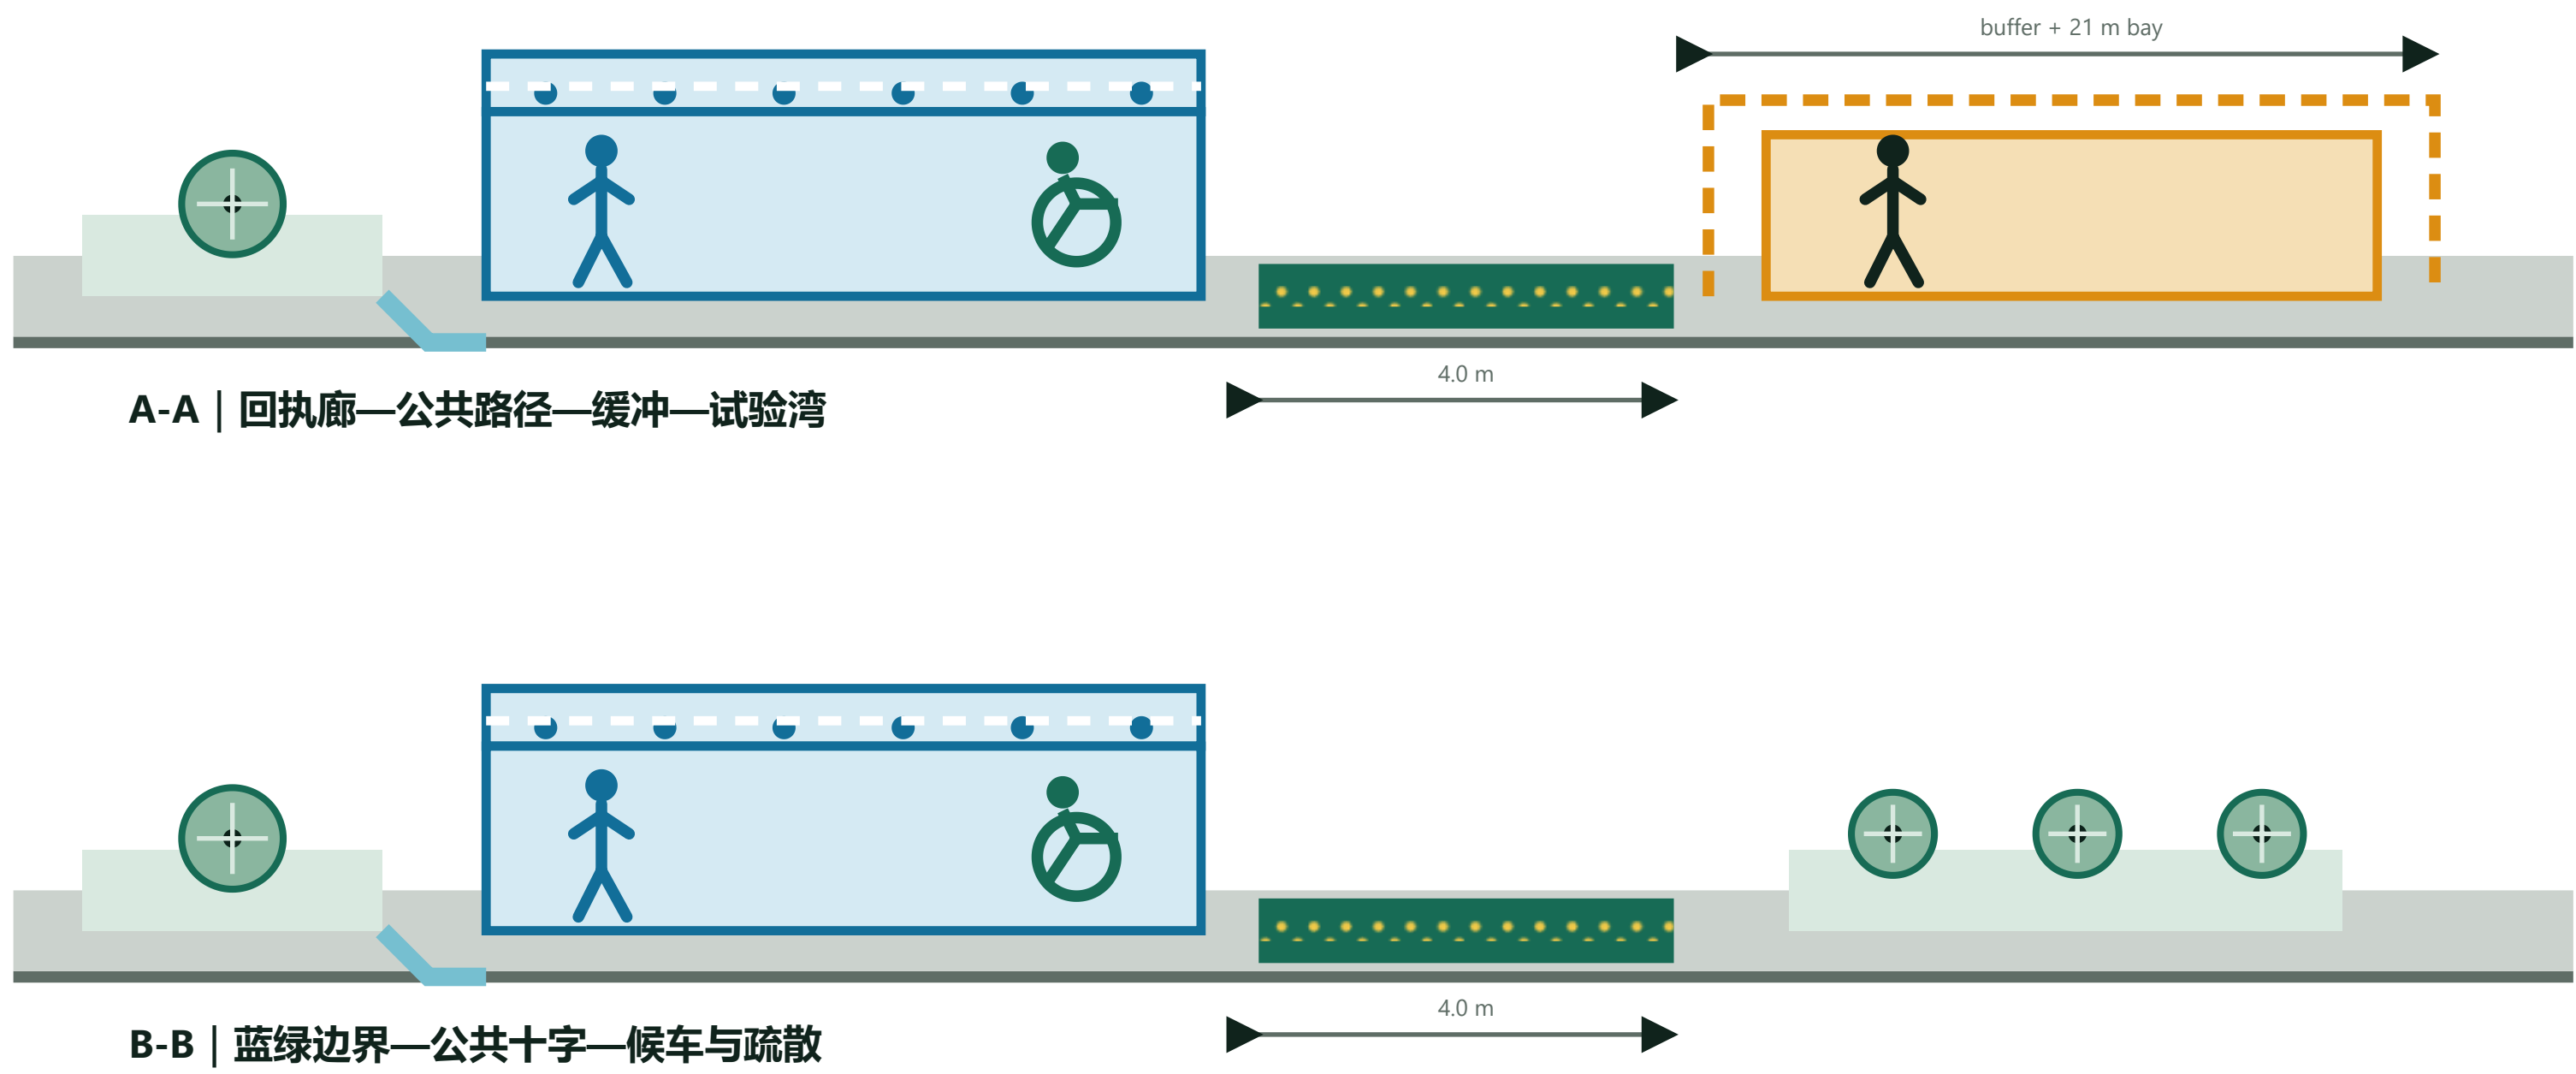

结构、消防、基础、抗风、排水能力和耐久参数均待专业复核。

可逆建筑节点 | 干式装配、可维护、可恢复

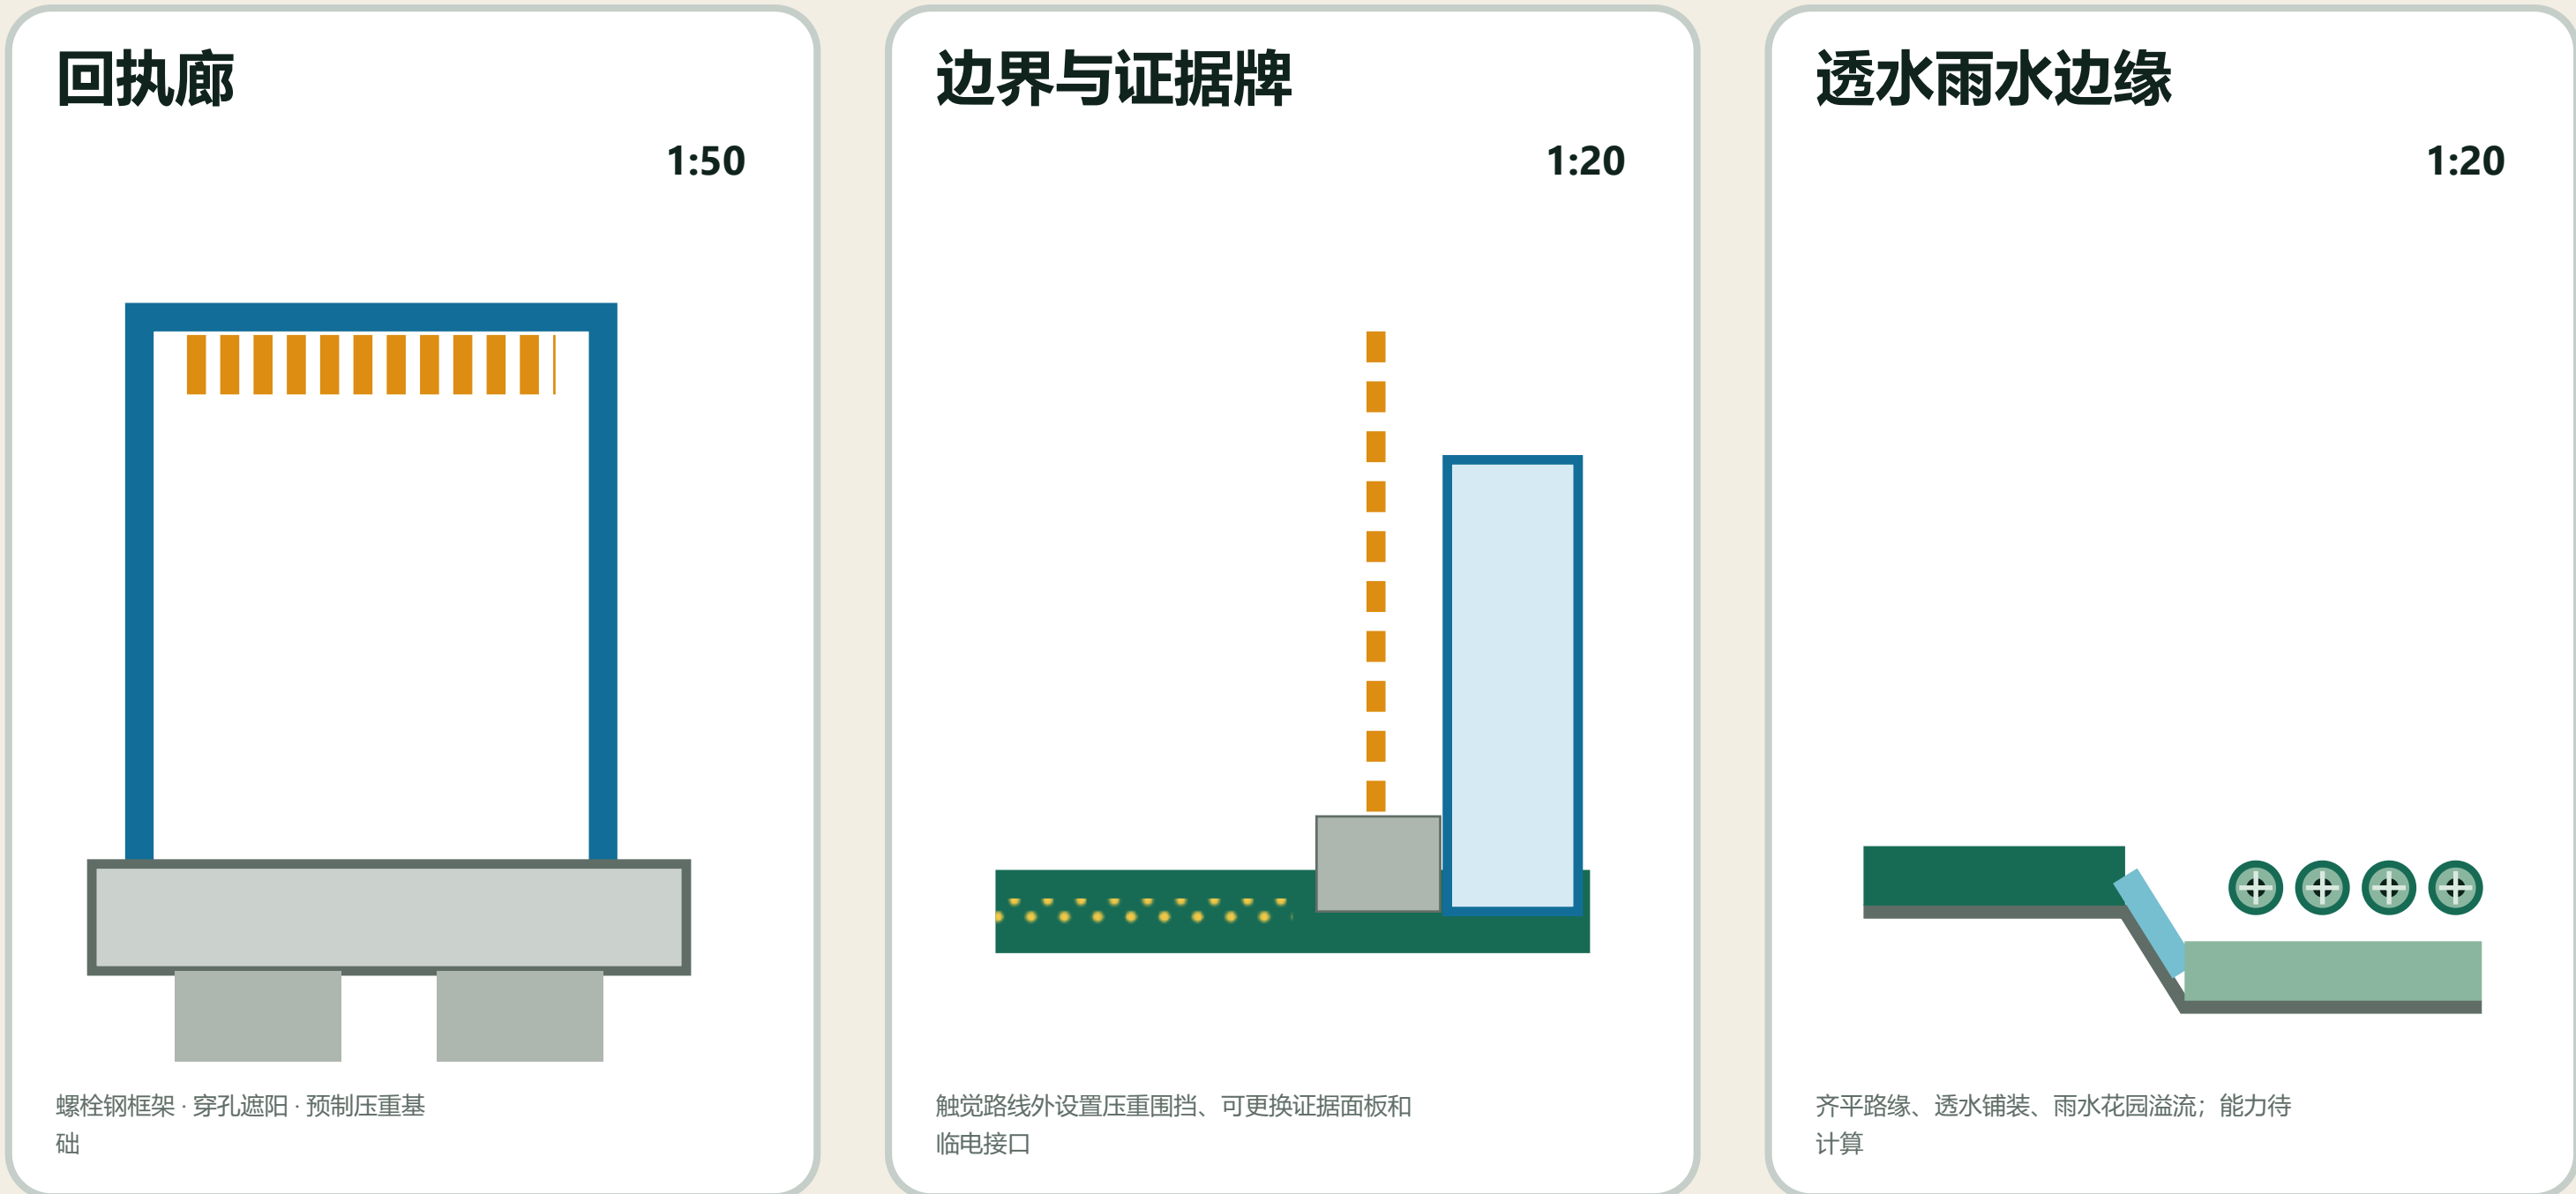

实施闭环 | 空间裁决只出现一次，随后进入许可、建造、维护与退出

现场绩效仍未知；表单和图纸说明如何验证，不表示已经验证

01 同一把尺子的空间裁决

ALT-A REJECT 切断公共十字

ALT-B REVISE 消防/监督/撤场碎片化

ALT-C ADVANCE 公共、试验、后勤三线独立

02 当前 G0：许可与岗位没有关闭

SITE
PENDING

TITLE
PENDING

FIRE
PENDING

ACCESS
PENDING

POWER
PENDING

NETWORK
PENDING

TRAFFIC
PENDING

DEVICE
PENDING

0 / 8 PERMITS · 0 / 7 BASELINE DAYS · 0 / 4 CONTRACTED POSTS
结论：NO-GO，试验湾不得装配

03 90天构件—责任—失败出口

0–15
测绘与八许可
失败 → 不进入下一阶段

16–30
只建公共基线
失败 → 不进入下一阶段

31–45
记录7日普通服务
失败 → 不进入下一阶段

46–75
限时装配插件
失败 → 不进入下一阶段

76–90
暂停演练与撤场
失败 → 不进入下一阶段

MAT-01-05 干式材料家族

RACI

资产/场地/普通服务/安全/数据/公众

RETIRE

设备撤出；公共层保留

12/12测量契约已登记；0项现场结果，价格 pending_market_quote，结构/消防/基础/耐久待专业复核。

G0 NO-GO | 90天不是承诺，而是五道进入条件

普通服务、许可、岗位、基线和撤场演练任一失败，不进入AI试验

DAY 0–15
测绘、权属、站口、消防、管线、无
障碍与交通核验

DAY 16–30
只搭公共路线、候车、遮阳、人工服
务和回快廊

DAY 31–45
记录7个连续普通运行日；不敢AI
设备

DAY 46–75
8类许可 + 4独立岗位齐全后才
可限时试验

DAY 76–90
停止演练、撤场恢复、公众复核与回
执

八类许可 | 当前全部待办

SITE 场地使用与资产方书面同意 ○

TITLE 权属、边界与现状测绘核验 ○

FIRE 消防车道、疏散面与临时构筑物复核 ○

ACCESS 无障碍路线、坡道、盲道和人工服务审计 ○

POWER 临时用电、配电保护与断电责任 ○

NET 隔离网络、数据最小化与日志保存规则 ○

TRAFFIC 临时接驳优先、活动时段与交通组织审批 ○

EQUIP 设备安全、保险、急停与供应商撤场责任 ○

四个岗位必须独立覆盖

01 场地负责人 待落实

02 普通服务人员 待落实

03 安全负责人 待落实

04 数据记录人员 待落实

关键安全岗位与普通服务岗位不得兼任。
单价、总价、合作和许可均未承诺。

ALT裁决只出现一次 · G0 NO-GO · 90天构件—责任—失败出口
