


公开城市肌理承担关系判断；所有边界和尺寸仍待官方底图与测绘复核

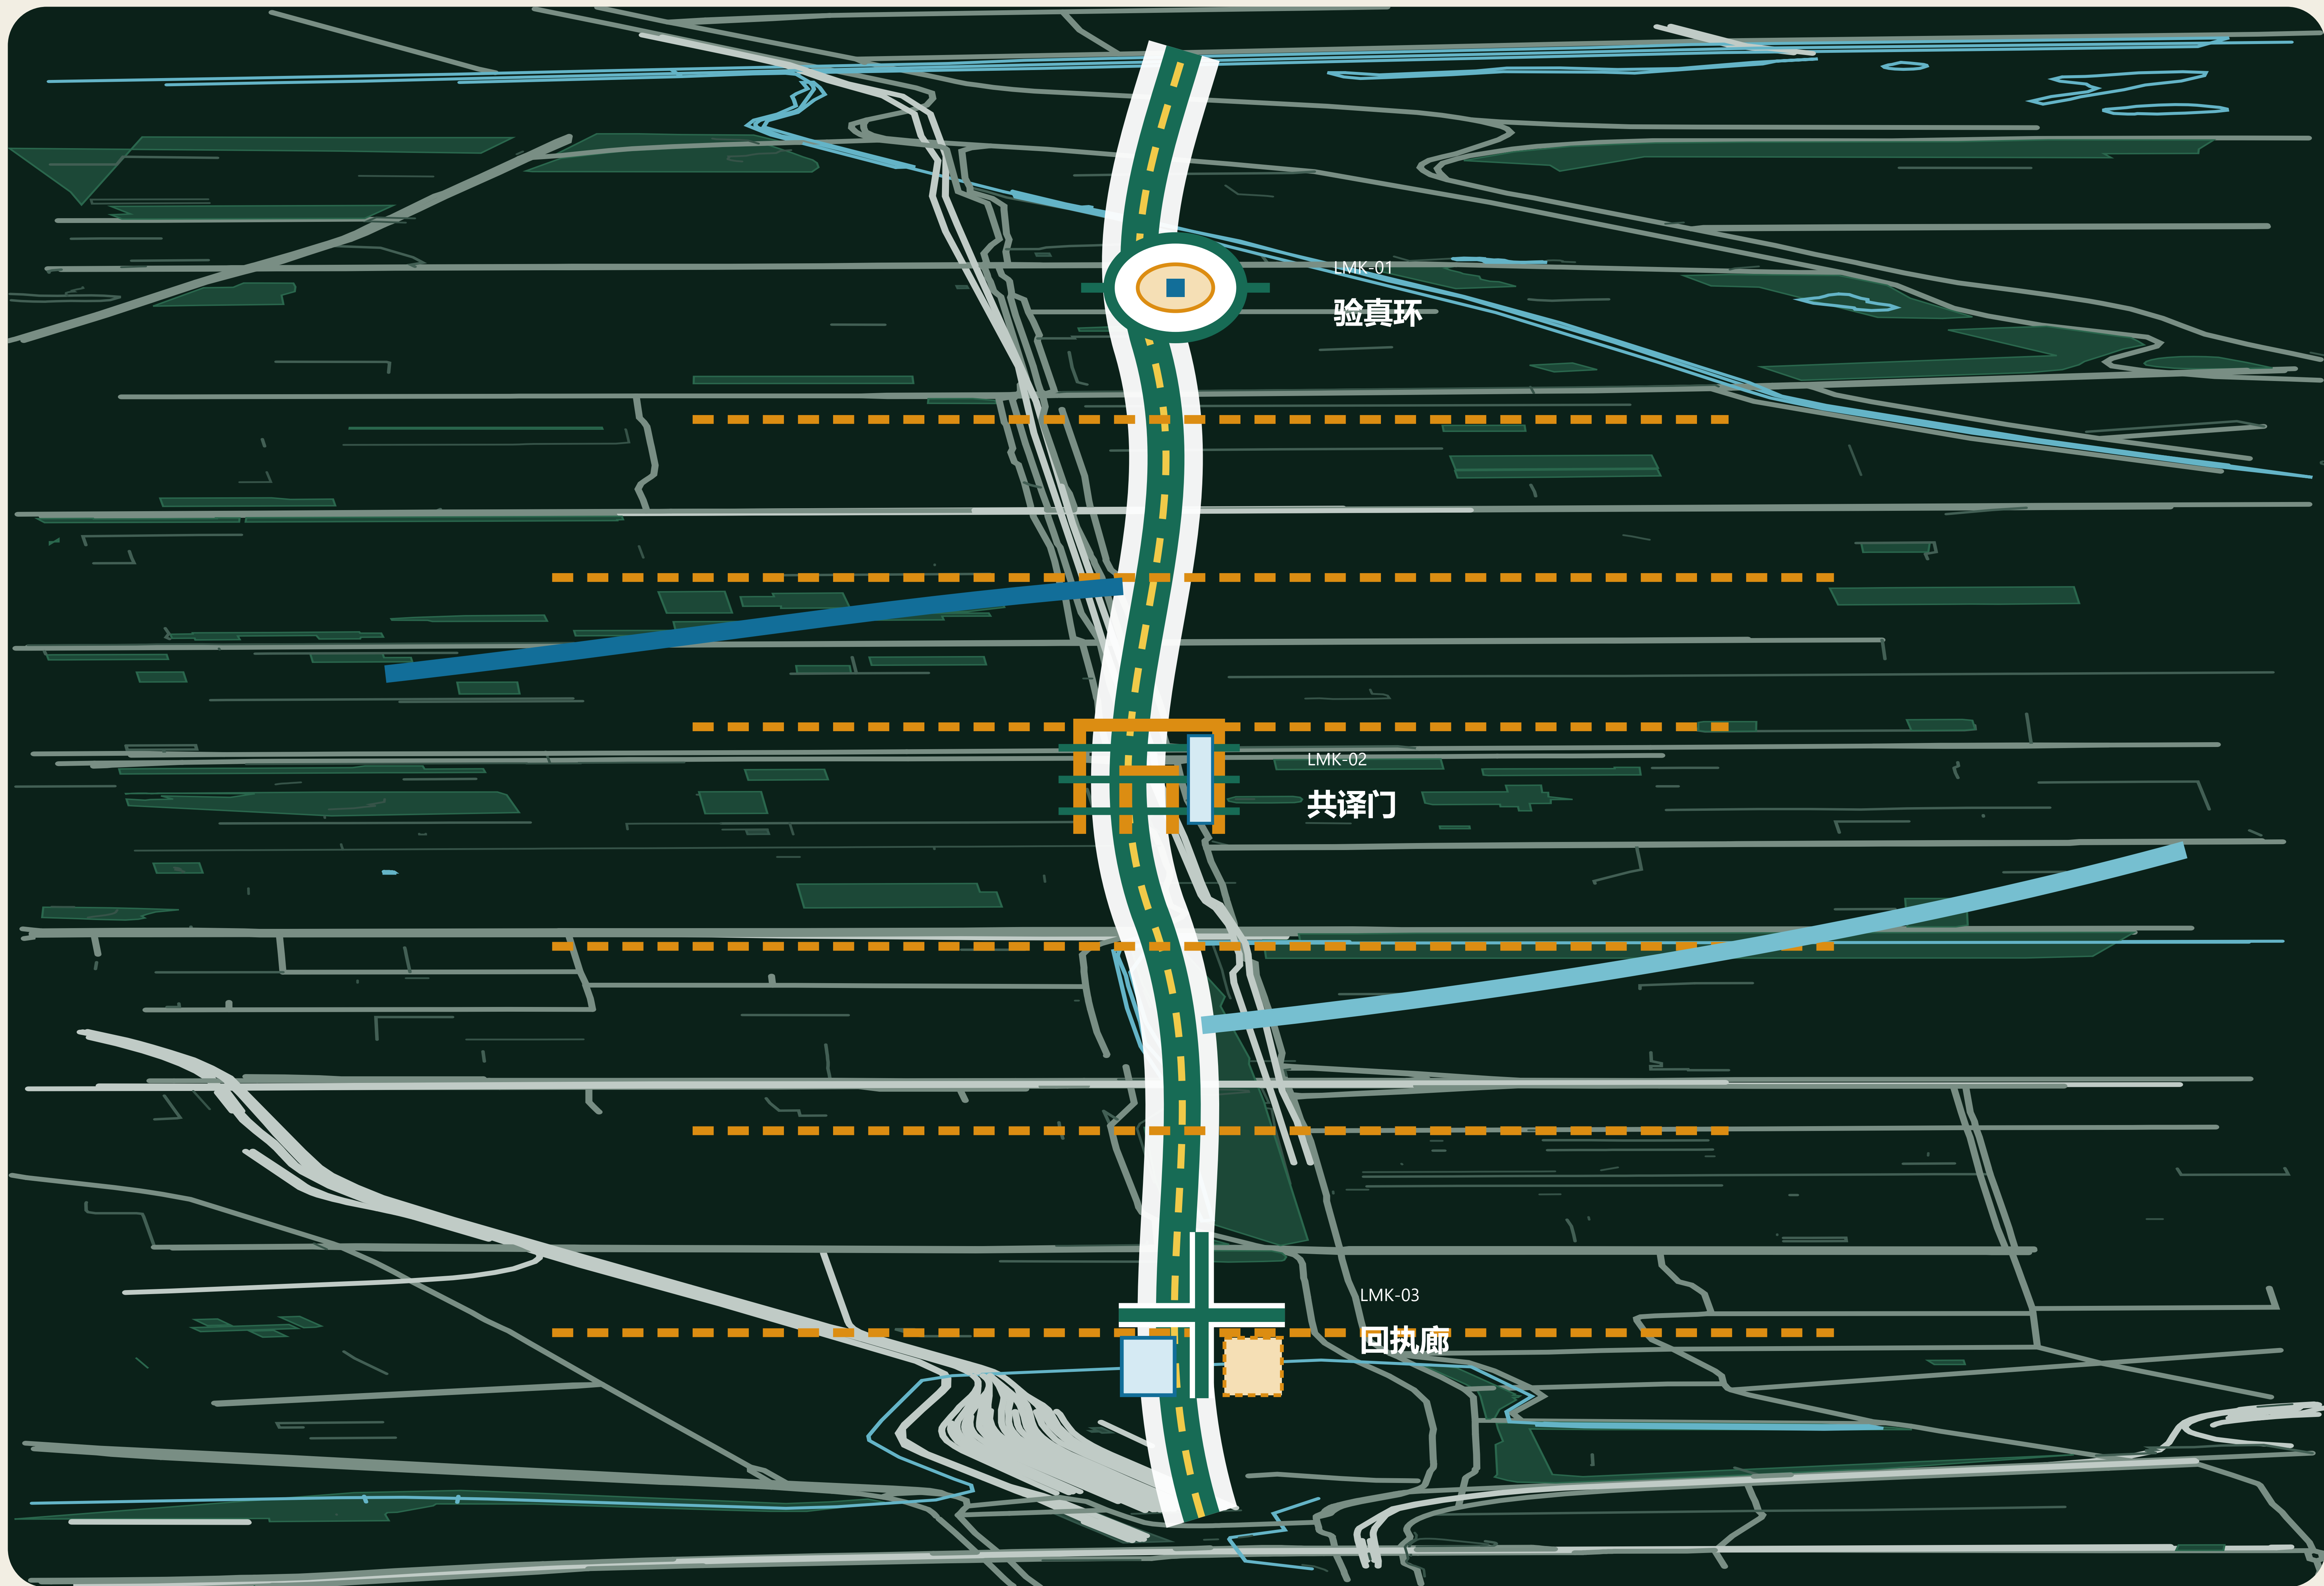


步行、自行车、无障碍、蓝绿与人工服务先连续

每座地标两条东西公共接口，不推定道路红线


科技服务交换与社区问题进入同一证据链

大钟寺·不断线的公共十字


S7 · 1:500 PROTOTYPE ASSUMPTION

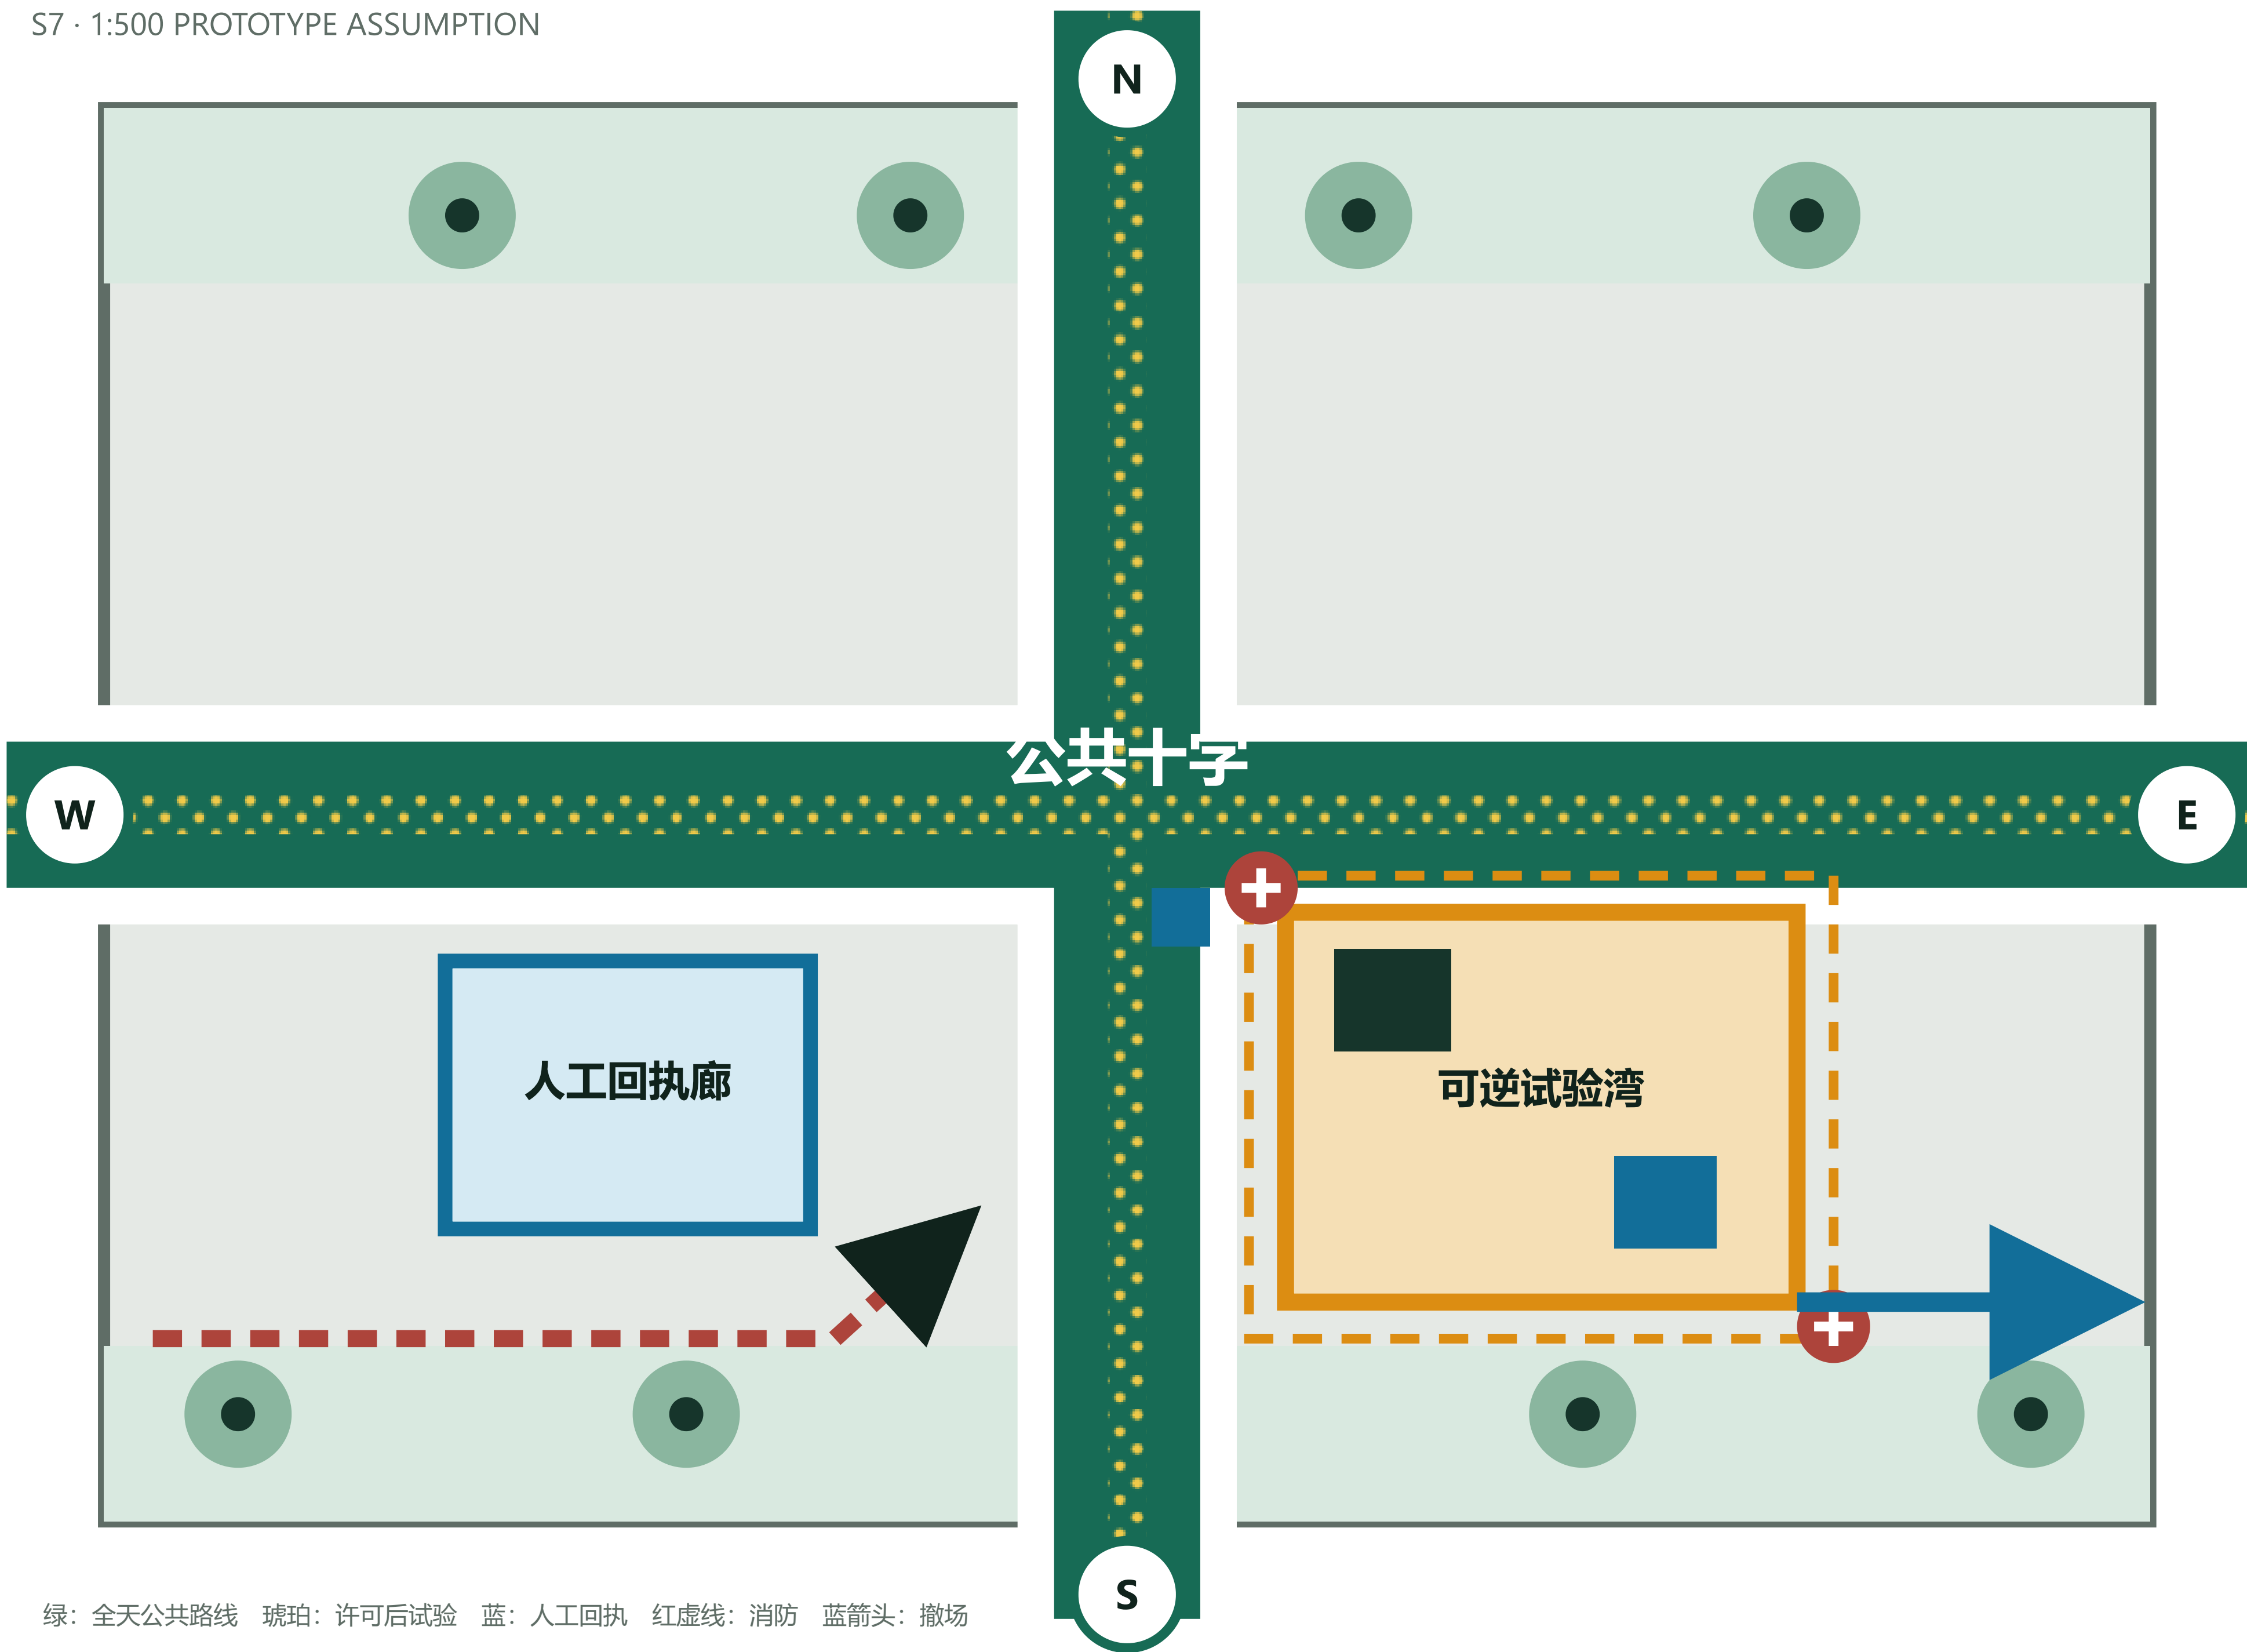


分层剖切轴测 | 永久公共层、可拆插件、人工证据界面

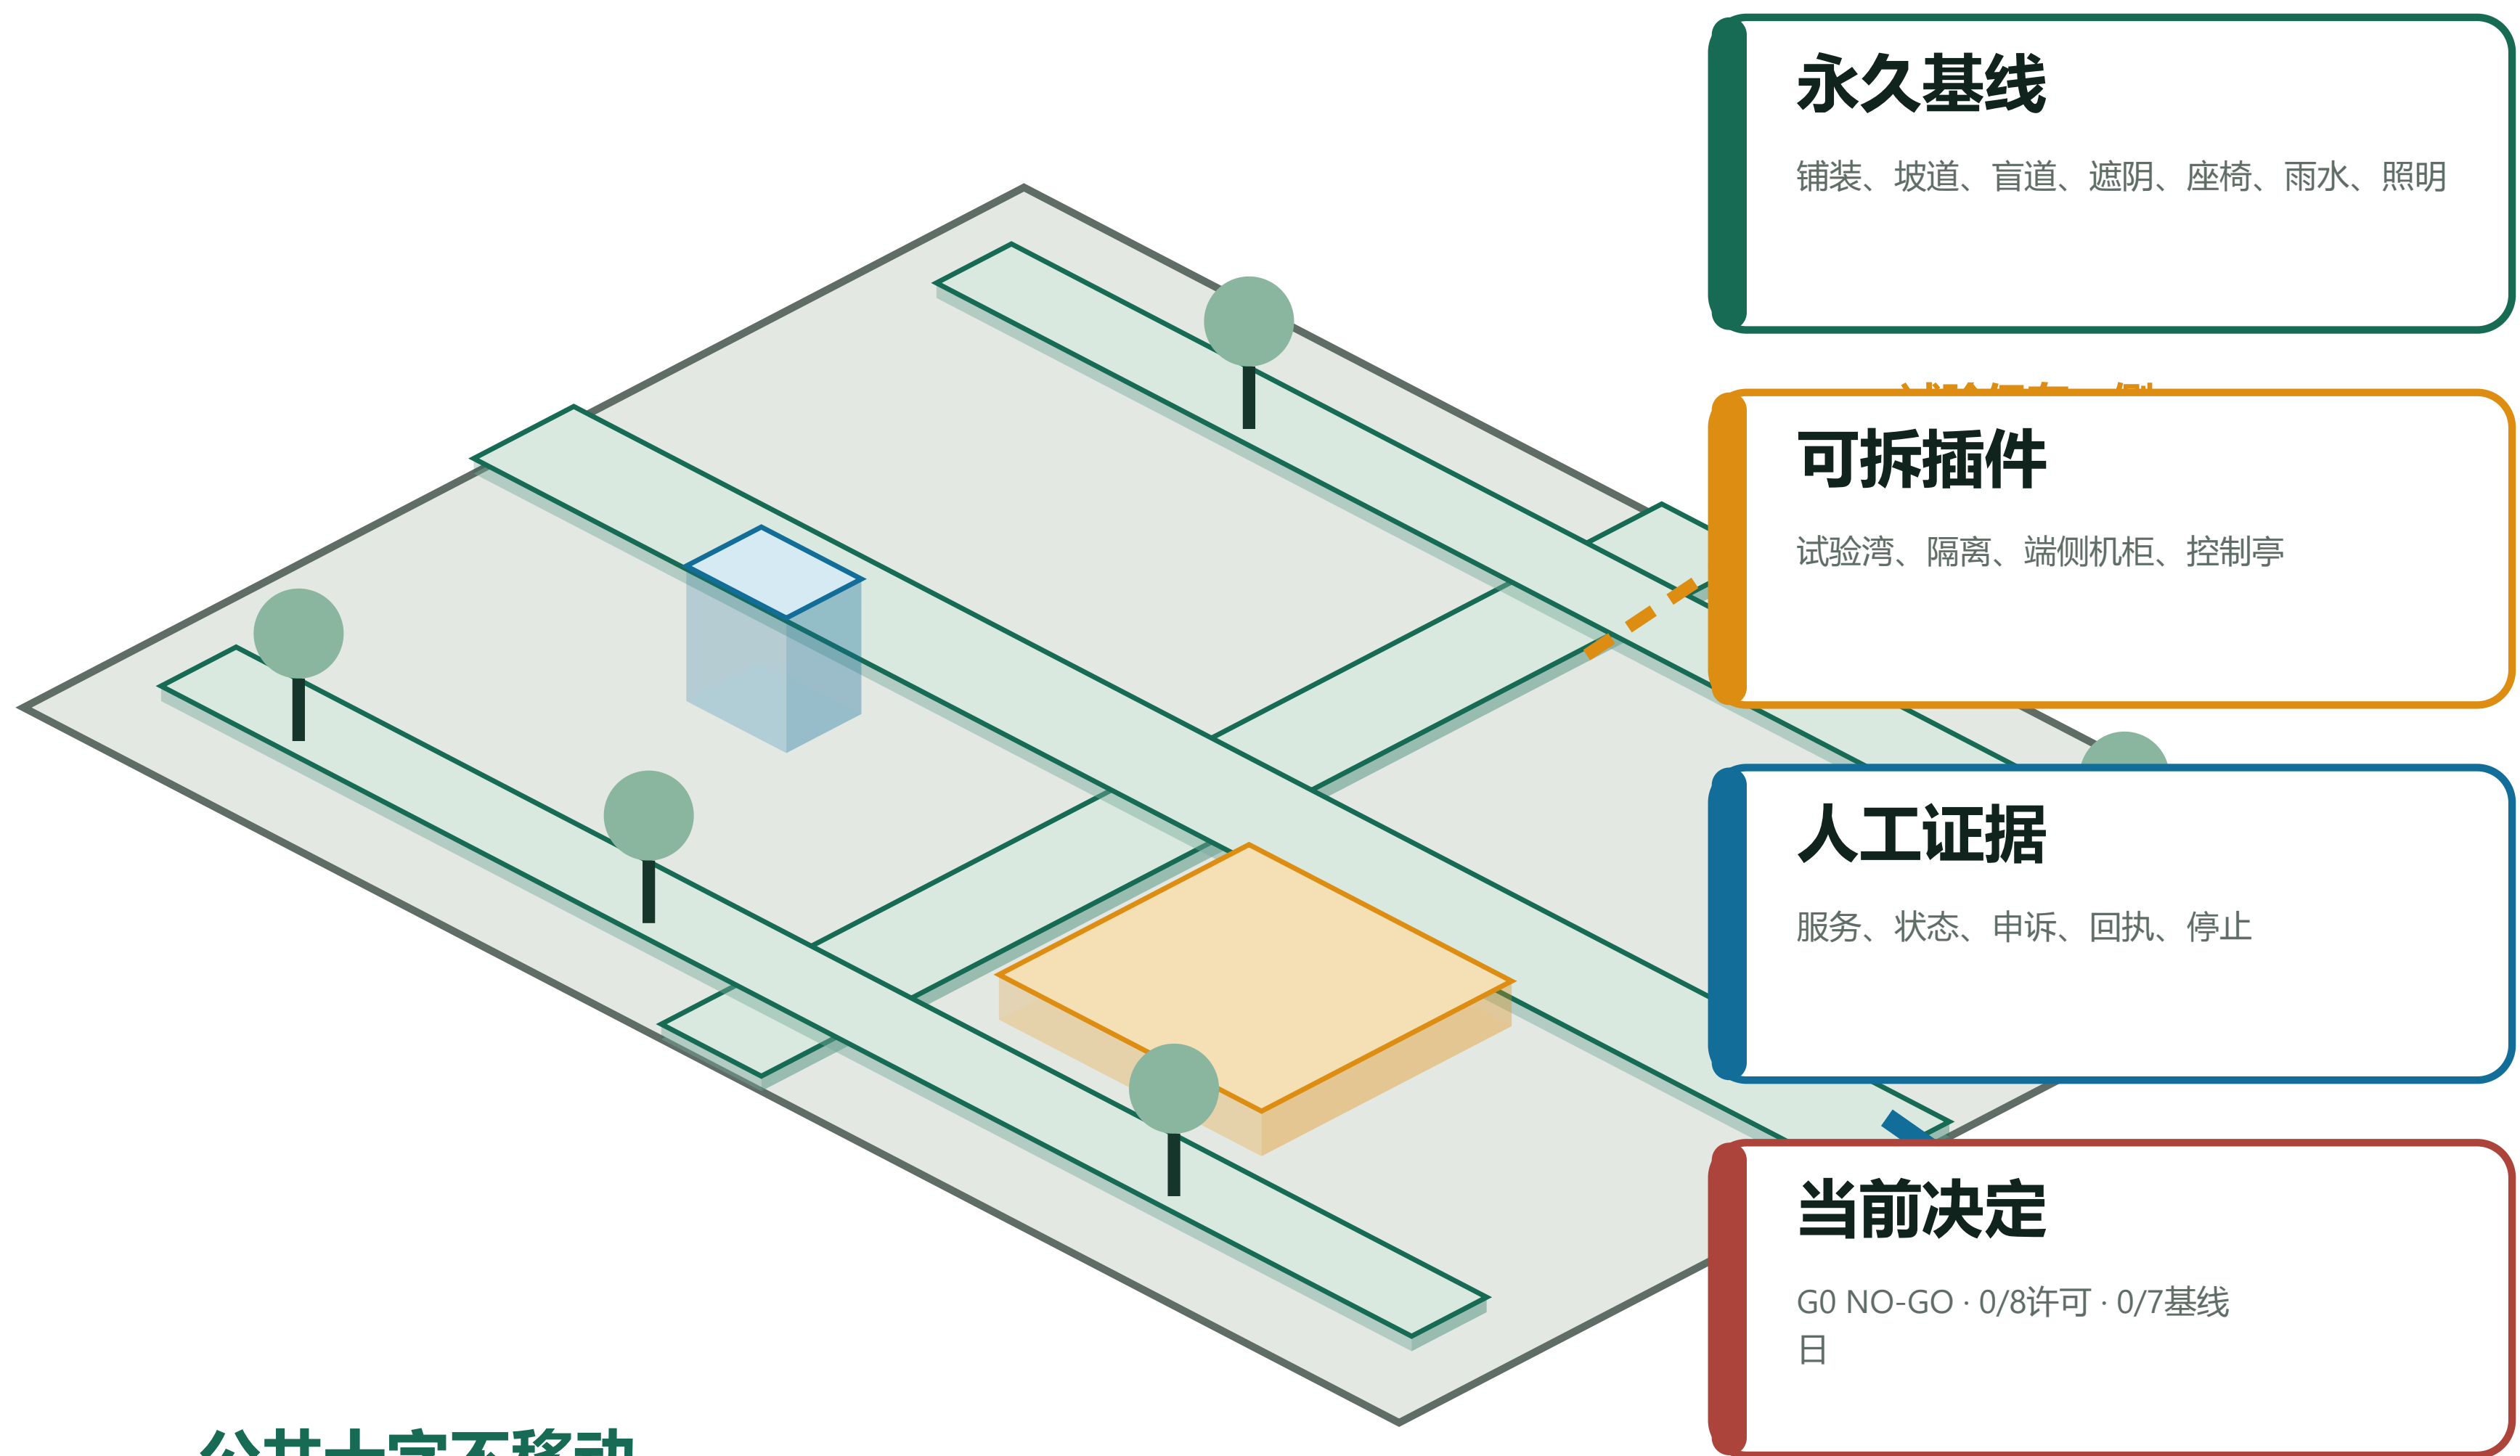

1:200 典型剖面 | 公共路径与试验湾物理分离

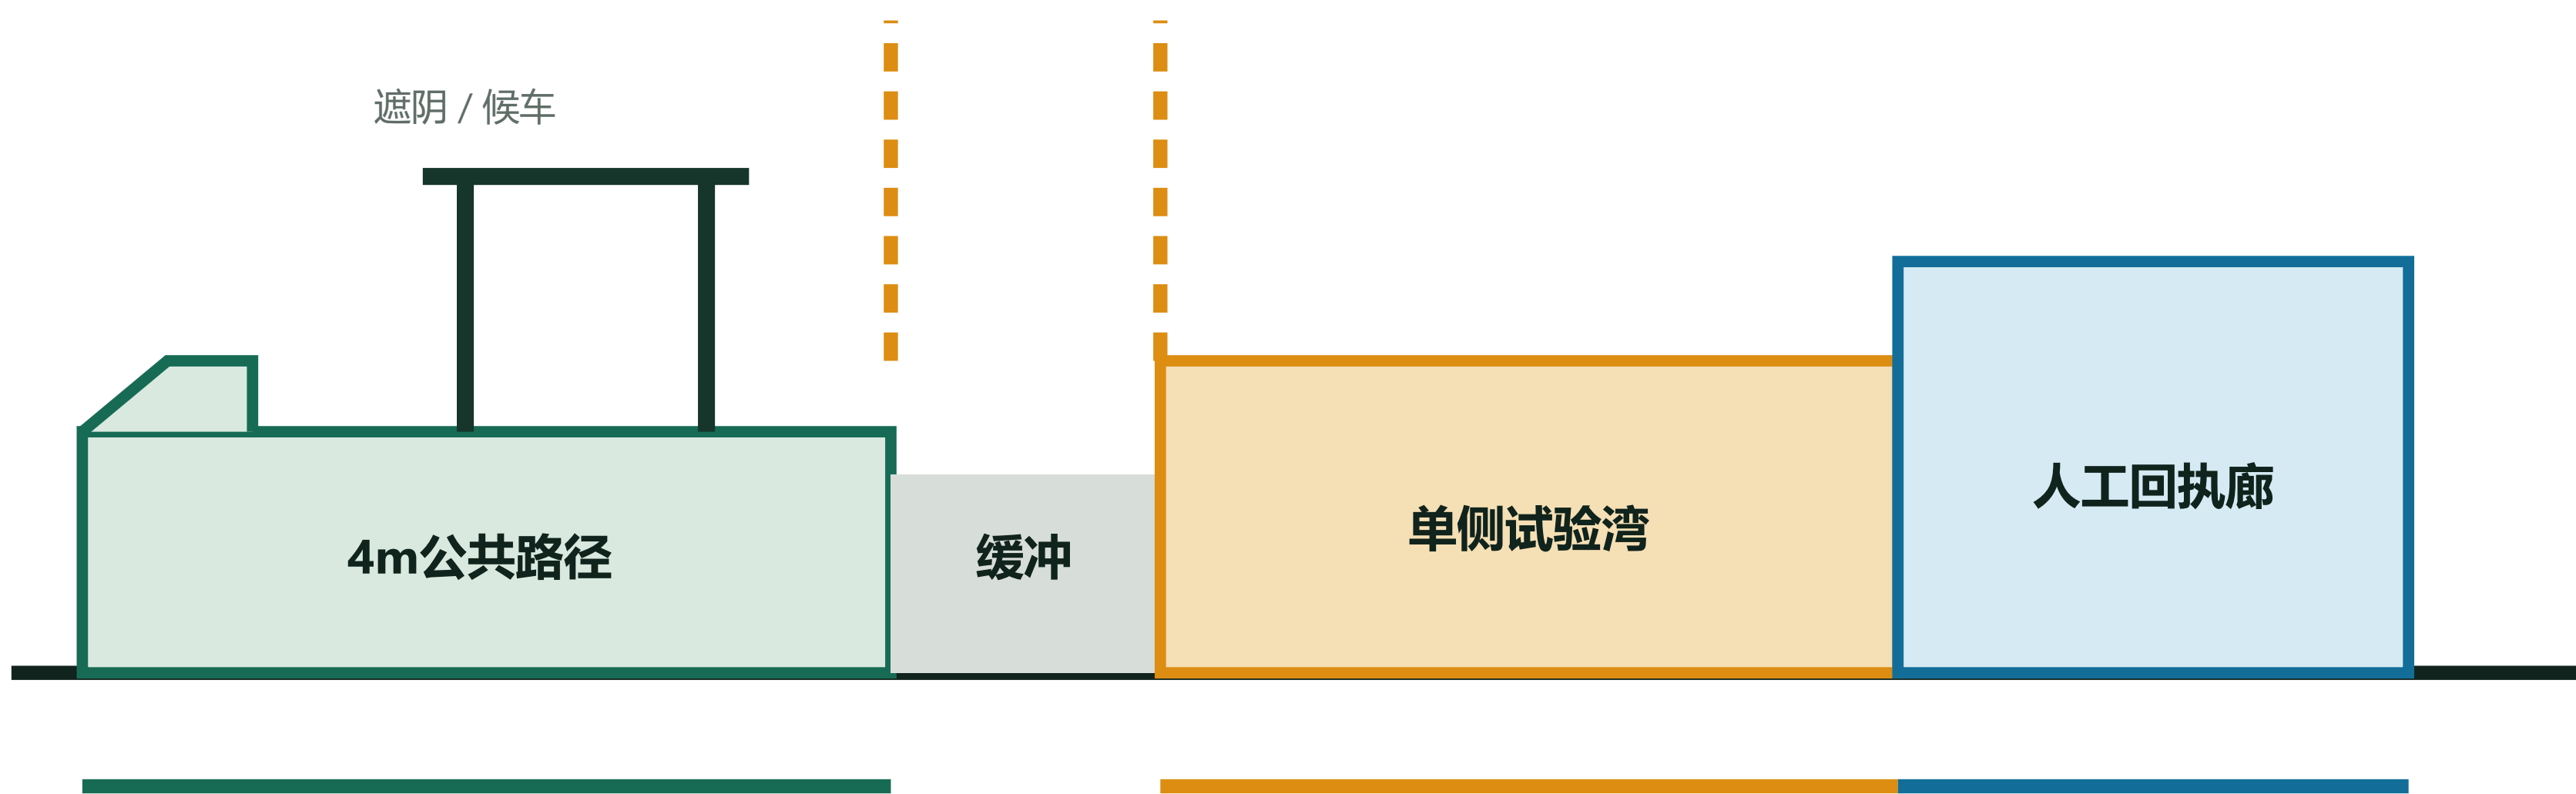

1:50 节点 | 坡道、盲道、可拆边界与雨水

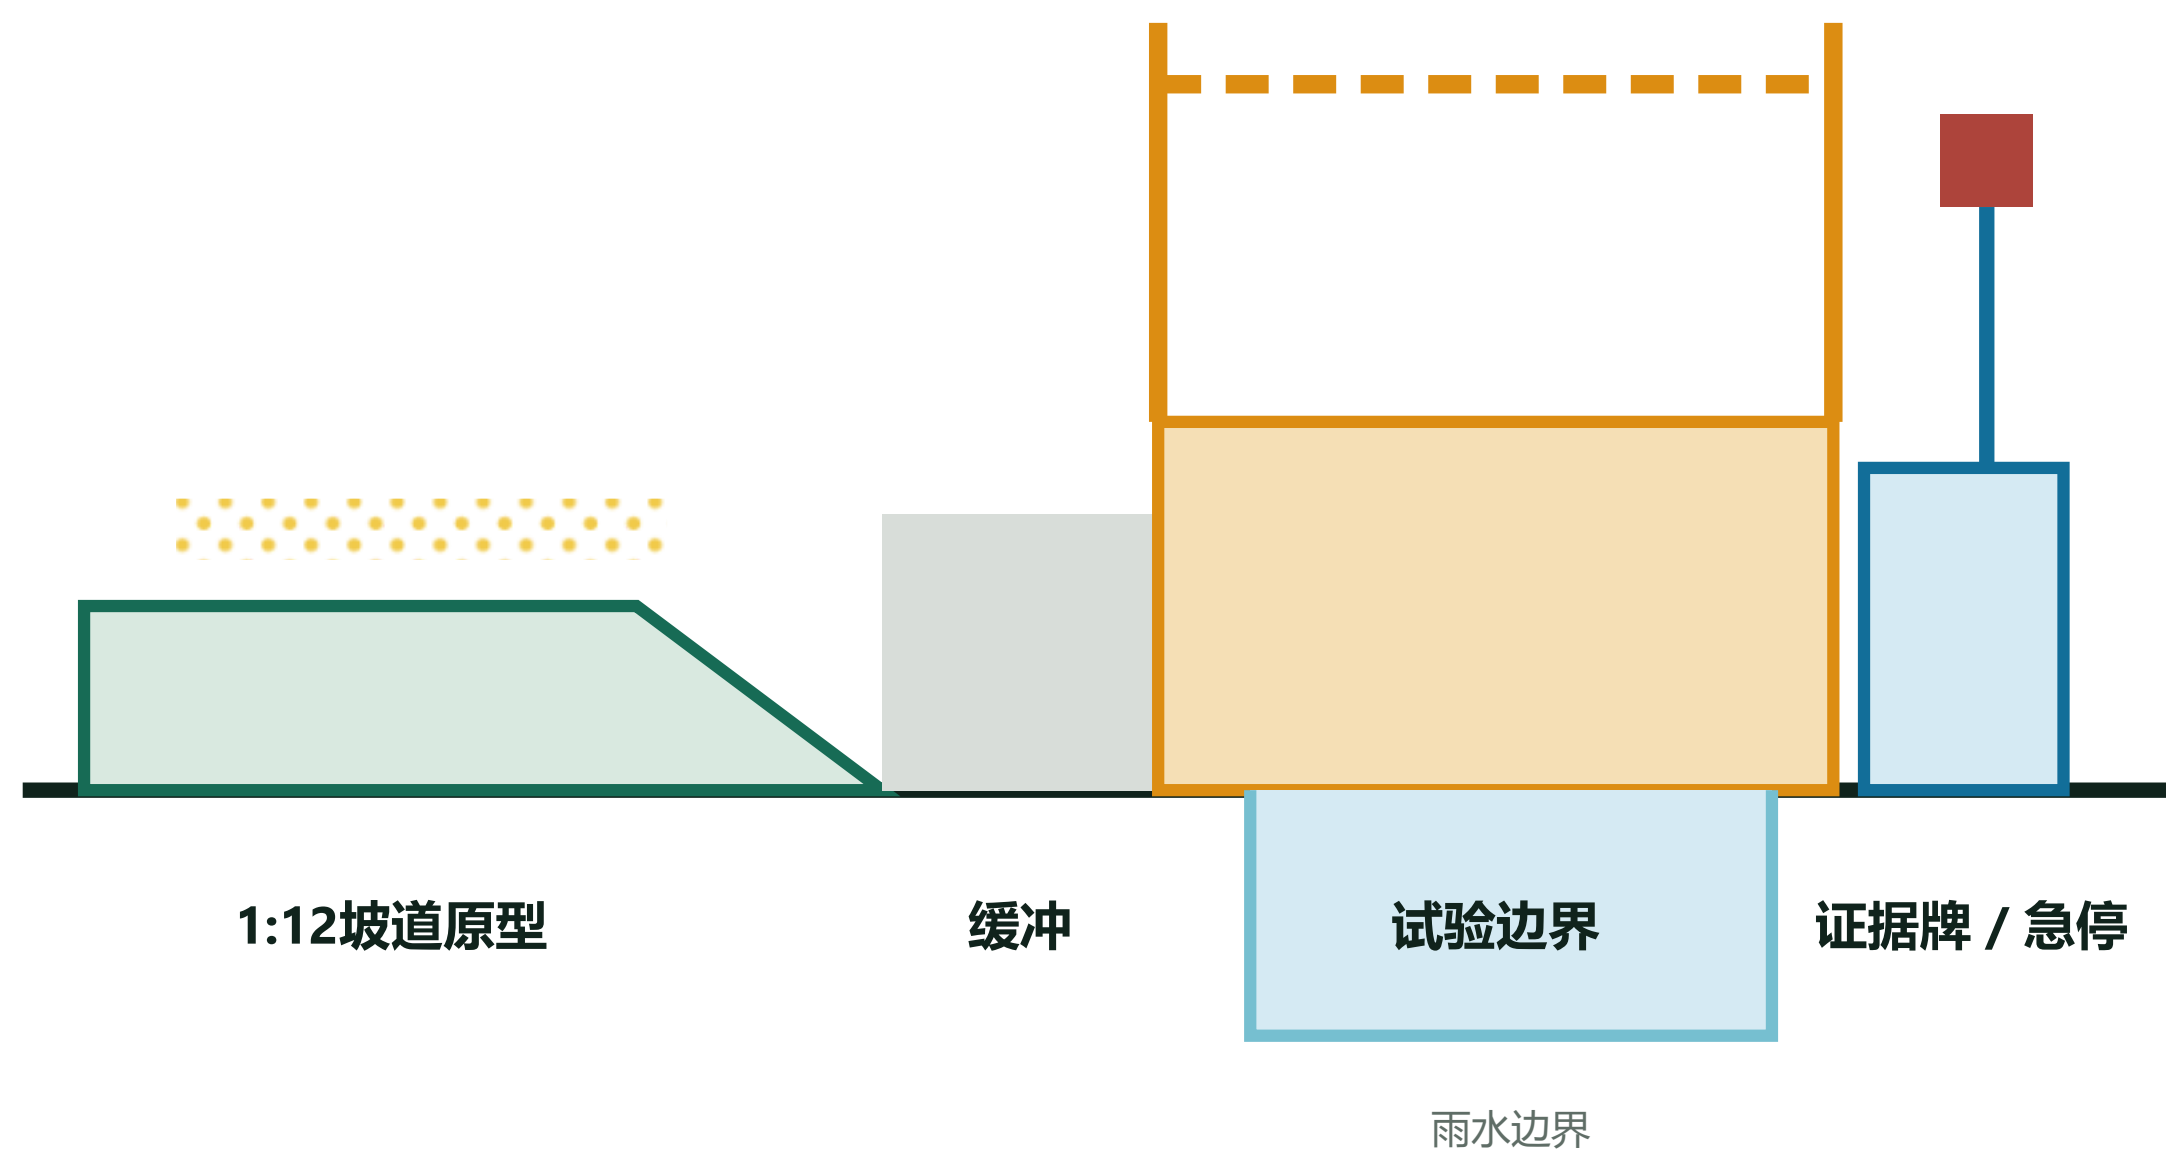

空间裁决 + 实施准入 | 先否决越线方案，再决定是否允许试验

几何选择与现场采纳是两次不同决定；当前现场门为NO-GO

ALT-A · REJECT

淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。
6 HARD FAILS

ALT-B · REVISE

修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。
0 FAIL · 3 REVISIONS

ALT-C · ADVANCE

推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。
0 FAIL · SOLE ADVANCE

G0 NO-GO

设计完整 ≠ 试验/准入

0 / 8

许可关闭

0 / 7

普通基线日

0 / 4

已落实独立岗位

任一条件缺失：保持OPEN普通服务，不进入TRIAL。

三份英雄测量契约

T2

100 / MODE

通行与无障碍公平

S2

100 / MODE

抵达完成与人工介入

S7

7 DAYS + 100

接驳、冲突与恢复时钟

12/12契约已登记 · 0现场结果 · 缺失不算成功

ALT-A/B/C为geometry_based_design_audit；G0为实施准入门；adopt/revise/stop仍须现场证据和人类委员会。

G0 NO-GO | 90天不是承诺，而是五道进入条件

普通服务、许可、岗位、基线和撤场演练任一失败，不进入AI试验

DAY 0-15

测绘、权属、站口、消防、管线、无障碍与交通核验

DAY 16-30

只搭公共路线、候车、遮阳、人工服务和回执部

DAY 31-45

记录7个连续普通运行日；不放AI设备

DAY 46-75

8类许可 + 4独立岗位齐全后才可限时试验

DAY 76-90

停止演练、撤场恢复、公众复核与回执

八类许可 | 当前全部待办

SITE

场地使用与资产方书面同意

TITLE

权属、边界与现状测绘核验

FIRE

消防车道、疏散面与临时构筑物复核

ACCESS

无障碍路线、坡道、盲道和人工服务审计

POWER

临时用电、配电保护与断电责任

NET

隔离网络、数据最小化与日志保存规则

TRAFFIC

视接驳优先、活动时窗与交通组织审批

EQUIP

设备安全、保险、急停与供应商撤场责任

四个岗位必须独立覆盖

01

场地负责人

待落实

02

普通服务人员

待落实

03

安全负责人

待落实

04

数据记录人员

待落实

关键安全岗位与普通服务岗位不得兼任。

单价、总价、合作和许可均未承诺。

16副构件、4个采购包、5类空白表单已登记；价格均为pending_market_quote，当前不构成采购或开工条件。

三份英雄契约把入选空间送入同题测量；最终决定仍属于人类

T2

100 / MODE

机器人通行 / 无障碍公平

BASELINE → TRIAL → STOP / RECOVER

S2

100 / MODE

国际抵达 / 人工介入

BASELINE → TRIAL → STOP / RECOVER

S7

7 DAYS + 100

轨道接驳 / 冲突 / 恢复

BASELINE → TRIAL → STOP / RECOVER

城市采纳回执

ADOPT

REVISE

STOP

当前12/12契约已登记，0项现场结果；缺失不得填补为成功，现场阈值不得由作者预填。
