

京张生长网

从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

dingle2001 · provisional constraint · concept proposal



决策摘要：从证据到可证伪试点

区位接口形成多锚点网络；六智能体把问题编译成项目，四道人类决策门控制放行与退出。

体检

动作：七维基线和问题 / 资源清单
证据：E0公开来源 + E3现场任务
停止：缺基线只调查、不生成项目

规划

动作：一轴三核两翼落位15项目
证据：同源GeoJSON、总图、三区剖面
停止：边界 / 结构 / 消防未签发不施工

运行

动作：12场景 + WP0—WP6 + 90日试点
证据：合同、日志、可复现实验单
停止：无责任人 / 需求 / 成本即退阶

原创

差异：不以出租率或仪表盘替代项目生成
内核：六智能体 + 四人门 + 本地适配器
证伪：F1—F4任一失败即退阶 / 退出

公共利益

动作：居民共同签发与普惠服务
证据：≥2居民、≥20%时段、申诉记录
停止：无AI路径关闭即否决放行

边界

输出：继续 / 调整 / 退阶 / 退出建议
责任：人工签发并保留异议
禁止：AI替代专业或政府决定

多智能体城市更新控制面

AI的规划价值不是更快出图，而是让证据、项目合同、公众保障与退出决定可追溯。

CORE-05 多智能体城市更新控制面：证据到项目、运行与退出

每个智能体都有输入、输出、最小权限、拒绝条件和具名人工签发

■ 数据派生

■ 概念建议

■ 待专业核验

A | 受控证据总线：只读进入、来源留痕

E0 官方 / 一手公开

E1 临时几何派生

E3 现场调查任务

公共章程与专业标准

禁止：个人隐私 / 内部数据

统一证据对象：来源ID | 时间与空间范围 | 许可 | 转换方法 | 责任人 | 置信等级 | 到期日

A1 证据管家

输入：E0/E1/E3；输出：证据对象

拒绝 / 降级 | 只读；来源不清或越权即拒绝

A2 体检编译器

输入：七维基线；输出：问题 / 资源清单

拒绝 / 降级 | 缺基线只生成调查，不生成项目

A3 空间规划器

输入：项目条件；输出：三核落位与冲突表

拒绝 / 降级 | 不输出红线、容积率或工程结论

A4 场景编排器

输入：用户任务；输出：限域试点 + 无AI等价路径

拒绝 / 降级 | D2/D3、高风险动作必须人工放行

A5 运营合同器

输入：试点证据；输出：RACI / 目录 / 分账 / 验收

拒绝 / 降级 | 无责任人、真实需求或成本口径即退阶

A6 公共守门人

输入：居民 / 无障碍 / 投诉；输出：公共价值否决或放行

拒绝 / 降级 | ≥ 2 名居民签发； $\geq 20\%$ 普惠时段；非AI路径常开

B | 四道人类决策门：AI不能自签

G0 证据接纳

数据责任人

G1 试点放行

场景 + 安全负责人

G2 专业签发

规划 / 结构 / 消防 / 无障碍 / 法律 / 采购

G3 继续 / 调整 / 退出

统筹 + 居民代表 + 专业团队

每次决策写入：证据ID | 智能体建议 | 人工签发人 | 异议 | 版本 | 继续 / 退阶 / 停止原因

专业签发、公共服务取舍、采购、权利处分和政府决策不得委托给AI；居民异议必须随签发记录保留。

C | 不剥夺服务的对照评估

分步试点：同类节点先后启用；所有人保留人工 / 无AI等价服务。

效果 | 形成时间、有效测试、首单、匿名通行、普惠时段、无障碍、接管、分群差异

基线期

同口径测量

试点期

限域 + 可关闭

对照期

同期同类节点

复评

差异 + 副作用 + 公平

本图是可供专业团队深化的概念协议，不证明系统已部署；任何自动化均须先通过数据、伦理、安全和专业审查。

CORE-05 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

证据优先的阅读方式

所有主张都落到空间、责任、证据、停止条件和待核验项。

已知	未知
临时几何、概念比例、项目和场景数量	结构、消防、产权、需求、投资、审批
建议	决策
空间原型、运行协议、项目组合与分期	继续、调整、退阶、退出；无基线不评分
无基线不评分 · 具名责任 · 验收证据 · 继续 / 调整 / 退阶 / 退出	

官方任务六项对位

总体定位、产业生态、场景、公共空间、文化与运营各有直接证据入口。

agent.1

总体概念与视觉识别

agent.2

产业生态与三区两翼

agent.3

12场景与7画像

agent.4

遗产公园、地标、荣誉与组件

agent.5

京张—中关村—AI文化

agent.6

年度活动、社群与国际转化

结构与设施安全

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

必须补齐的基线

建筑测绘、结构鉴定、设备荷载、围护与管线台账

当前诊断

现有图层只能识别存量对象，不能证明承载验证设备或开放使用的安全条件。

问题清单

待形成危项、限用项、可继续使用项清单

资源清单

大跨空间、可逆改造界面、既有机电与可复用构件

项目触发

触发Z1、Z2及三区建筑更新前置包WP0

停止门

无专业签发不得进入永久工程或设备进场

消防与运行安全

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

必须补齐的基线

防火分区、疏散、消防水源、电气、危化与活动容量核验

当前诊断

实验、夜校、公众开放与机器人测试叠加，运行时段和人机分流尚无正式依据。

问题清单

待形成消防缺口、开放时窗和停车场条件清单

资源清单

分区运营、限域测试、人工值守、可关闭公共界面

项目触发

触发Z3、Z5、O3及场景安全协议

停止门

疏散、保险、急停或责任主体缺一项即不开场

遗产与场所价值

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

必须补齐的基线

遗存普查、年代与价值评估、视廊、构件及档案清权

当前诊断

京张遗产轴具备强叙事潜力，但构件、年代、展示权与保护等级仍待逐项核验。

问题清单

待形成保护、修缮、展示、禁入与可再利用清单

资源清单

铁路轨迹、工业记忆、连续公共空间与中关村创新史

项目触发

触发遗产轴、三地标、导视与年度策展

停止门

先调查、再设计；未清权内容不得上墙或数字发布

权属与治理条件

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

必须补齐的基线

房地权属、租赁、经营许可、管理边界、利益相关者与诉求台账

当前诊断

临时边界不能替代产权和管理边界，跨节点公共开放、维护和收益责任尚未约定。

问题清单

待形成权利冲突、责任空档、协商事项与审批清单

资源清单

产权方、街区运营方、高校企业、专业机构和居民协作网络

项目触发

触发全部15项目的主体确认和一图两表六清单

停止门

无具名统筹、实施、运营、验收主体不得入实施库

产业与空间适配

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

必须补齐的基线

企业生命周期、空间需求、设备条件、服务缺口、可负担性与竞品调研

当前诊断

海淀创新源头强，验证—孵化—首单的街区接口弱；普通办公供给不能替代产业服务。

问题清单

待形成真实需求、空间门槛、服务断点与可替代方案清单

资源清单

高校科研、头部企业、开源社群、验证设施与专业服务

项目触发

触发Z1—Z4、O1—O3、D1—D5

停止门

没有问题所有者、真实用户和运营任务书，不做建设性投入

交通可达与连续性

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

必须补齐的基线

轨道出入口、步骑流线、过街、无障碍、装卸、应急与分时冲突调查

当前诊断

南北遗产轴具备连续潜力，东西联系、轨道门户、无障碍和测试流线仍需现场验证。

问题清单

待形成断点、冲突点、绕行、服务盲区与时段清单

资源清单

线性公园、轨道门户、两翼联系和可分时通道

项目触发

触发Z3、SCN-08、小月河翼与公共底座WP1

停止门

匿名通行、无障碍和应急路线不得被测试或活动占用

公共空间、生态与包容

无体检不更新：未知项转化为调查任务和签发门，不转化为假分数。

必须补齐的基线

绿地水系、热舒适、雨洪、照明、停留、全龄使用、开放时间和维护调查

当前诊断

公共空间可成为创新基础设施，但舒适性、全龄服务、维护经费和技术退出权缺少基线。

问题清单

待形成生态短板、使用冲突、服务缺口与维护责任清单

资源清单

遗址公园、小月河、社区家庭、开放首层和公共活动网络

项目触发

触发Z5、O4、O5、SCN-07—09和组件库

停止门

公共服务不可与数据授权绑定，维护无来源不得扩张设施

问题 / 资源 / 项目 / 政策四项清单

四张清单逐项对应，不能建立对应关系就说明诊断或资源盘点尚未完成。

问题

症状、对象、空间、时段、紧迫度与根因

资源

空间、组织、文化、生态、资金与政策接口

项目

边界、主体、措施、产出、结果、指标

政策

规划、土地、审批、资金、监管与退出条件

体检到项目库的编译器

定位症状—追因—盘资源—比选工具—定义合同—按成熟度入库。

机会 问题与资源初步匹配	储备 边界、主体与初算可说明
实施 方案、资金、运营与验收可组织	年度计划 节点、责任和前置条件可调度
退阶 权属、资金、公共价值或证据不足	退出 与规划冲突、风险不可控或长期无需求

项目区位与区域协同


区位红利在接口，不在占地；协同节点均为建议，不代表机构参与。

DIA-21 项目区位与区域协同

京张生长网位于海淀京张铁路遗址走廊，处于三城一区与中关村创新版图的核心衔接点

示意比例

概念设计

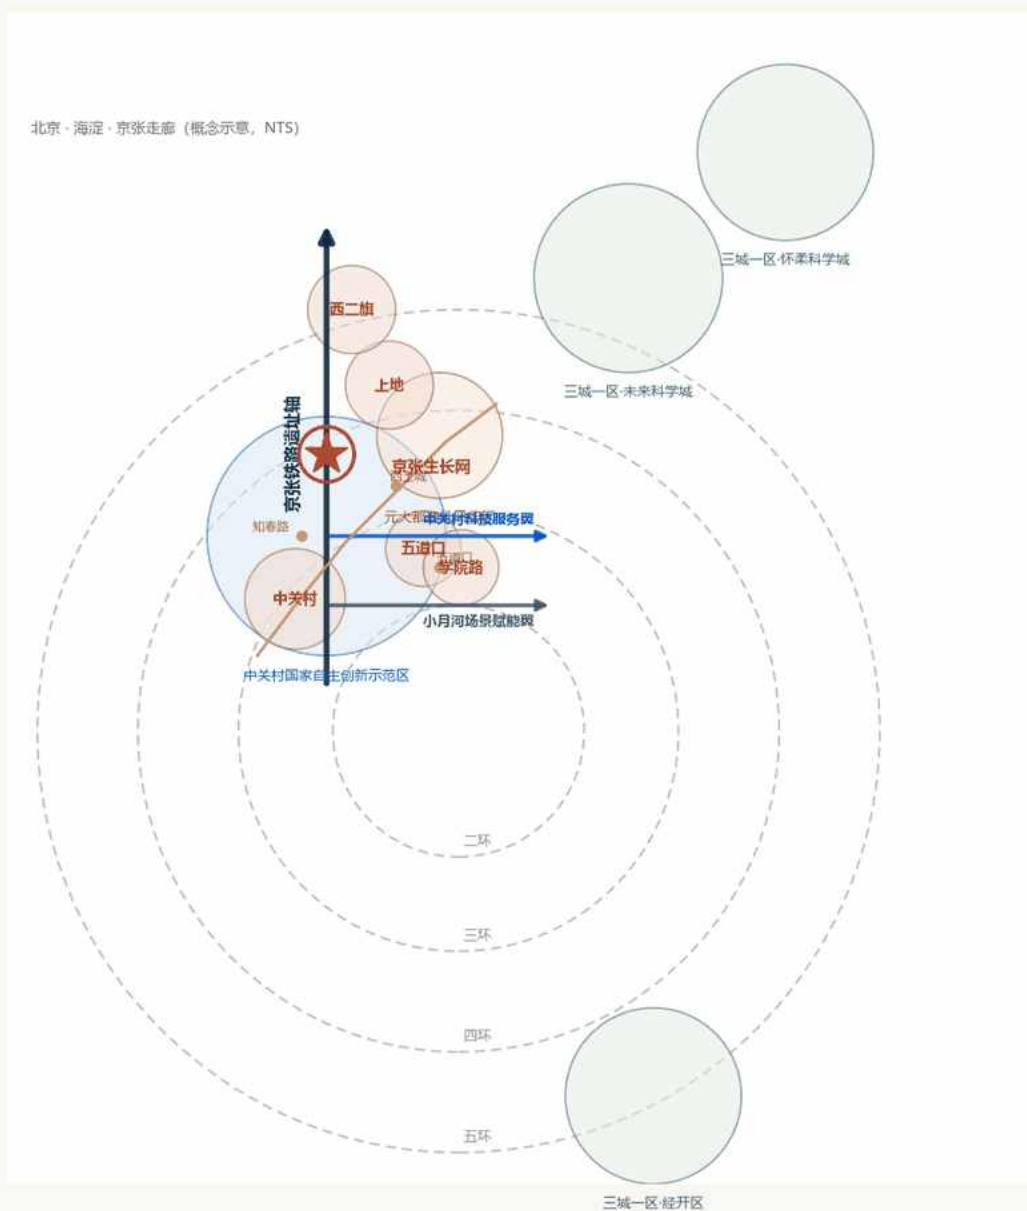

本图环路、站点与板块为概念示意，非精确测绘或行政边界；正式区位图以官方矢量与规划文件为准。

区位

东二环外-元大都遗址风貌区旁，中关村科学城核心

结构

落在京张铁路遗址轴，与两翼及三城一区同构

红利


中关村国家自主创新示范区叠加三城一区

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名	项目区位与区域协同
图号	DIA-21 - 2026-08-10 - ZH
比例	NTS
数据	概念设计 dinglec2001 · 使用Agent完成


设计策略：承·联·生·治

承是底色、联是骨架、生是动力、治是保障。

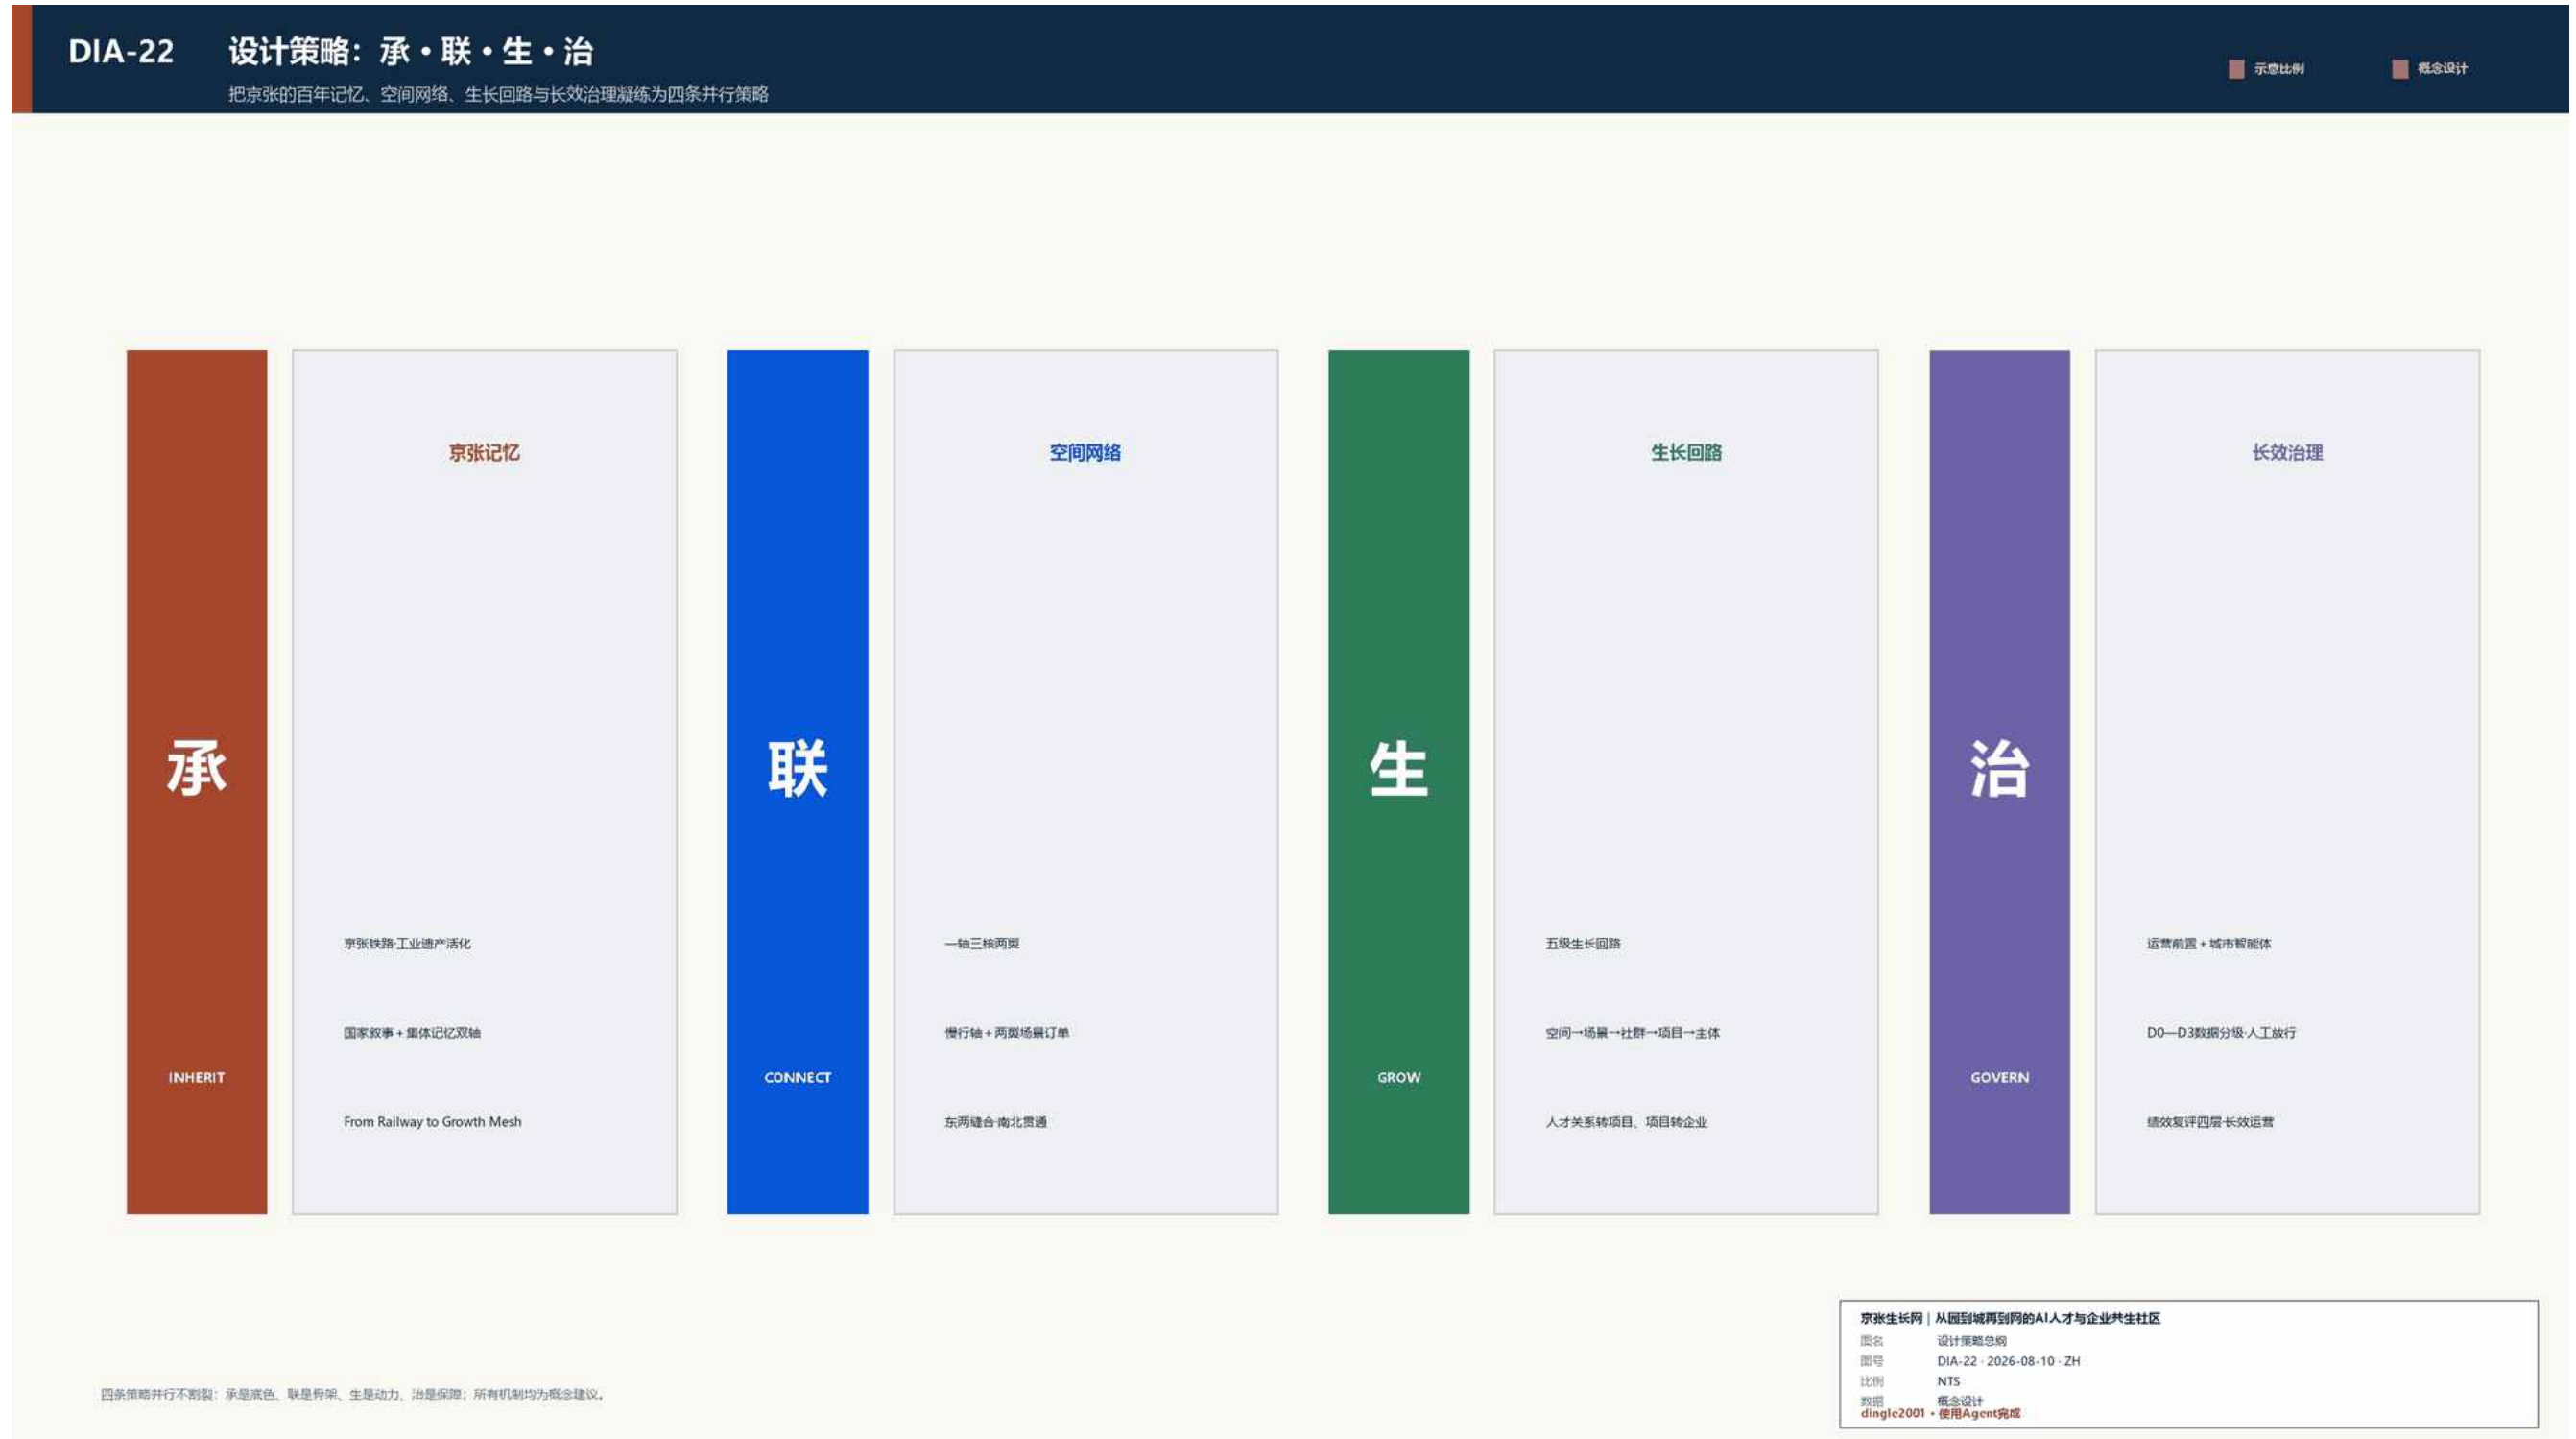

一轴三核两翼总体设计

北部验证、中部孵化、南部转化；两翼提供专业服务与公共场景。

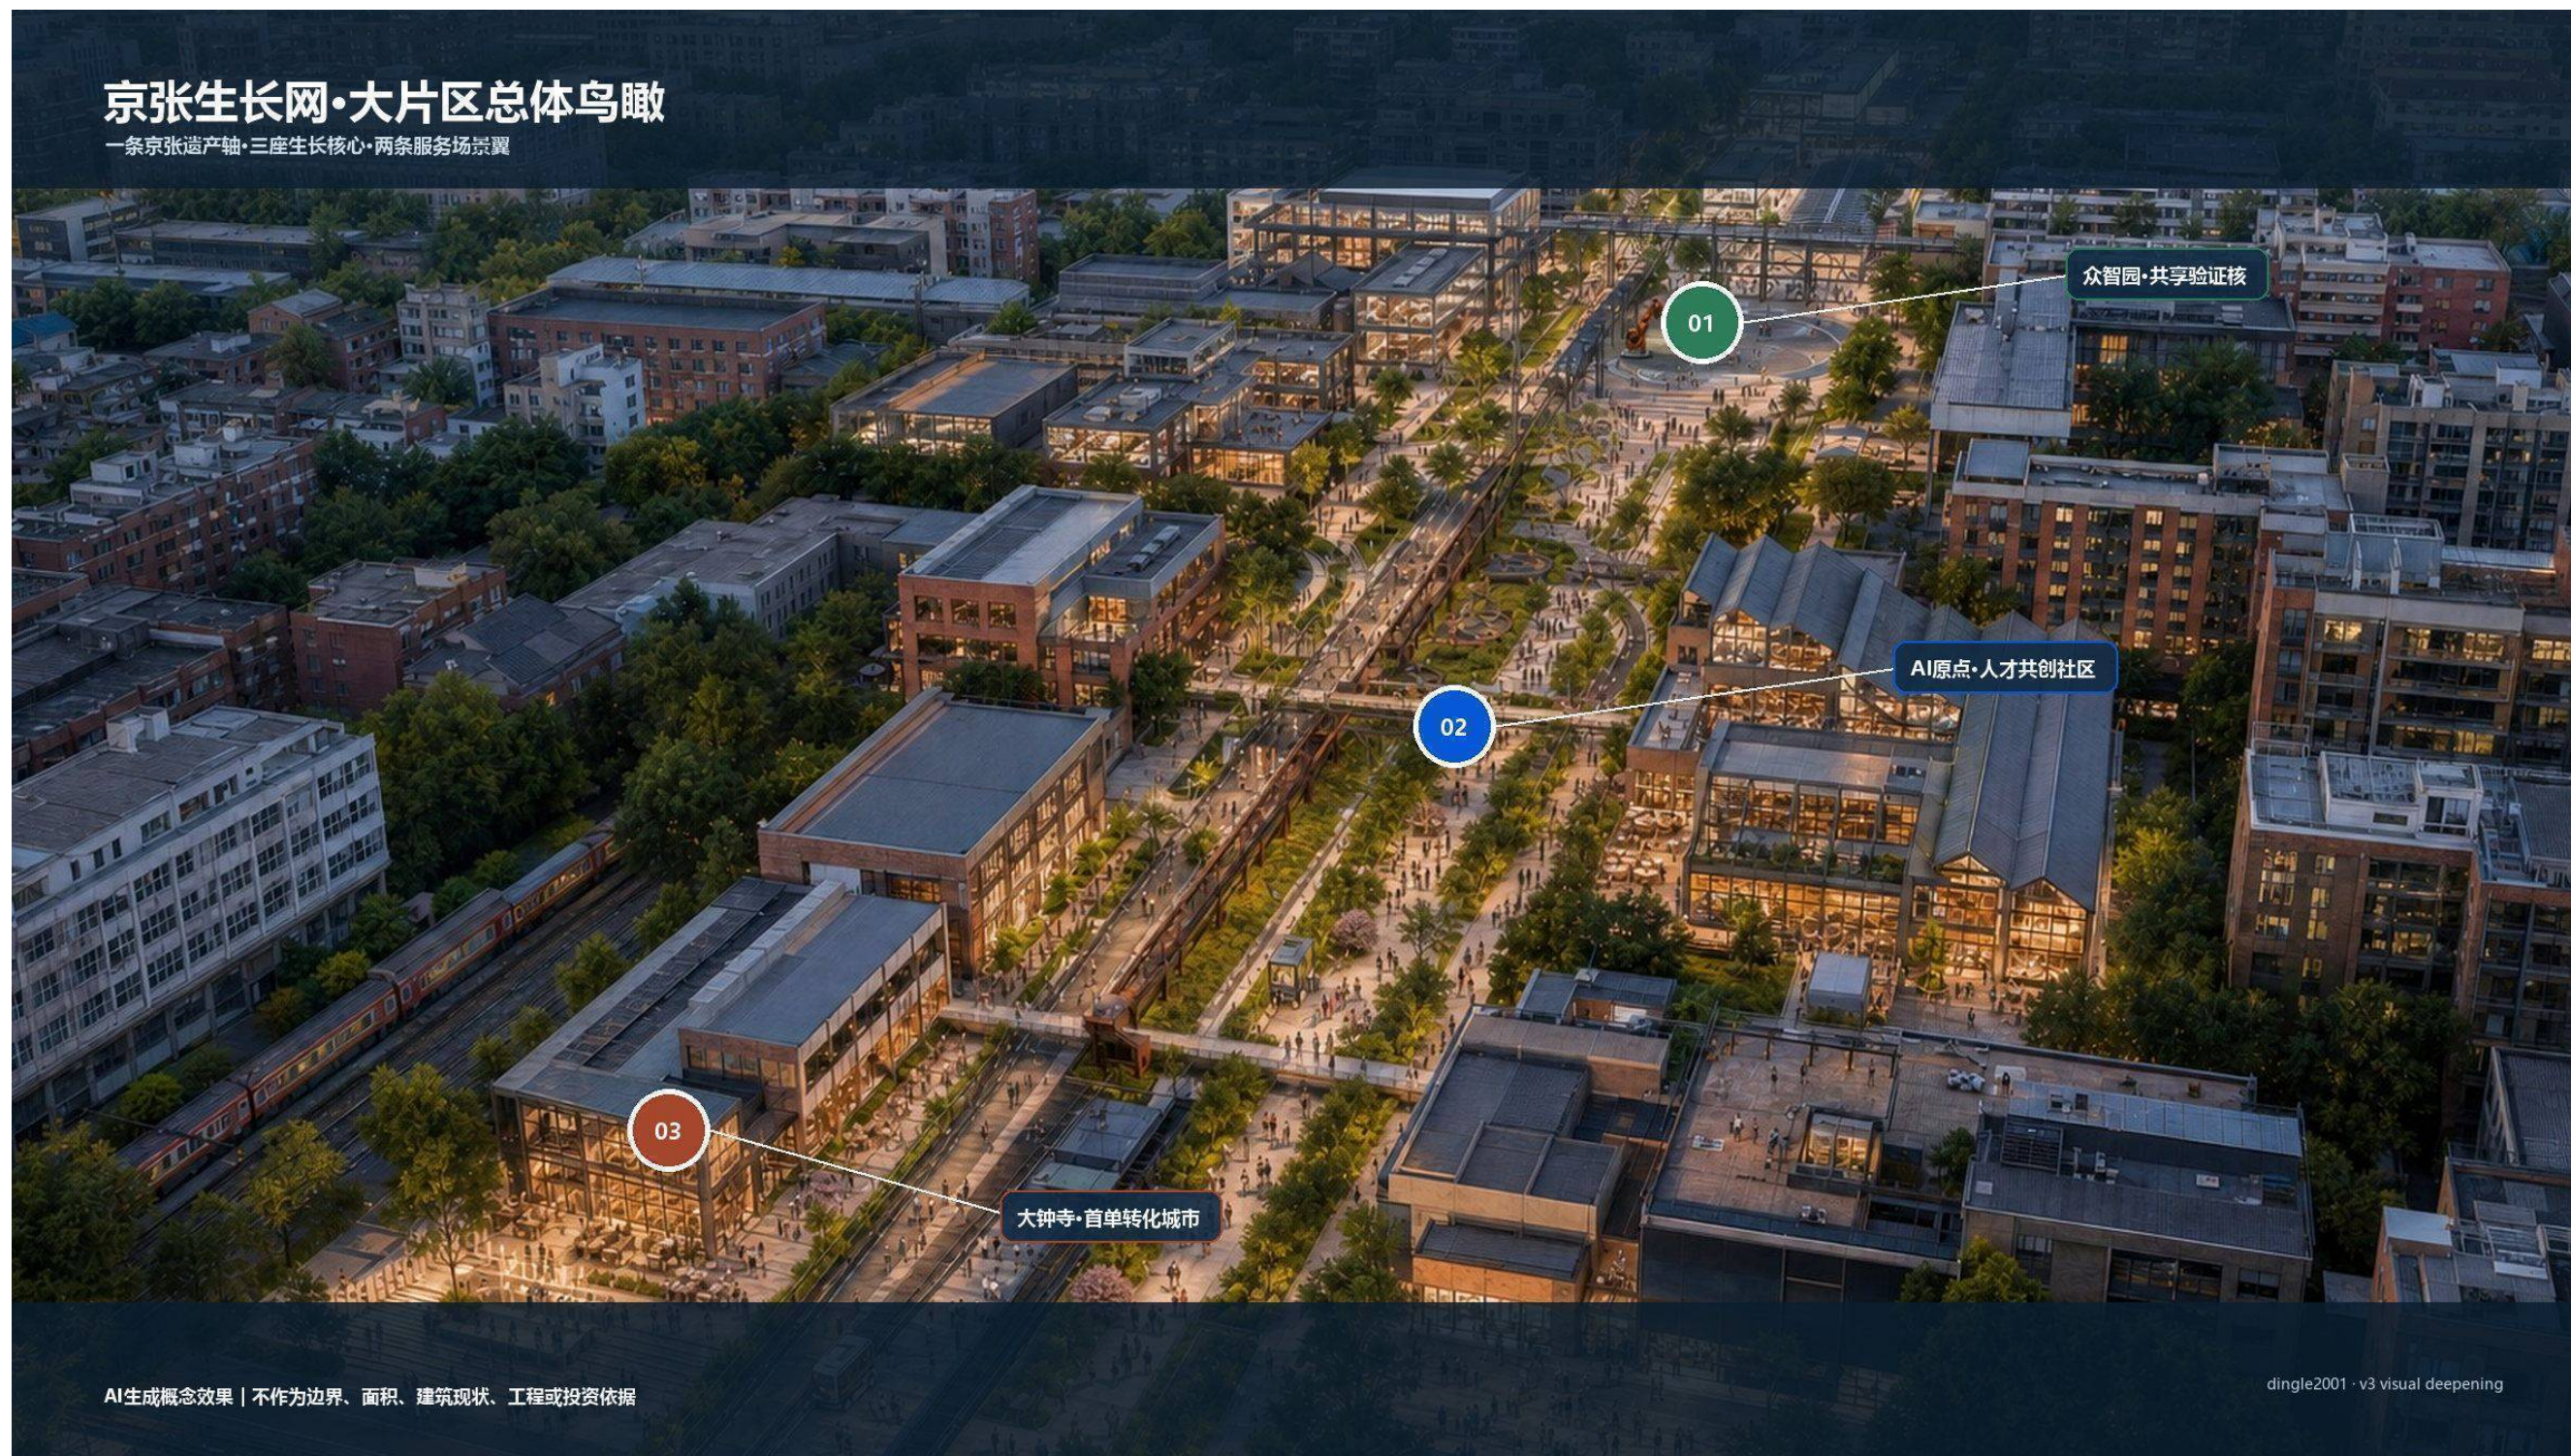

三层范围与场地证据

统筹研究、总体设计、重点区域组成一条从战略到实施的证据链。

CORE-01 场地判断、任务书对位与区域协同


三层范围只作临时约束；机制、责任与协同接口可先行验证

数据派生

概念建议

待专业核验

A | 真实GeoJSON派生的三层空间判断

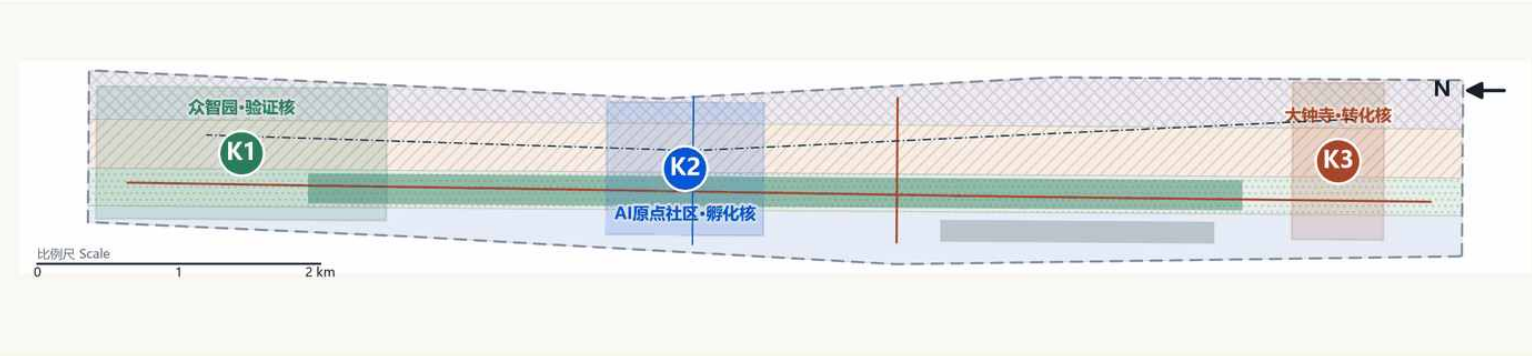

统筹研究 43.6 km²

总体设计 11.4 km²

重点区 368.4 ha

B | 三大定位 × 五大功能 × 六项任务

百年京张文化带

都市AI生活体验带

AI融合创新带

全栈自主

创新生态

场景赋能

活力城市

治理话语

agent.1 总体

agent.2 生态

agent.3 场景

agent.4 公共空间

agent.5 文化

agent.6 运营

对位证据：总图 / 生态网 / 12场景 / 公共空间 / 品牌地标 / 年度运营

C | 无体检不更新：七维基线到项目库

结构设施

消防运行

遗产价值

权属治理

产业适配

交通连续

公共生态

体检诊断

问题 / 资源

项目库

实施方案

运营前置

长效复评

未知项

调查任务

专业签发

继续 / 退阶 / 退出

无基线不评分；任何结构、消防、权属、需求、投资或审批未知项都转成具名调查与停止门。

D | 原创组合与证据边界

原创机制

三核分工 + 七级证据门 + 公共价值回流

数据派生

面积比例只来自临时GeoJSON复算

概念建议

区域合作、项目、门槛、活动与地标

待核验

红线、产权、结构、消防、市政与投资


三层范围均为临时约束；正式红线、面积、产权及法定规划条件由组织方与专业团队另行核验。

CORE-01 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

概念建议 / NTS / 待正式边界、测绘与专业核验

五级生长回路

空间释放—场景植入—社群聚集—项目生成—主体再生产。

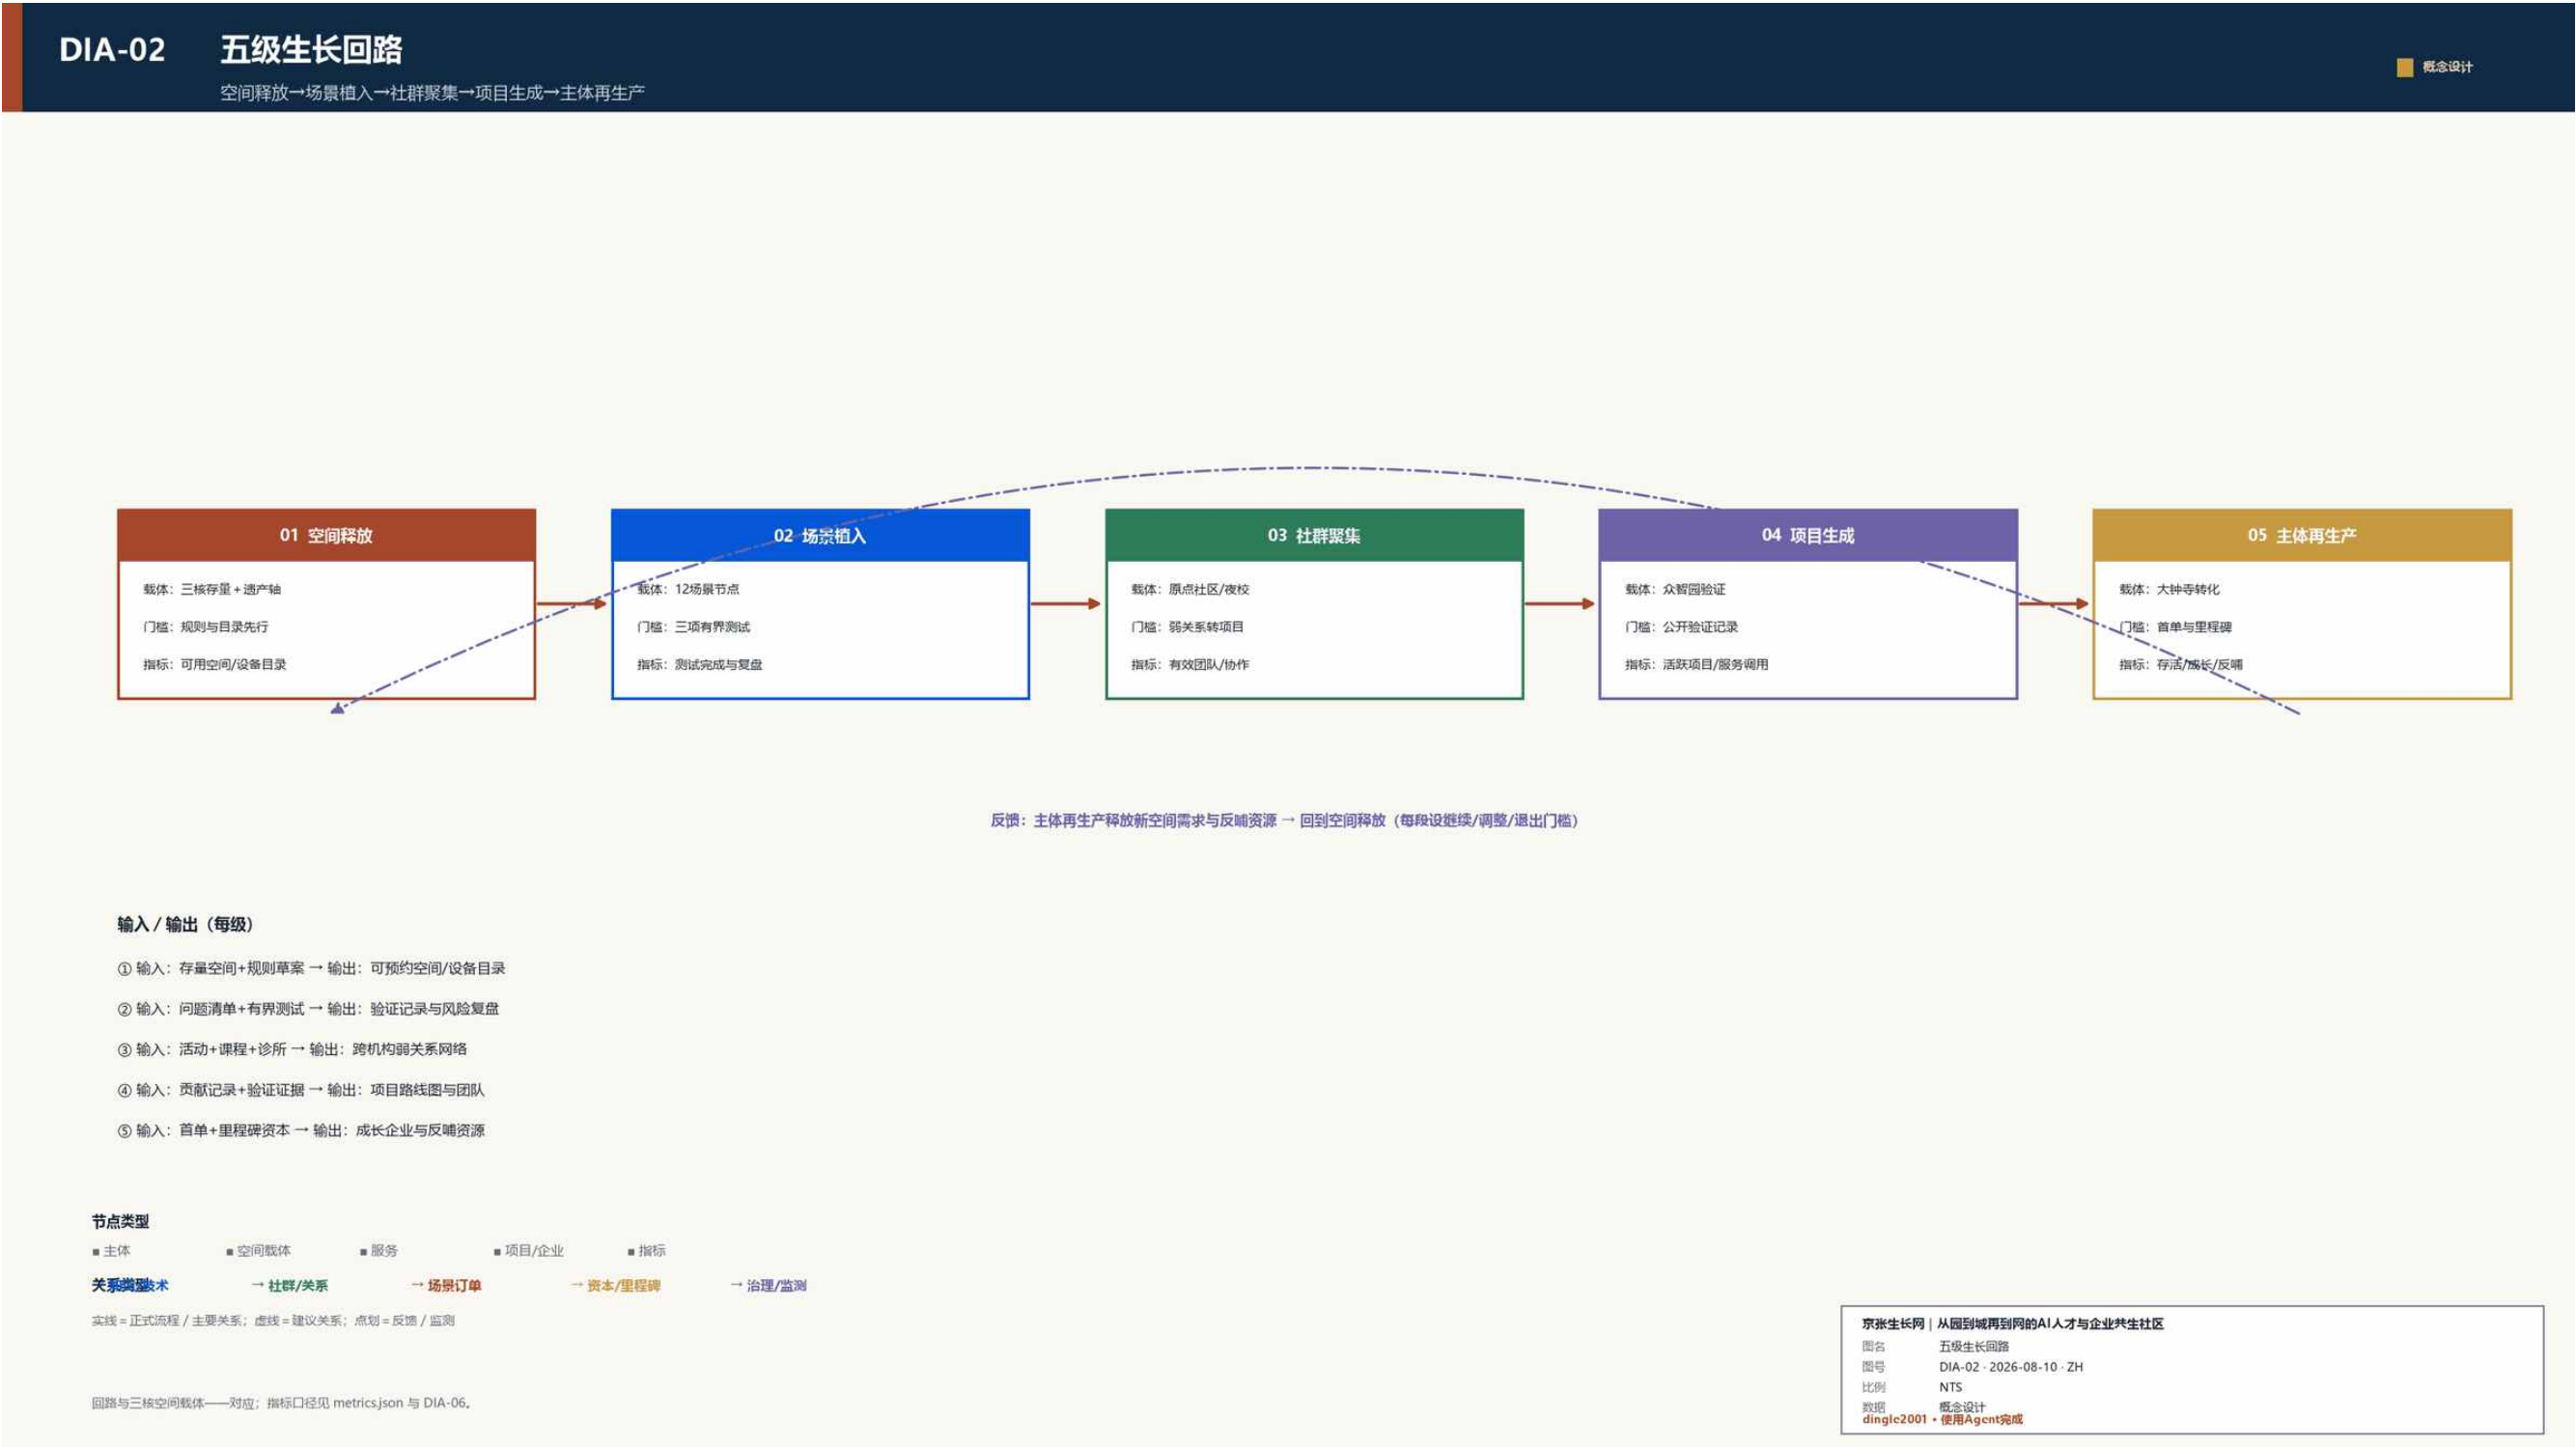


锚点—社群—企业生态网络

把人才关系转成项目，再把项目转成可持续主体。



慢行、蓝绿与公共场景

遗址公园是创新生态的公共客厅，匿名通行与无障碍优先。

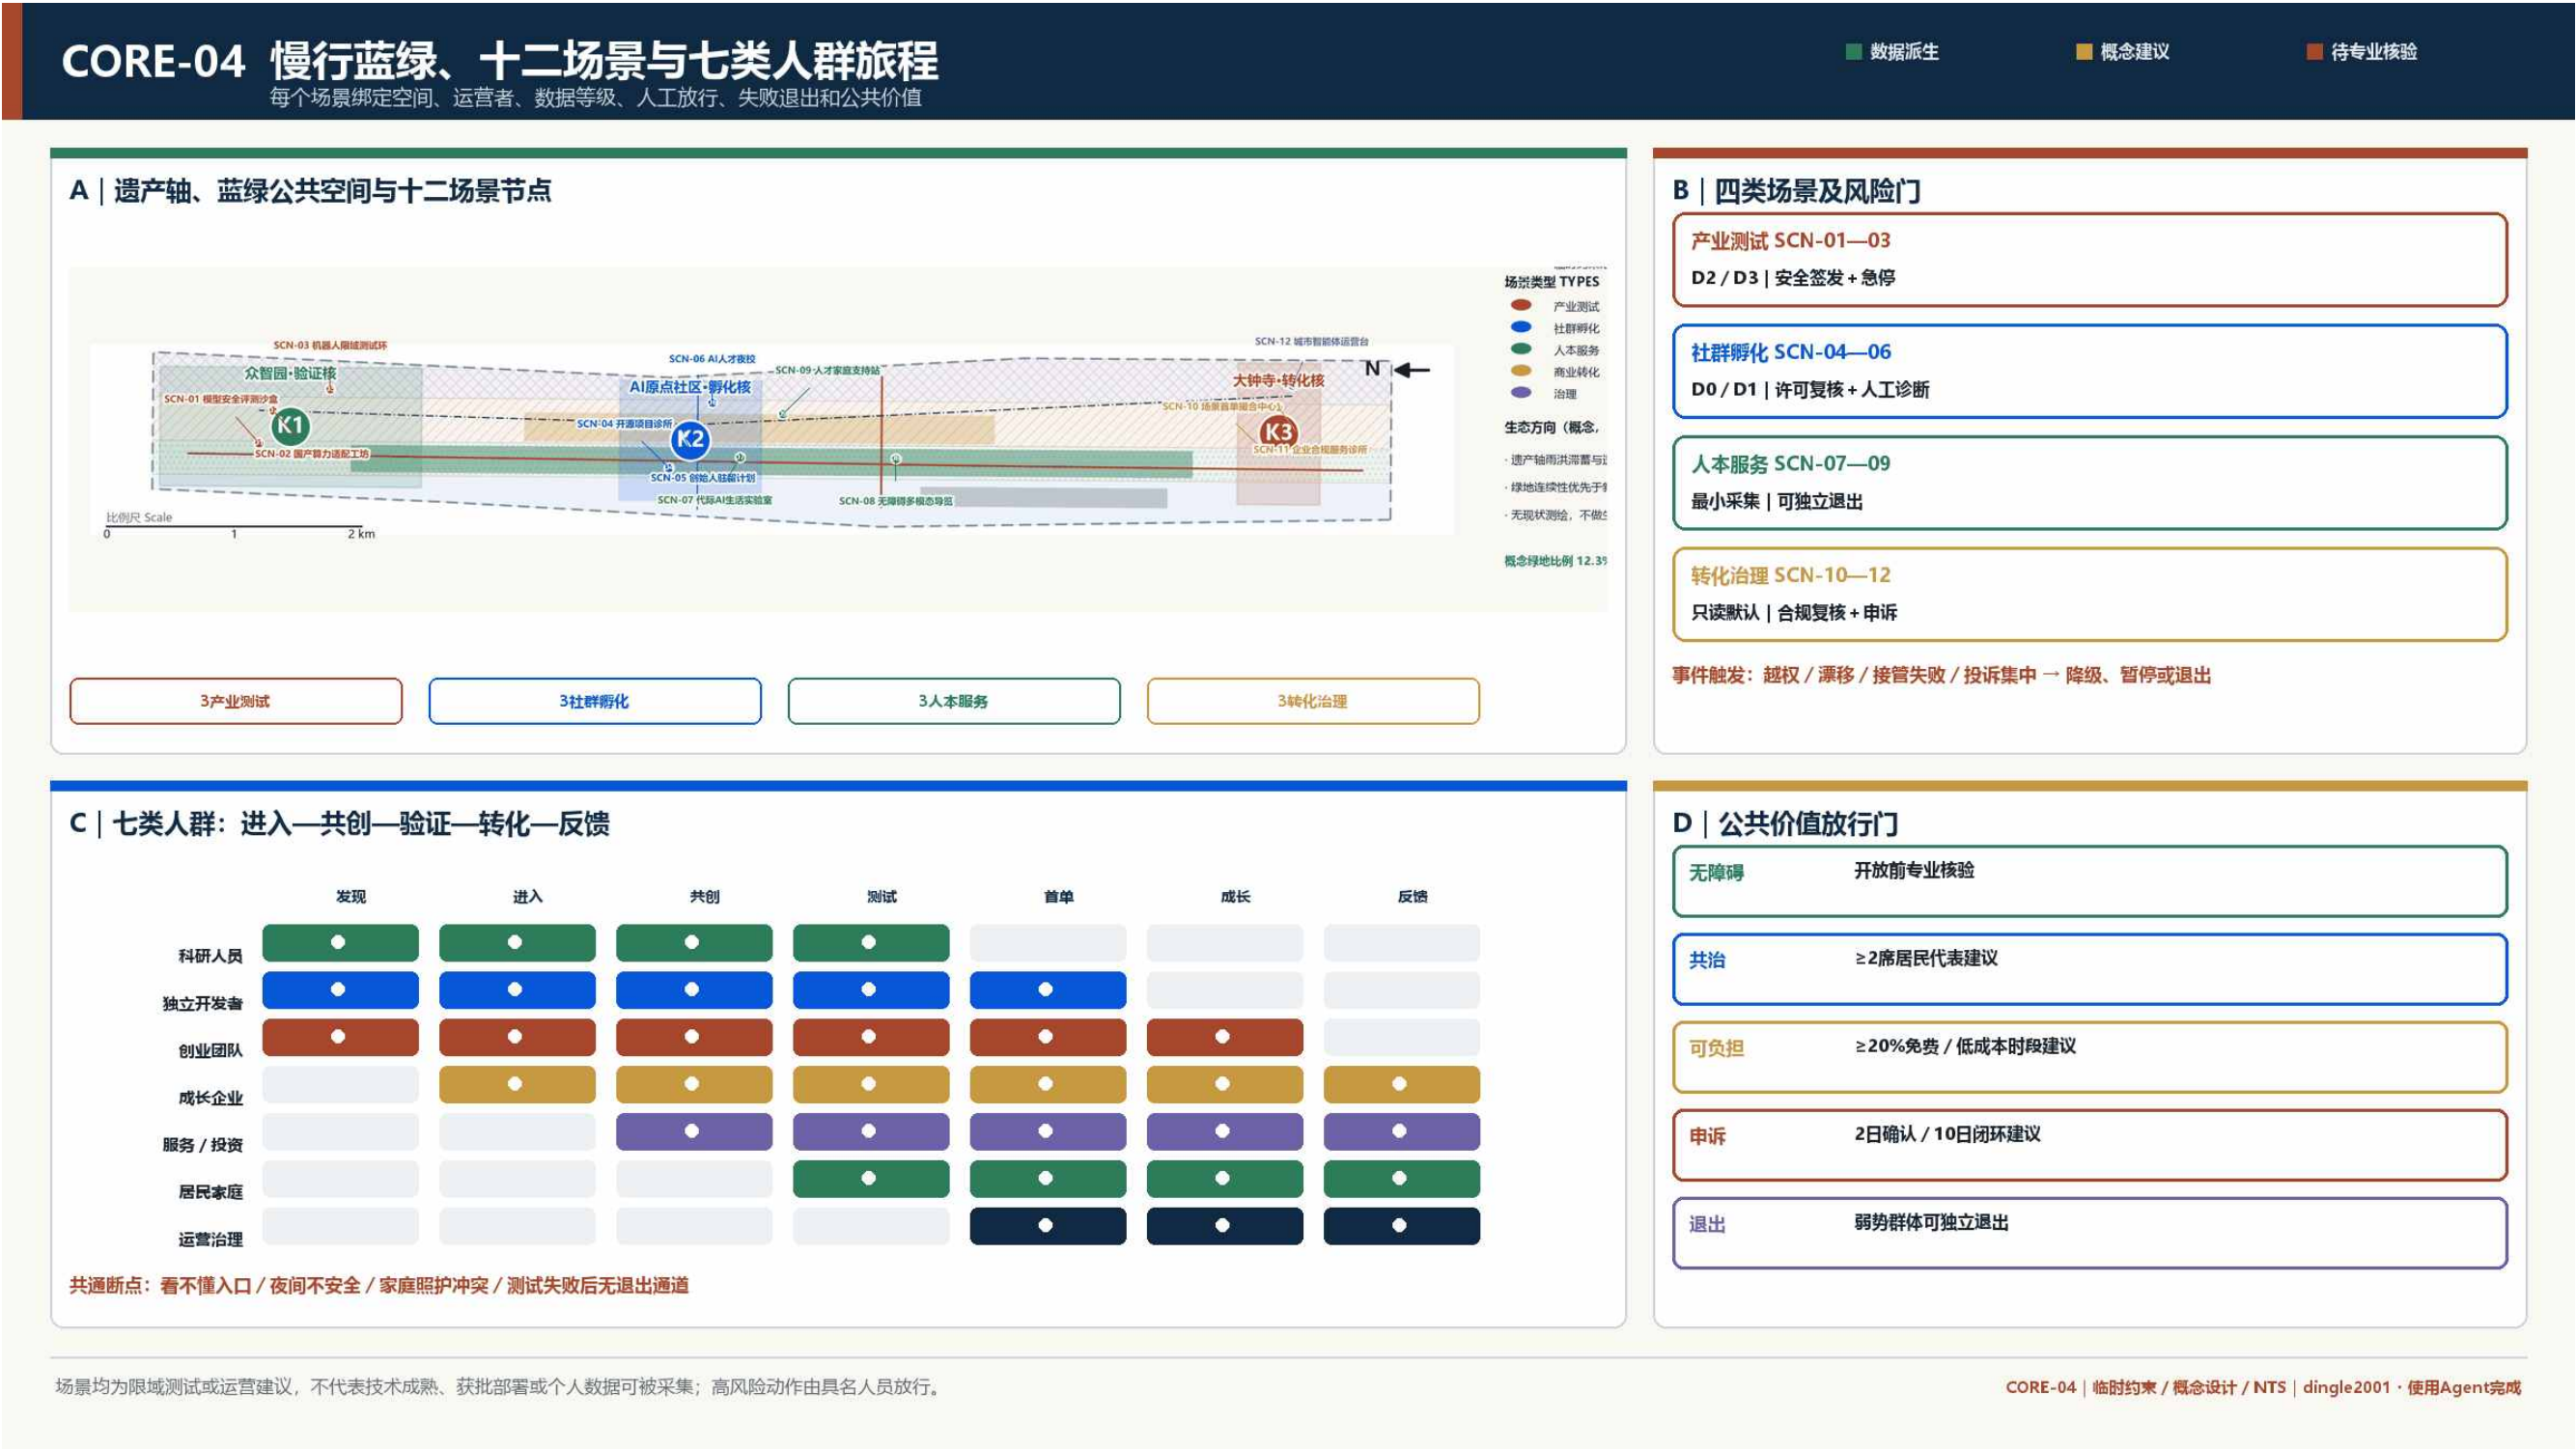

众智园 | 概念视景

共享验证城市：实验脊、测试环、标准庭院和公共科普边界。

VP-02 众智园共享验证庭院



AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

众智园 | 工程剖面与流线

轴网、标高、尺寸链、剖切线权和安全分区均标注概念/NTS/待核验。

K1-SEC 众智园·共享验证城市 | 剖面组


概念剖面 · NTS · 待专业核验

待专业核验


示意比例

概念设计

A—A' | 主剖面：科普界面—共创—实验室—测试庭院

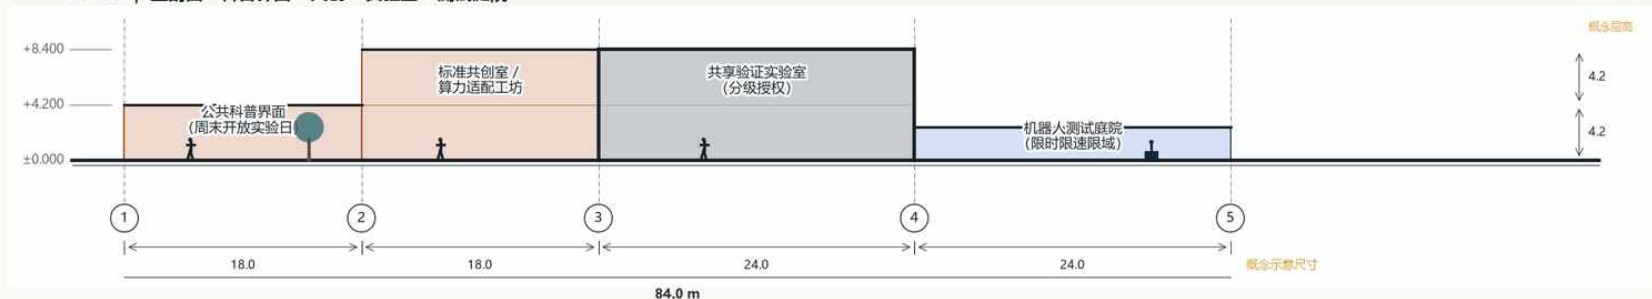

B—B' | 补充剖面：算力工坊—设备后勤—货运界面

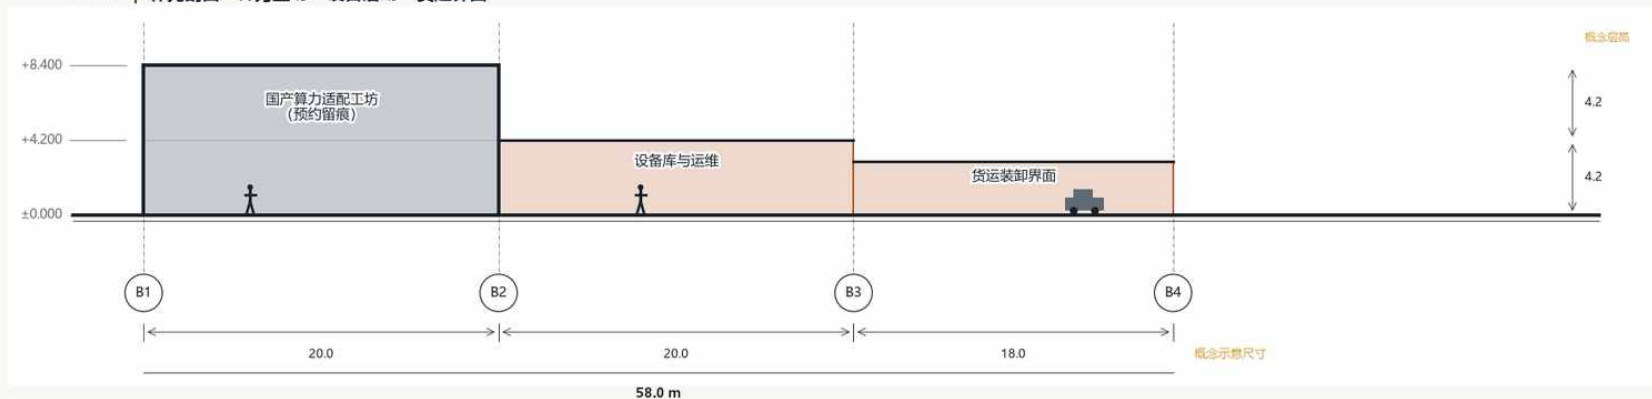

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/*_geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

图例 LEGEND

现状 (示意)

建议更新

概念新增

公共开放

预约共享

专业受控

服务后勤

剖切轮廓 (L1)

投影 / 立面轮廓 (L3)

轴网 (L5)

比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

公共科普 → 预约共创 → 专业受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K1-PLN)

待专业核验

A—A' 设备荷载、消防分隔、测试安全边界待专业核验

B—B' 货运流线、与慢行冲突、噪声影响待专业核验

通用：结构、消防、机电、市政、造价、现状测绘均待专业核验；

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名：众智园·共享验证城市·剖面组

图号：K1-SEC · 2026-08-10 · ZH

比例：NTS 示意比例

数据：概念设计 / 待核验

dinglec2001 · 使用Agent完成

AI原点 | 概念视景

白天转化、夜间共创、周末公共体验的分时人才社区。

VP-03 AI原点社区夜间共创客厅




AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

AI原点 | 空间原型

开源客厅、驻留、夜校和家庭支持形成院落网络。

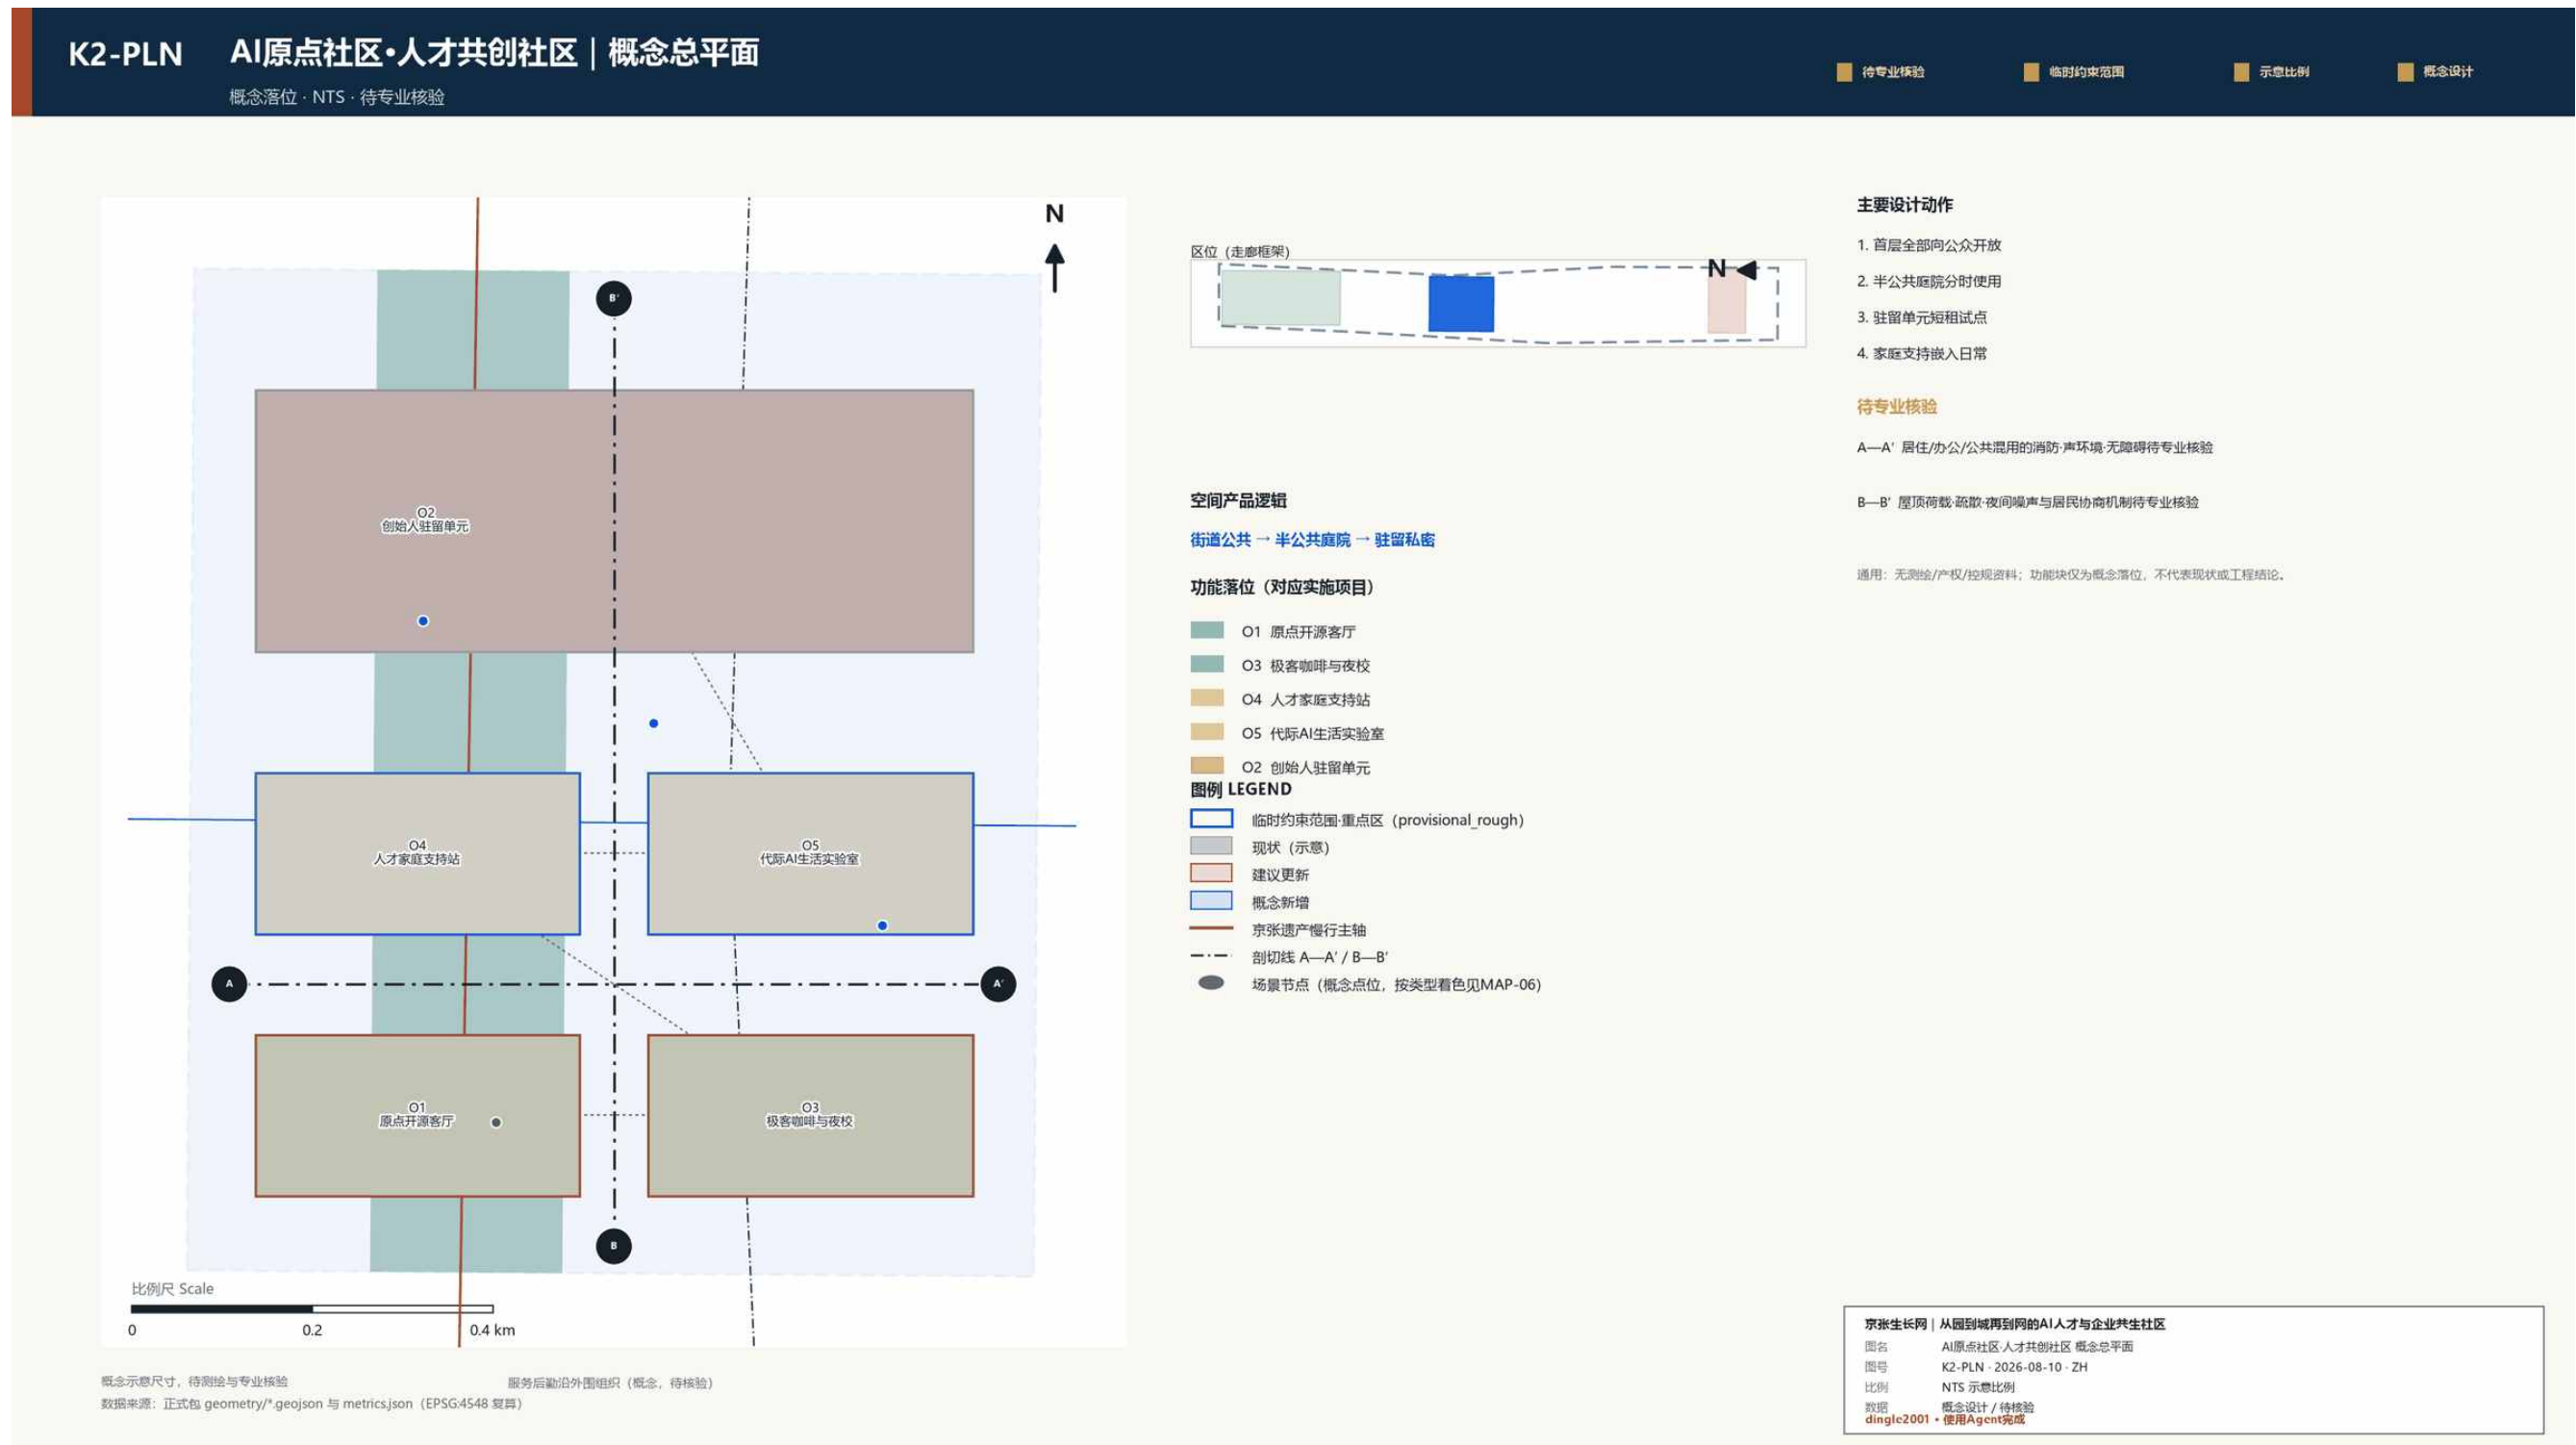

AI原点 | 工程剖面与分时

开放首层、声环境、消防、居住办公边界均待专业签发。

K2-SEC AI原点社区·人才共创社区 | 剖面组


概念剖面·NTS·待专业核验

待专业核验

示意比例

概念设计

A—A' | 主剖面：街道—首层开放—共享层—驻留层

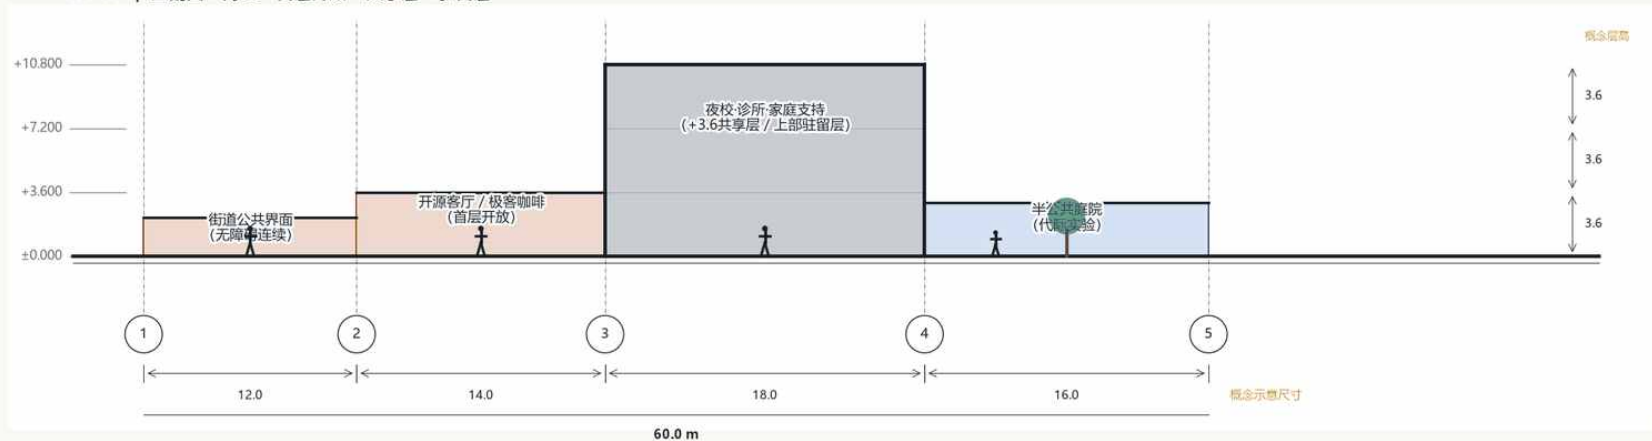

图例 LEGEND

现状 (示意)

建议更新

概念新增

公共开放

预约共享

专业受控

服务后勤

剖切轮廓 (L1)

投影 / 立面轮廓 (L3)

轴网 (L5)

比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

街道公共 → 半公共庭院 → 驻留私密

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K2-PLN)

待专业核验


A—A' 居住/办公/公共混用的消防、声环境、无障碍待专业核验

B—B' 屋顶荷载、疏散、夜间噪声与居民协商机制待专业核验

通用：结构、消防、机电、市政、造价、现状测绘均待专业核验；

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

B—B' | 补充剖面：驻留单元—屋顶露台—分时使用

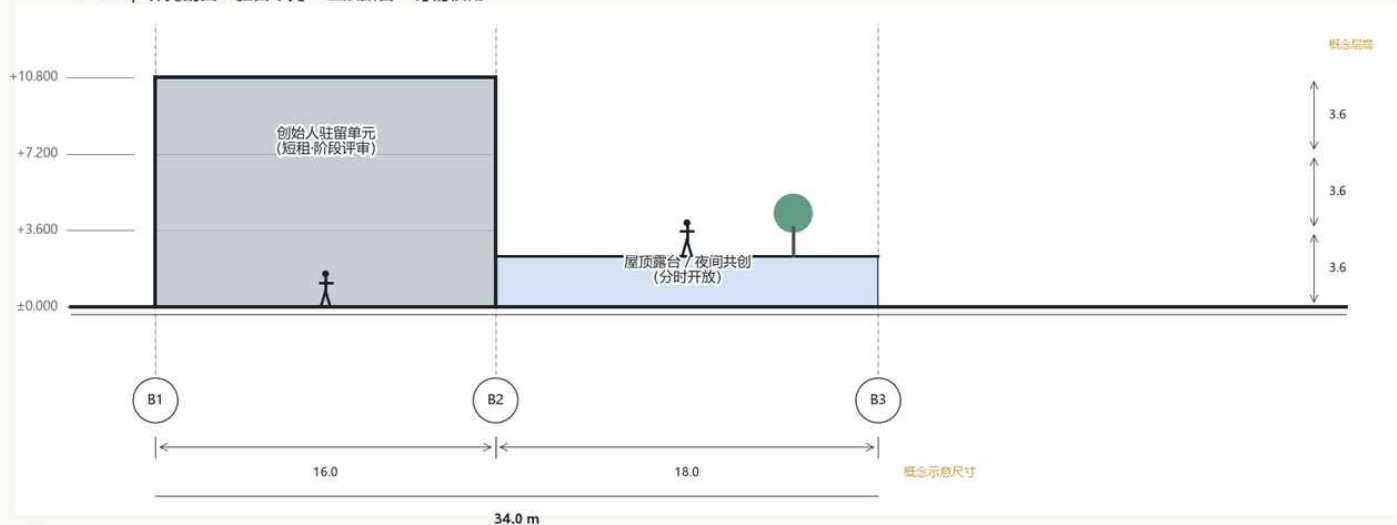

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 AI原点社区·人才共创社区 剖面组

图号 K2-SEC · 2026-08-10 · ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核验

dinglec2001 · 使用Agent完成

大钟寺 | 概念视景

首单、企业服务、合规与资本连接构成开放城市界面。

VP-04 大钟寺企业首单与服务街界面



AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

大钟寺 | 空间原型

门户序列围绕真实遗产主轴组织，主轴通道保持开放。

K3-PLN 大钟寺·首单转化城市 | 概念总平面


概念落位 · NTS · 待专业核验

待专业核验

临时约束范围

示意比例

概念设计

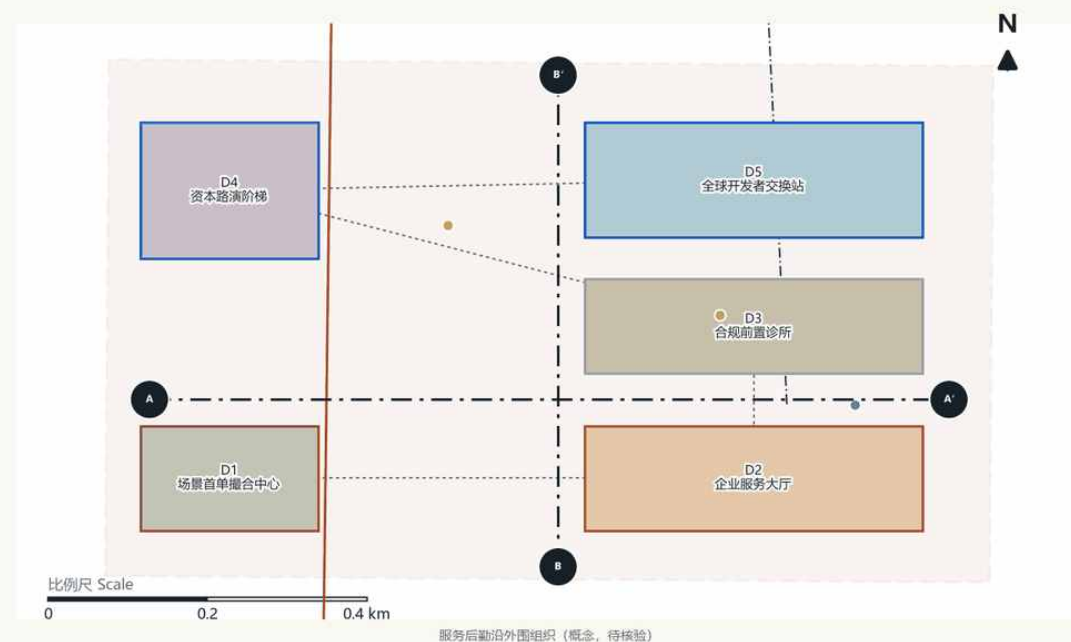

空间产品逻辑

门户公共 → 服务共享 → 办公受控

功能落位 (对应实施项目)

- D1 场景首单撮合中心
- D2 企业服务大厅
- D3 合规前置诊所
- D4 资本路演阶梯
- D5 全球开发者交换站

图例 LEGEND

- 临时约束范围·重点区 (provisional_rough)
- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 京张遗产慢行主轴
- 剖切线 A—A' / B—B'
- 场景节点 (概念点位, 按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

- 门户广场到达序列
- 骑楼雨棚开放首层
- 首单展示临街
- 夜间界面分时管理

待专业核验

A—A' 骑楼结构·大跨雨棚·人流集散与消防待专业核验

B—B' 夜间经营噪声·外摆边界·跨境数据展示合规待专业核验

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。

概念示意尺寸，待测绘与专业核验
数据来源：正式包 geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 大钟寺·首单转化城市·概念总平面
图号 K3-PLN-2026-08-10-ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核验
dinglec2001 · 使用Agent完成

大钟寺 | 工程剖面与首单流

展示—服务—路演—专业支持形成可切换而非封闭总部大堂。


K3-SEC 大钟寺·首单转化城市 | 剖面组

概念剖面·NTS·待专业核验

待专业核验

示意比例

概念设计

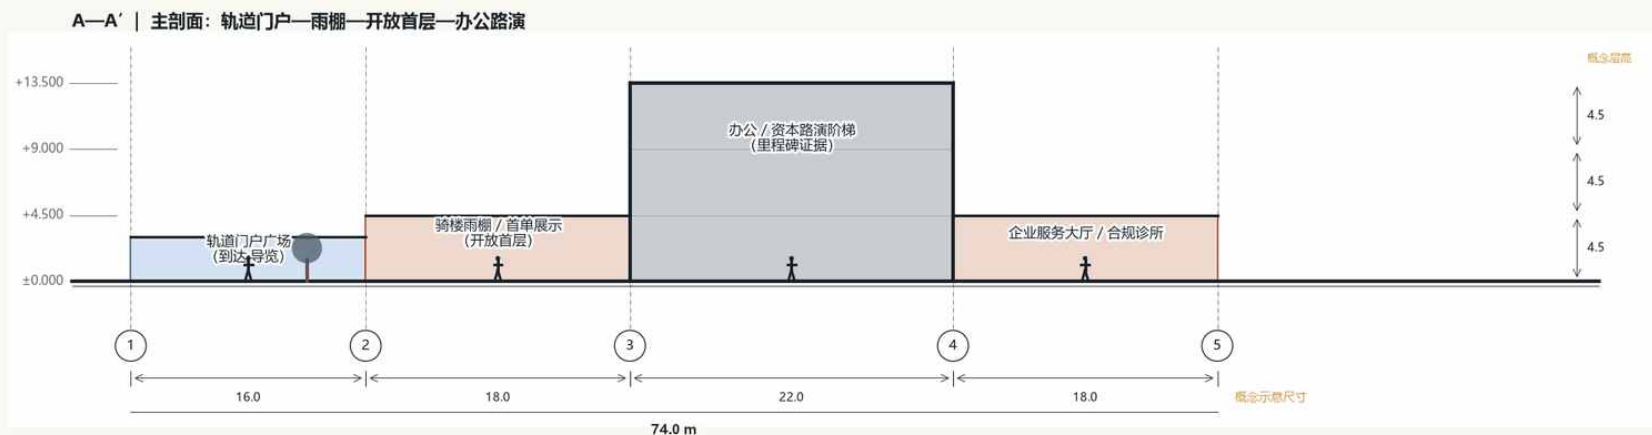

图例 LEGEND

现状（示意）

建议更新

概念新增

公共开放

预约共享

专业受控

服务后勤

剖切轮廓（L1）

投影 / 立面轮廓（L3）

轴网（L5）

比例参照：人物=1.7m

空间开放梯度

门户公共 → 服务共享 → 办公受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置同组概念总平面（K3-PLN）


待专业核验

A—A' 骑楼结构·大跨雨棚·人流集散与消防待专业核验

B—B' 夜间经营噪声·外摆边界·跨境数据展示合规待专业核验

通用：结构·消防·机电·市政·造价·现状测绘均待专业核验；

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

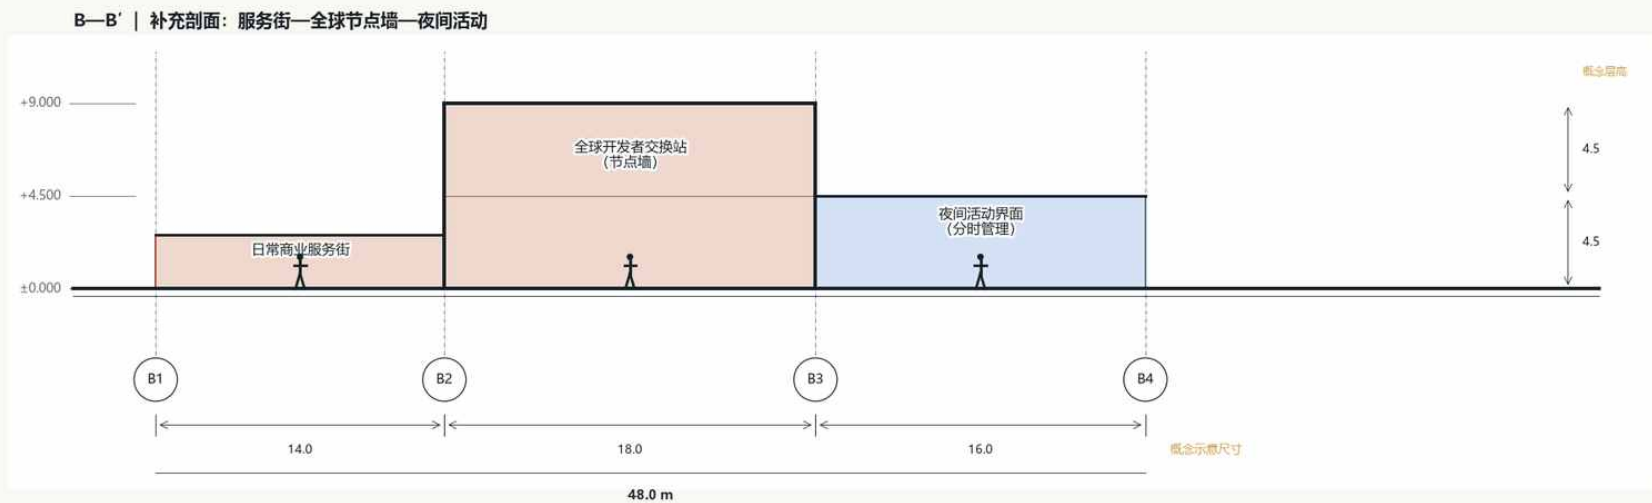

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json（EPSG:4548 复算）

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名：大钟寺·首单转化城市·剖面组

图号：K3-SEC·2026-08-10-ZH

比例：NTS 示意比例

数据：概念设计 / 待核验

dinglec2001 · 使用Agent完成

科研人员

成果转化与兼职协作

核心需求

成果转化与兼职协作

空间与服务

可信测试、项目诊所、专业签发

公共 / 治理门

以项目证据而非到访量判断转化

可验证结果

使用记录 + 项目证据 + 申诉与退出记录

独立开发者

低成本进入与寻找同伴

核心需求

低成本进入与寻找同伴

空间与服务

短租工位、开源客厅、算力适配

公共 / 治理门

保留无会员、无应用的公共入口

可验证结果

使用记录 + 项目证据 + 申诉与退出记录

创业团队

稳定组队、验证与第一位客户

核心需求

稳定组队、验证与第一位客户

空间与服务

驻留、测试、首单与合规

公共 / 治理门

不得以路演或意向替代首单证据

可验证结果

使用记录 + 项目证据 + 申诉与退出记录

成长企业

扩张空间、标准与资本连接

核心需求

扩张空间、标准与资本连接

空间与服务

共享设施、服务大厅、里程碑路演

公共 / 治理门

成长企业须反哺设备、导师或开放时间

可验证结果

使用记录 + 项目证据 + 申诉与退出记录

专业服务与投资机构

可信项目入口与责任边界

核心需求

可信项目入口与责任边界

空间与服务

具名签发、透明收费、证据包

公共 / 治理门

资质、利益冲突与适当性必须公开

可验证结果

使用记录 + 项目证据 + 申诉与退出记录

居民家庭

便利生活且不被迫试验

核心需求

便利生活且不被迫试验

空间与服务

家庭支持、无障碍、代际共创

公共 / 治理门

基本服务不绑定数据授权，随时退出

可验证结果

使用记录 + 项目证据 + 申诉与退出记录

运营治理人员

可调度、可审计、可停止

核心需求

可调度、可审计、可停止

空间与服务

城市运营台、事件日志、季度复评

公共 / 治理门

高风险动作人工授权，证据不足不扩张

可验证结果

使用记录 + 项目证据 + 申诉与退出记录

模型安全评测沙盒

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

模型上线前缺独立、可复现的安全验证

数据

D3受限测试；最小授权

人工放行

高风险结果由安全负责人放行

验收

版本、权限、测试和复盘记录完整

服务旅程

登记—隔离测试—双人复核—签发—复盘

无AI路径

线下测试单与人工评审

停止

越权、不可复现或隔离失效即封存

服务对象

科研与创业团队

国产算力适配工坊

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

迁移适配成本高且参数敏感

数据

D2商业敏感

人工放行

企业确认后发布报告

验收

兼容性报告可复核且来源有授权

服务旅程

预约—授权—适配—复核—迁移清单

无AI路径

人工兼容性测试与文档比对

停止

泄露或迁移失败即撤回

服务对象

开发者与成长企业

机器人限域测试环

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题 真实城市测试与公共安全冲突	服务旅程 开场检查—限域运行—接管—事件复盘
数据 D2设备与事件	无AI路径 实体围挡、人工安全员和手动测试
人工放行 每日人工开场，异常远程接管	停止 越界或接管失效立即急停
验收 零未接管越界，事件全留痕	服务对象 机器人企业与公众
无基线不评分 · 具名责任 · 验收证据 · 继续 / 调整 / 退阶 / 退出	

开源项目诊所

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

贡献难转为稳定路线图

数据

D1项目记录

人工放行

维护者确认许可与合并

验收

每案形成许可、路线图和责任清单

服务旅程

许可检查—问题诊断—路线图—责任认领

无AI路径

面对面代码评审与纸面清单

停止

许可或归属争议即暂停

服务对象

科研人员与独立开发者

创始人驻留计划

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题
短期组队缺空间和组织支持

数据
D2身份与项目

人工放行
团队自愿披露，导师利益冲突回避

验收
退出、删除与成果归属条款完整

服务旅程
申请—回避核验—驻留—阶段评审—退出

无AI路径
公开工位申请与人工面谈

停止
歧视或利益冲突未处置即终止

服务对象
独立开发者与创业团队

AI人才夜校

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题
跨机构学习缺稳定夜间入口

数据
D0课程 + D1报名

人工放行
讲师审核内容，运营方控制时段

验收
课程有大纲、反馈和噪声处置记录

服务旅程
共创选题—讲师审核—开课—反馈—复办

无AI路径
现场报名、纸质材料和人工授课

停止
不当内容或扰民则撤课调时

服务对象
人才与居民

代际AI生活实验室

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

生活需求难进入研发且弱势群体易被动参与

数据

D2敏感个人

人工放行

本人或监护同意 + 伦理复核

验收

100%可撤回且基本服务不绑定参与

服务旅程

需求共创—同意—小测—人工服务—退出删除

无AI路径

完全线下等价服务

停止

不适或撤回即退出并删除

服务对象

居民家庭与开发者

无障碍多模态导览

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题
连续路线难理解、技术失效会放大障碍

数据
D0导览 + D2按需辅助

人工放行
无障碍专业人员校核后上线

验收
开放前专业核验，投诉可追踪

服务旅程
专业核线—发布—按需辅助—投诉闭环

无AI路径
实体导视、人工问询和纸质地图

停止
误导或中断即切换线下

服务对象
居民与访客

人才家庭支持站

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

托育养老等服务信息分散

数据

D2家庭服务

人工放行

人工窗口确认每次转介

验收

每次有授权、回执与撤销机制

服务旅程

需求登记—人工确认—授权转介—回执撤销

无AI路径

现场窗口与电话转介

停止

错误转介或隐私串联即停接口

服务对象

科研人才与家庭

场景首单撮合中心

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题

技术与真实需求、采购判断脱节

数据

D2采购与商业

人工放行

需求方与合规人员双签

验收

问题、验证、采购三段证据完整

服务旅程

问题发布—利益冲突声明—验证—双签—采购评估

无AI路径

公开问题会、人工评审和线下撮合

停止

虚假需求或利益冲突即下架

服务对象

创业团队与需求单位

企业合规服务诊所

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题 AI建议可能越过专业资质边界	服务旅程 问题归类—依据检索—人工复核—签发或转介
数据 D2企业合规	无AI路径 人工咨询和纸质清单
人工放行 具资质人员签发正式意见	停止 错误、超资质或依据失效拒绝签发
验收 正式意见全部可追溯至签发人	服务对象 企业与专业服务机构

城市智能体运营台

场景合同同时定义服务、技术、人工责任与退出。

问题
跨场景调度缺审计、申诉和人工接管

数据
D1运营 + D2投诉

人工放行
高风险动作逐项人工授权

验收
最小权限、全日志、抽检和接管可用

服务旅程
只读观察—建议—人工授权—执行—审计—申诉

无AI路径
人工台账、电话和现场服务

停止
越权、漂移或申诉积压降级只读

服务对象
运营人员与公众

十二场景技术治理矩阵

D0—D3、M1—M3、人工放行、失败模式与证据链。

DIA-05 城市智能体：最小权限、人工放行与公开审计

从数据进入到申诉关闭，每一步都有责任人、日志和停止条件


待专业核验

概念设计

A | 数据分级与允许用途



C | 最小权限执行栈




D | 一条可公开核验的审计记录



B | 三项高风险场景最小协议



E | 事件与申诉时间线



本图定义最小治理协议，不证明系统已部署。日志样例为字段模板，不是现实运行记录。
高风险动作默认禁止；专业审批、公共服务决定与权利处分必须由具名人员完成。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 城市智能体治理协议
图号 DIA-05 - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS
数据 CONCEPT / PENDING
dinglec2001 • 使用Agent完成

小月河场景赋能翼

公共问题进入测试订单，测试结果回到公共空间改进。


DIA-20 小月河场景赋能翼与公共体验路径

把交通、环境、社区、公共空间问题做成可测试订单

示意比例

概念设计

小月河场景赋能翼：问题→可测试订单



公共体验路径（概念示意）



公共体验路径把三核、遗产轴与两翼连成连续的可体验界面；匿名通行与自由停留不被“智慧设施”侵蚀。

小月河翼只表达场景赋能机制与路径，不声称交通组织或市政条件已获批准。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 小月河场景赋能翼
图号 DIA-20 · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS
数据 概念设计
dinglc2001 · 使用Agent完成

共享验证实验室

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 中小团队缺乏可信测试设施	原因 设备门槛高、共享规则与责任链缺失	措施 先核验大跨空间，再以预约、分级权限和专业签发组织共享设备
产出 设备目录、预约协议、实验单、事件日志	结果 验证从口头背书转为可复现证据	指标 设备利用率、可复现实验占比、重大事件
运营 专业测试运营方；按设备时长与任务服务核算	时序 0—1年协议与小规模试点	资金 准公益：公共引导 + 设备服务；金额待测算
停止门 结构 / 消防 / 荷载未签发即不进场		

国产算力适配工坊

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 团队迁移国产算力试错成本高	原因 软硬件兼容信息分散且商业参数敏感	措施 用授权数据和隔离环境完成适配、迁移与复盘
产出 兼容性报告、迁移清单、问题知识库	结果 降低重复试错并形成可复用适配路径	指标 报告复核率、迁移闭环数、泄露事件
运营 算力服务商 + 开源社区；任务费与设备服务	时序 0—1年首批任务	资金 准公益：服务商投入 + 政策工具 + 任务费
停止门 来源、授权或隔离条件不明即暂停		

机器人限域测试环

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 机器人缺少贴近城市的低风险测试环境	原因 公共慢行与测试流线冲突，保险和接管责任不清	措施 物理围挡、分时、限速、急停、远程接管和现场安全员
产出 测试时窗图、开场清单、事件与复盘记录	结果 形成可监管的城市应用前验证	指标 未接管越界、急停响应、事件闭环
运营 场地运营方 + 安全责任主体；按测试时窗计费	时序 0—1年封闭测试	资金 准公益：场地投入 + 测试服务费
停止门 侵入公共线或接管失效立即停场		

标准共创室

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 测试结果难沉淀为跨企业共识	原因 议题、知识产权和成果责任不清	措施 以问题单—证据包—工作坊—公开摘要组织标准共创
产出 议题库、会议纪要、证据摘要、建议稿	结果 把单次测试转为可共享规则	指标 形成建议稿数、采纳反馈、权利争议
运营 行业协会 + 专业机构；会费与任务采购	时序 0—1年季度工作坊	资金 公益：公共支持 + 协会资源
停止门 无问题所有者或IP边界不明不开题		

公共科普界面

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 高安全验证与公众理解之间缺少接口	原因 测试空间封闭、科普容易变成营销	措施 设置观察廊、周末开放日和非敏感成果解释
产出 开放规则、科普脚本、风险隔离与反馈	结果 提高AI产业的可理解性和公共回流	指标 开放时长、无障碍覆盖、投诉闭环
运营 园区运营方 + 科普机构；公共服务采购	时序 0—1年周末试办	资金 公益：公共投入 + 科普资源
停止门 隔离、讲解责任或清权未完成不开放		

原点开源客厅

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 开发者有活动但缺稳定项目协作	原因 贡献许可、项目诊断和持续主理人不足	措施 以每周诊所、维护者驻场和贡献记录组织协作
产出 许可清单、路线图、责任分工、复盘	结果 从到访关系形成可持续项目	指标 持续团队数、合并贡献、争议闭环
运营 社区运营方 + 开源维护者；会员与公共补贴	时序 0—1年先运行后改造	资金 准公益：公共补贴 + 赞助 + 服务
停止门 许可争议或只有客流没有项目即调整		

创始人驻留单元

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 早期团队缺低成本短周期工作生活支撑	原因 长租、高押金与办公居住边界形成排斥	措施 小批短驻、明确用途、导师回避和阶段评审
产出 驻留协议、回避记录、里程碑和退出单	结果 降低团队形成期的生活与空间摩擦	指标 驻留完成率、团队稳定率、退出争议
运营 专业孵化运营方；短租与孵化服务	时序 1—3年小批滚动	资金 经营：运营收入 + 孵化基金
停止门 用途、消防或公平筛选不清即不入住		

极客咖啡与夜校

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 科研人才与社区缺低门槛夜间交流	原因 日间办公化、夜间内容弱且可能扰民	措施 分时空间、课程共创、噪声边界和非消费座位
产出 课程表、空间转换清单、噪声与反馈记录	结果 形成跨机构弱关系和持续学习网络	指标 课程复办率、非消费时段、扰民投诉
运营 社区商业 + 课程策展；餐饮与课程收入分账	时序 0—1年闪电演讲试点	资金 经营：运营收入 + 课程服务
停止门 扰民或消费挤占公益时段即减时调整		

人才家庭支持站

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 人才家庭托育、养老与应急转介成本高	原因 服务信息碎片、责任边界和隐私隔离不足	措施 建立人工窗口、授权转介和回执撤销机制
产出 服务目录、转介单、回执、投诉闭环	结果 减少人才留下来的日常生活摩擦	指标 有效转介、响应时长、撤销与投诉
运营 社区服务机构；公共服务采购	时序 0—1年需求登记，1—3年常态化	资金 公益：公共投入 + 社区服务资金
停止门 无人工确认或隐私串联立即停接口		

代际AI生活实验室

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 技术研发缺真实生活反馈，居民又易被当测试对象	原因 知情同意、弱势保护与基本服务边界不足	措施 小范围共创、随时退出、线下等价服务和伦理复核
产出 同意书、测试单、退出与删除记录、需求清单	结果 让生活需求反哺产品且不牺牲基本权益	指标 可撤回率、需求采纳、负面事件
运营 社区 + 技术团队；研究服务与公共支持	时序 1—3年限域共创	资金 准公益：公共补贴 + 技术团队投入
停止门 撤回未执行或基本服务绑定参与即停止		

场景首单中心

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 早期项目难获得第一位真实客户	原因 需求发布、验证和采购边界脱节	措施 用问题目录、验证单、双签和采购评估形成证据链
产出 问题单、验证报告、利益冲突声明、采购评估	结果 让技术成果获得可核验的首个应用机会	指标 完整证据链、转采购评估率、虚假需求
运营 产业运营平台；服务费与采购支持	时序 0—1年问题目录，1—3年常态化	资金 准公益：运营收入 + 服务费
停止门 虚假需求或利益冲突未披露立即下架		

企业服务大厅

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题	原因	措施
初创企业寻找登记、财税、知识产权等服务成本高	入口分散、资质与收费不透明	建立统一目录、具名专业人员、预约与评价机制
产出	结果	指标
服务目录、资质价格、预约单、服务回执	降低企业组织化和成长的交易成本	服务闭环、重复咨询下降、投诉处置
运营	时序	资金
专业服务联合体；透明服务收费	1—3年分批引入	经营：服务收费 + 空间运营
停止门		
资质、价格或责任主体不透明不入驻		

合规前置诊所

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 AI企业在开业和场景上线前合规判断不足	原因 AI建议易替代专业判断，跨专业事项无人签发	措施 AI仅辅助归纳，由具资质人员复核签发并记录边界
产出 开业清单、签发意见、转介单、版本记录	结果 把整改从事后处罚前移到上线前	指标 专业签发率、整改闭环、超范围拒签
运营 登记、法律、知识产权等专业人员；按件服务	时序 0—1年清单试用	资金 经营：专业服务收费
停止门 无人签发、超资质或依据失效即拒绝出具		

资本路演阶梯

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 项目展示多、里程碑和风险证据少	原因 宣传替代验证，适当性和信息披露不足	措施 只接受通过证据门的项目，采用里程碑、风险与资金用途模板
产出 证据包、披露书、问答记录、后续动作	结果 提高资本连接的可信度而非制造融资承诺	指标 有效跟进、信息更正、投诉事件
运营 运营方 + 投资机构；活动服务费	时序 1—3年季度举行	资金 经营：活动与专业服务
停止门 证据缺失或误导性表述立即撤场		


全球开发者交换站

项目合同：建设内容必须追溯到问题，结果必须落到证据和责任。

问题 国际协作易停留在一次性会展	原因 合作权利、跨境数据与后续转化机制不足	措施 以双语问题单、开源许可、节点互认和90日跟进组织交换
产出 清权内容、交换记录、后续协作与撤回机制	结果 形成长期开发者网络和项目转化	指标 持续协作、双语可达、权利异议
运营 社区运营方 + 经书面确认的伙伴；项目制	时序 3—5年证据成熟后	资金 准公益：公共支持 + 合作投入
停止门 无书面确认不得使用机构名标或跨境传输		


实施六闭环

诊断、政策、主体、资金、建设运营、评价迭代缺一不可。

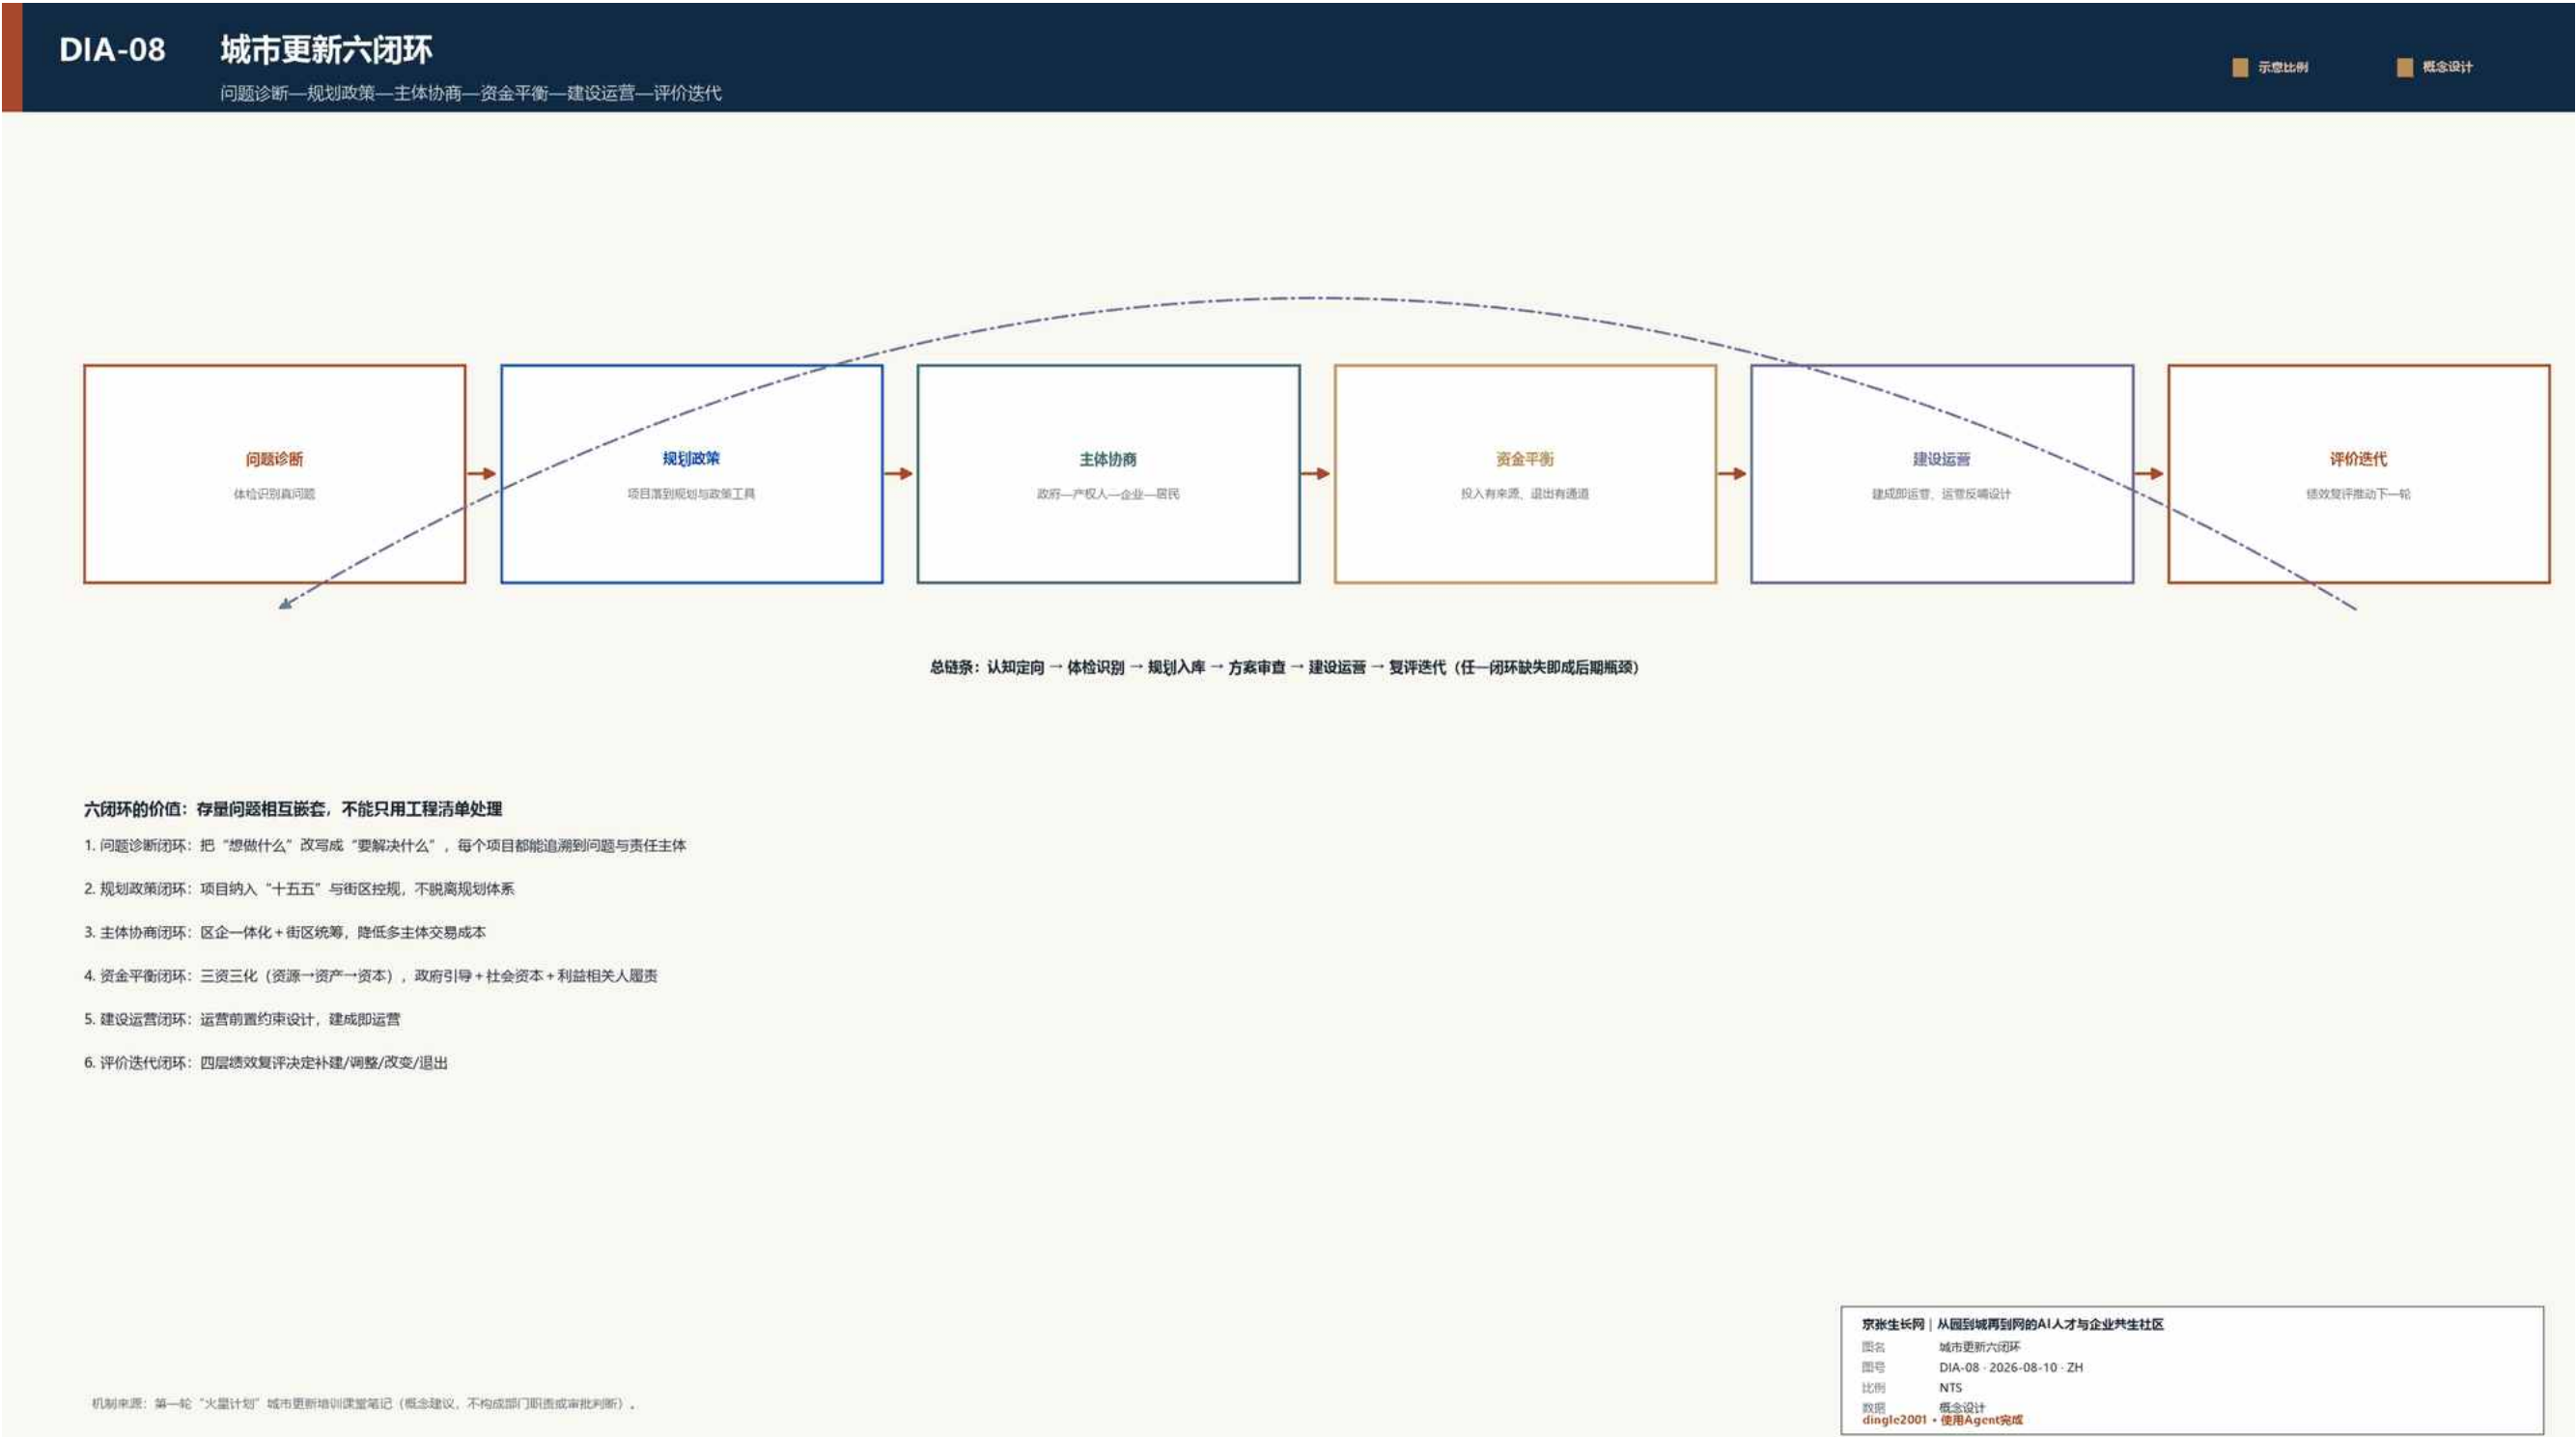


项目库与推进主线

项目库—更新计划—实施方案—联合审查—并联审批。

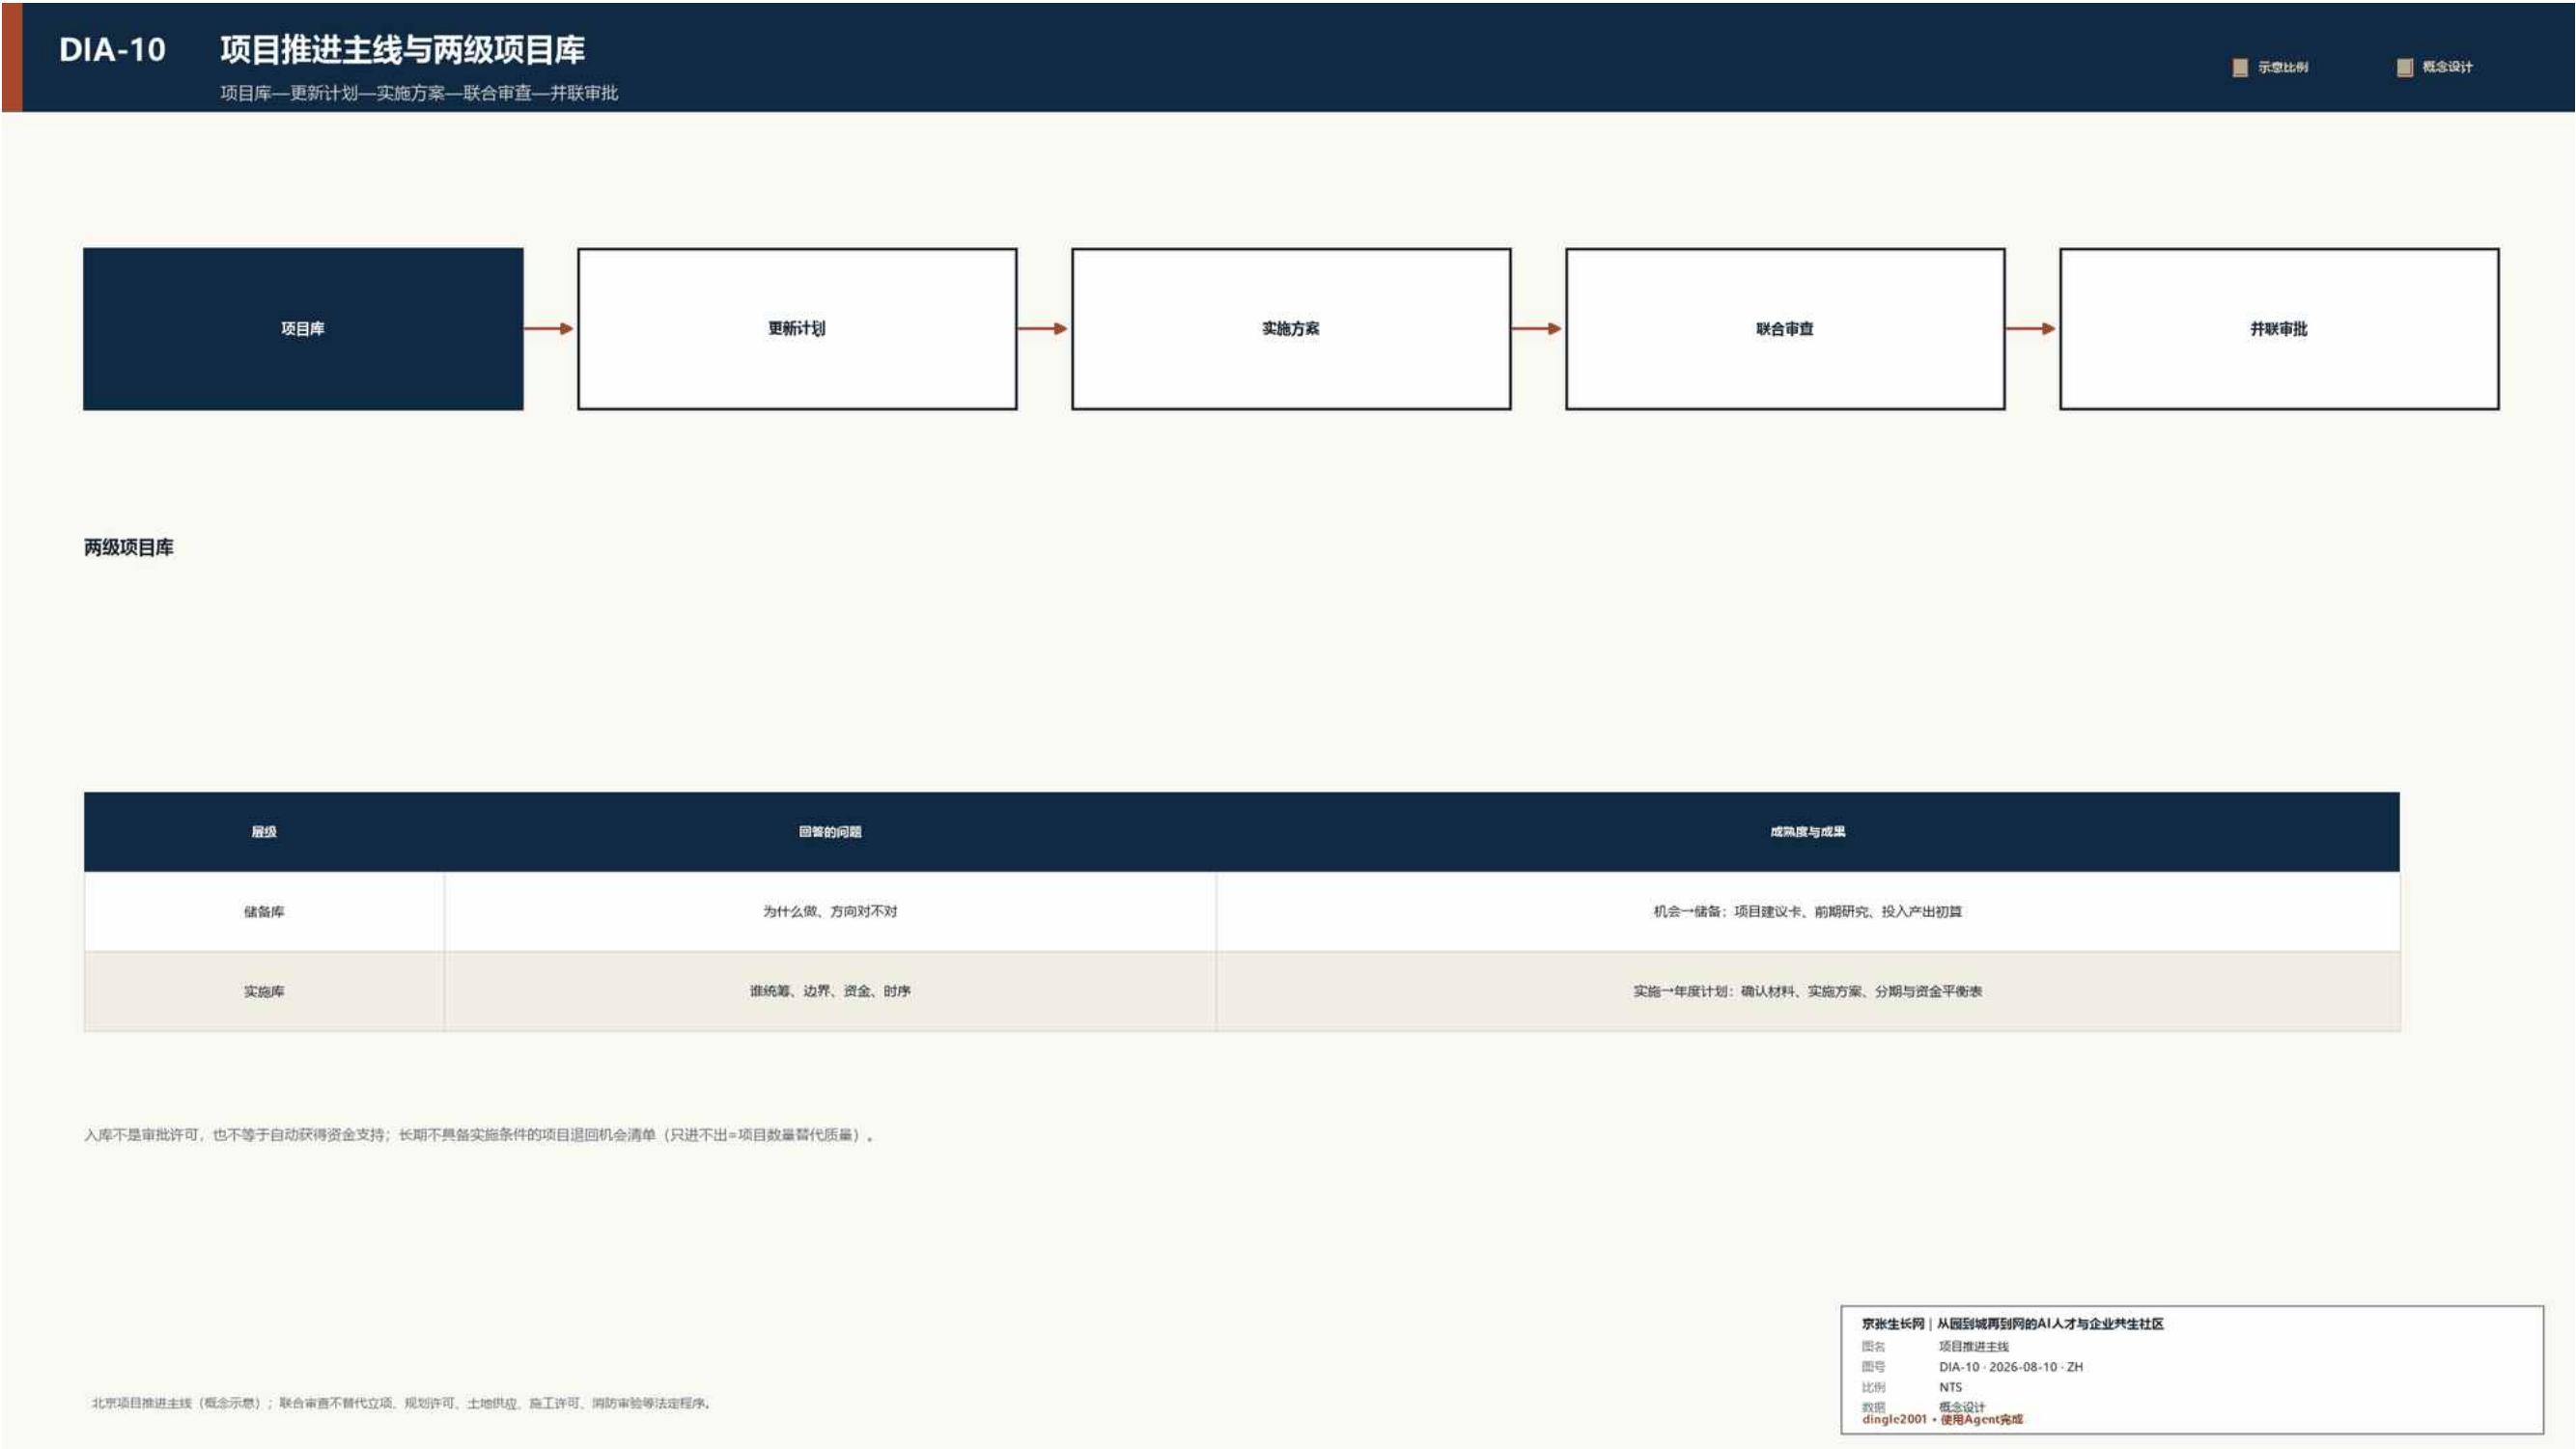


一图两表六清单

把规划、权属、建设、资金、运营和风险放到同一作业图。

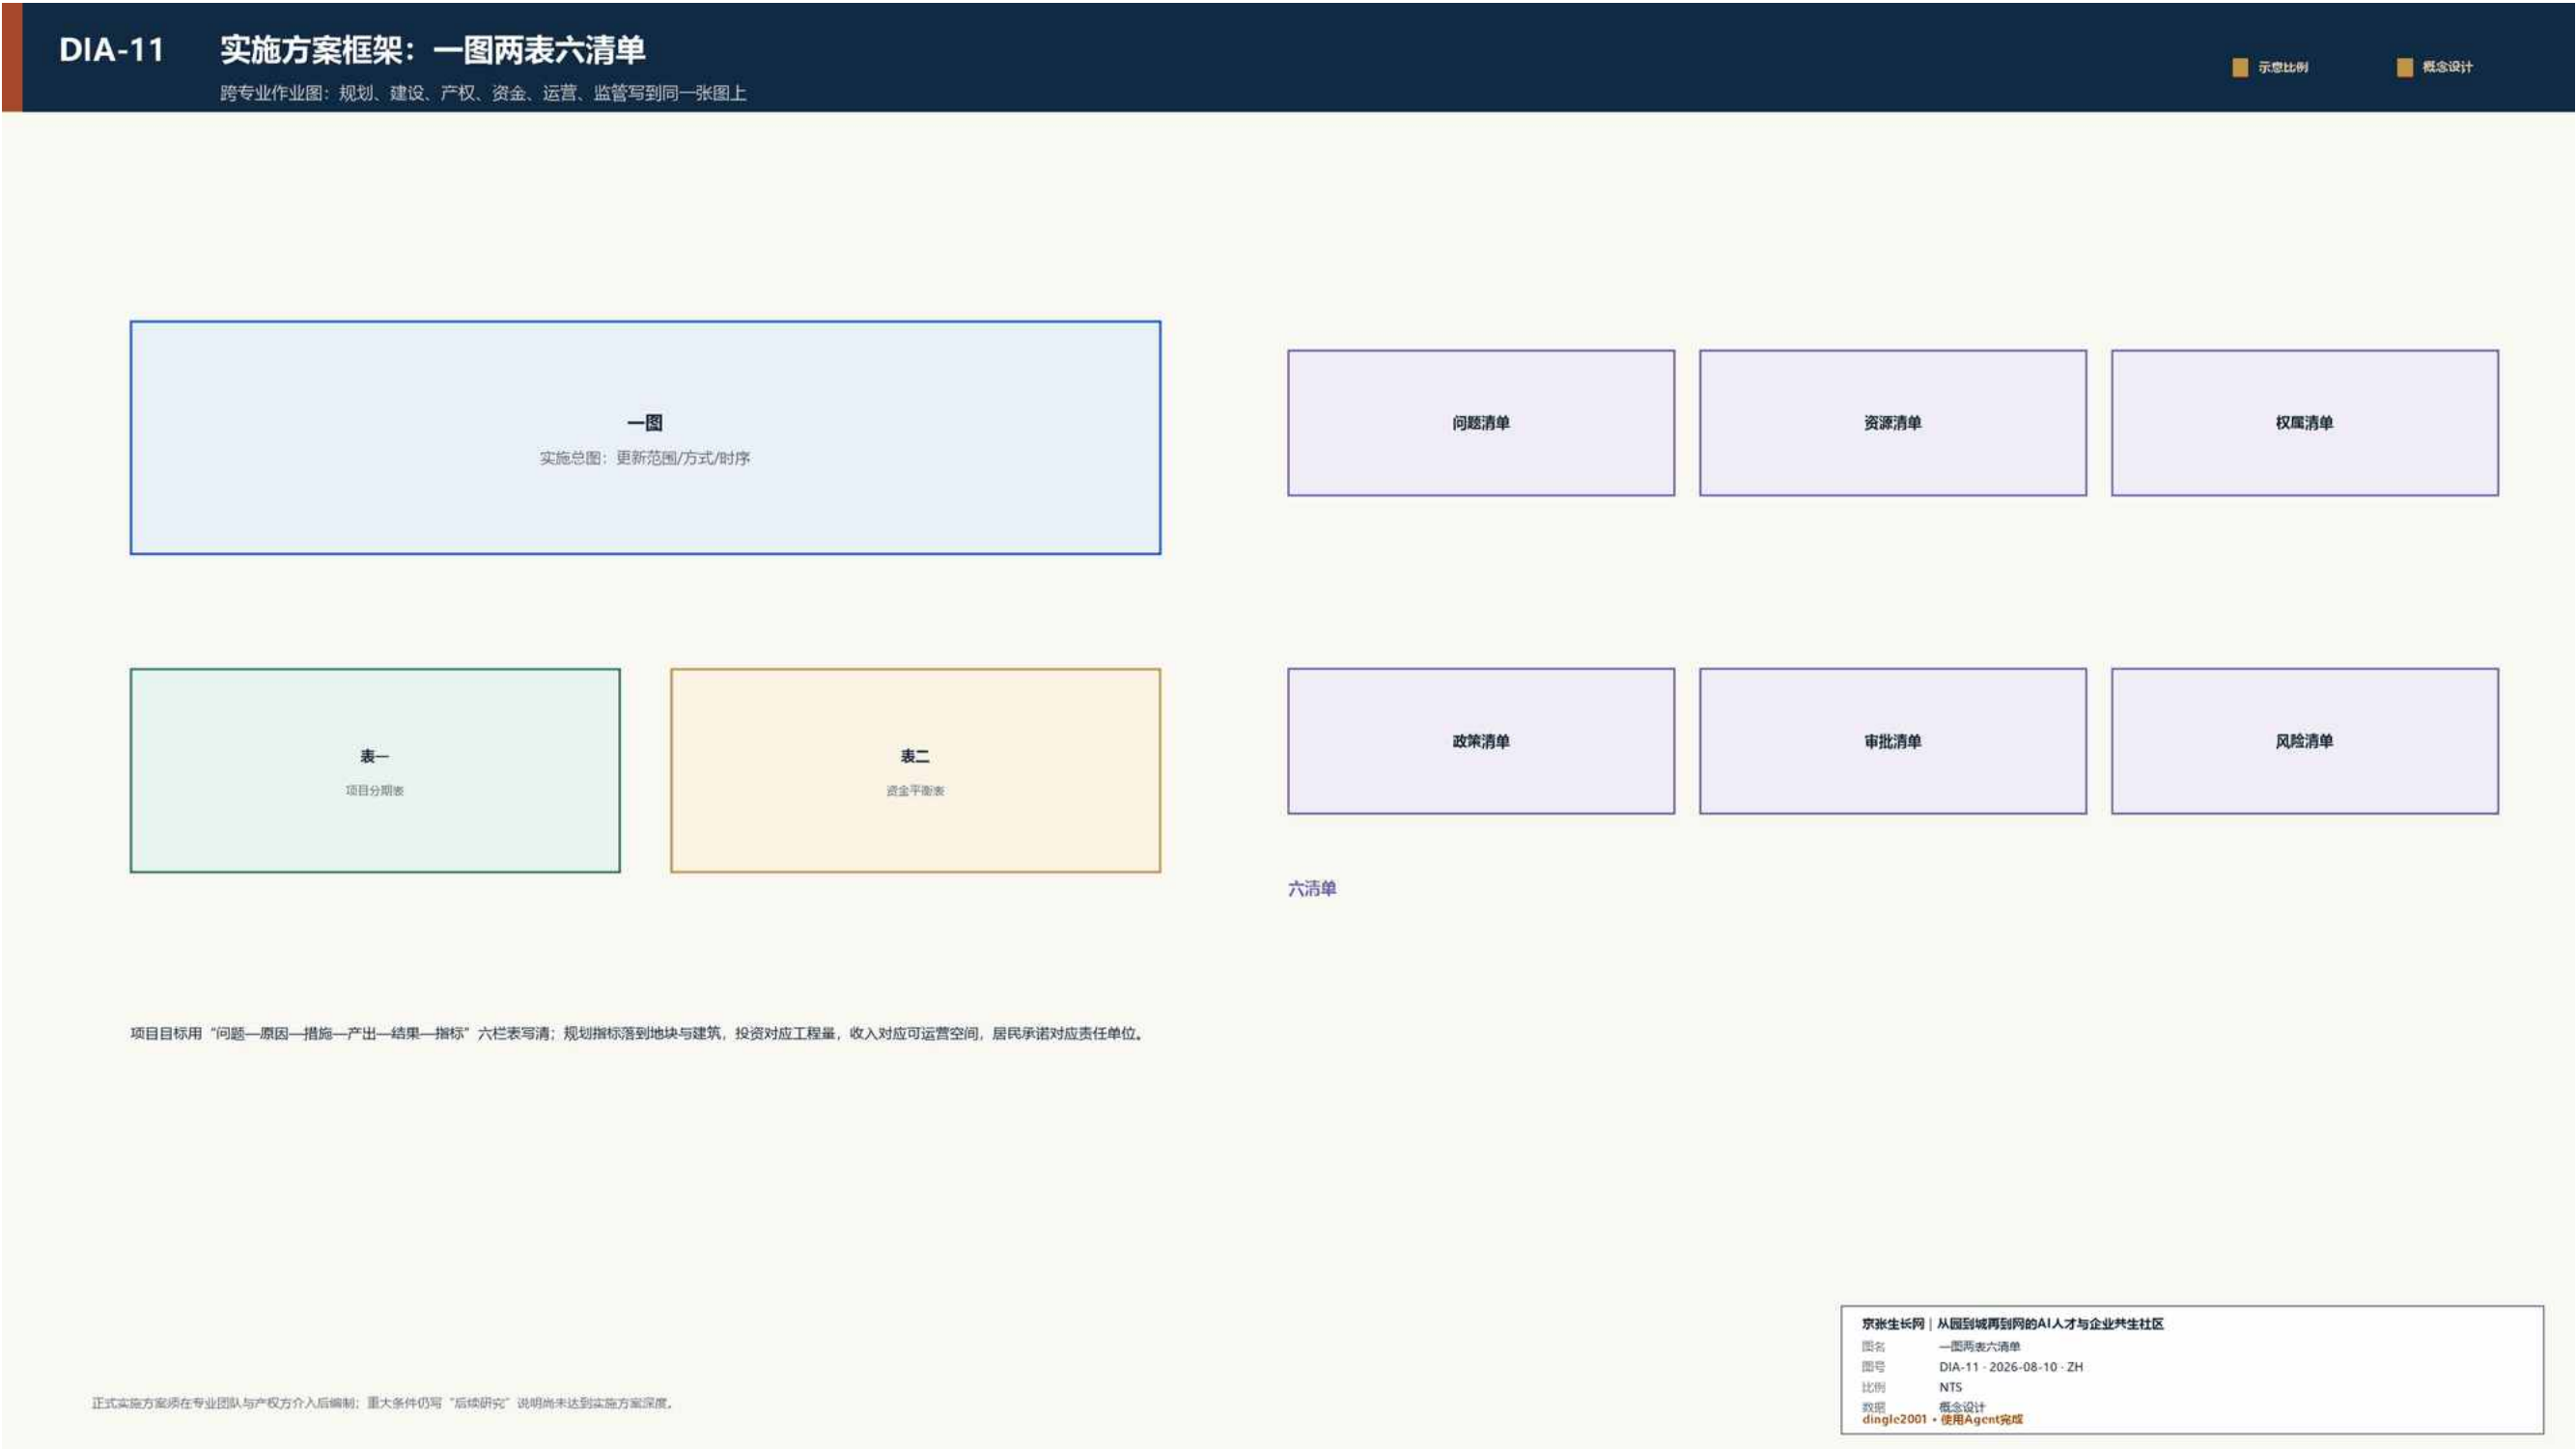


运营前置五阶段

定位、设计、投资、建设、交付均由未来使用和运营反向校验。

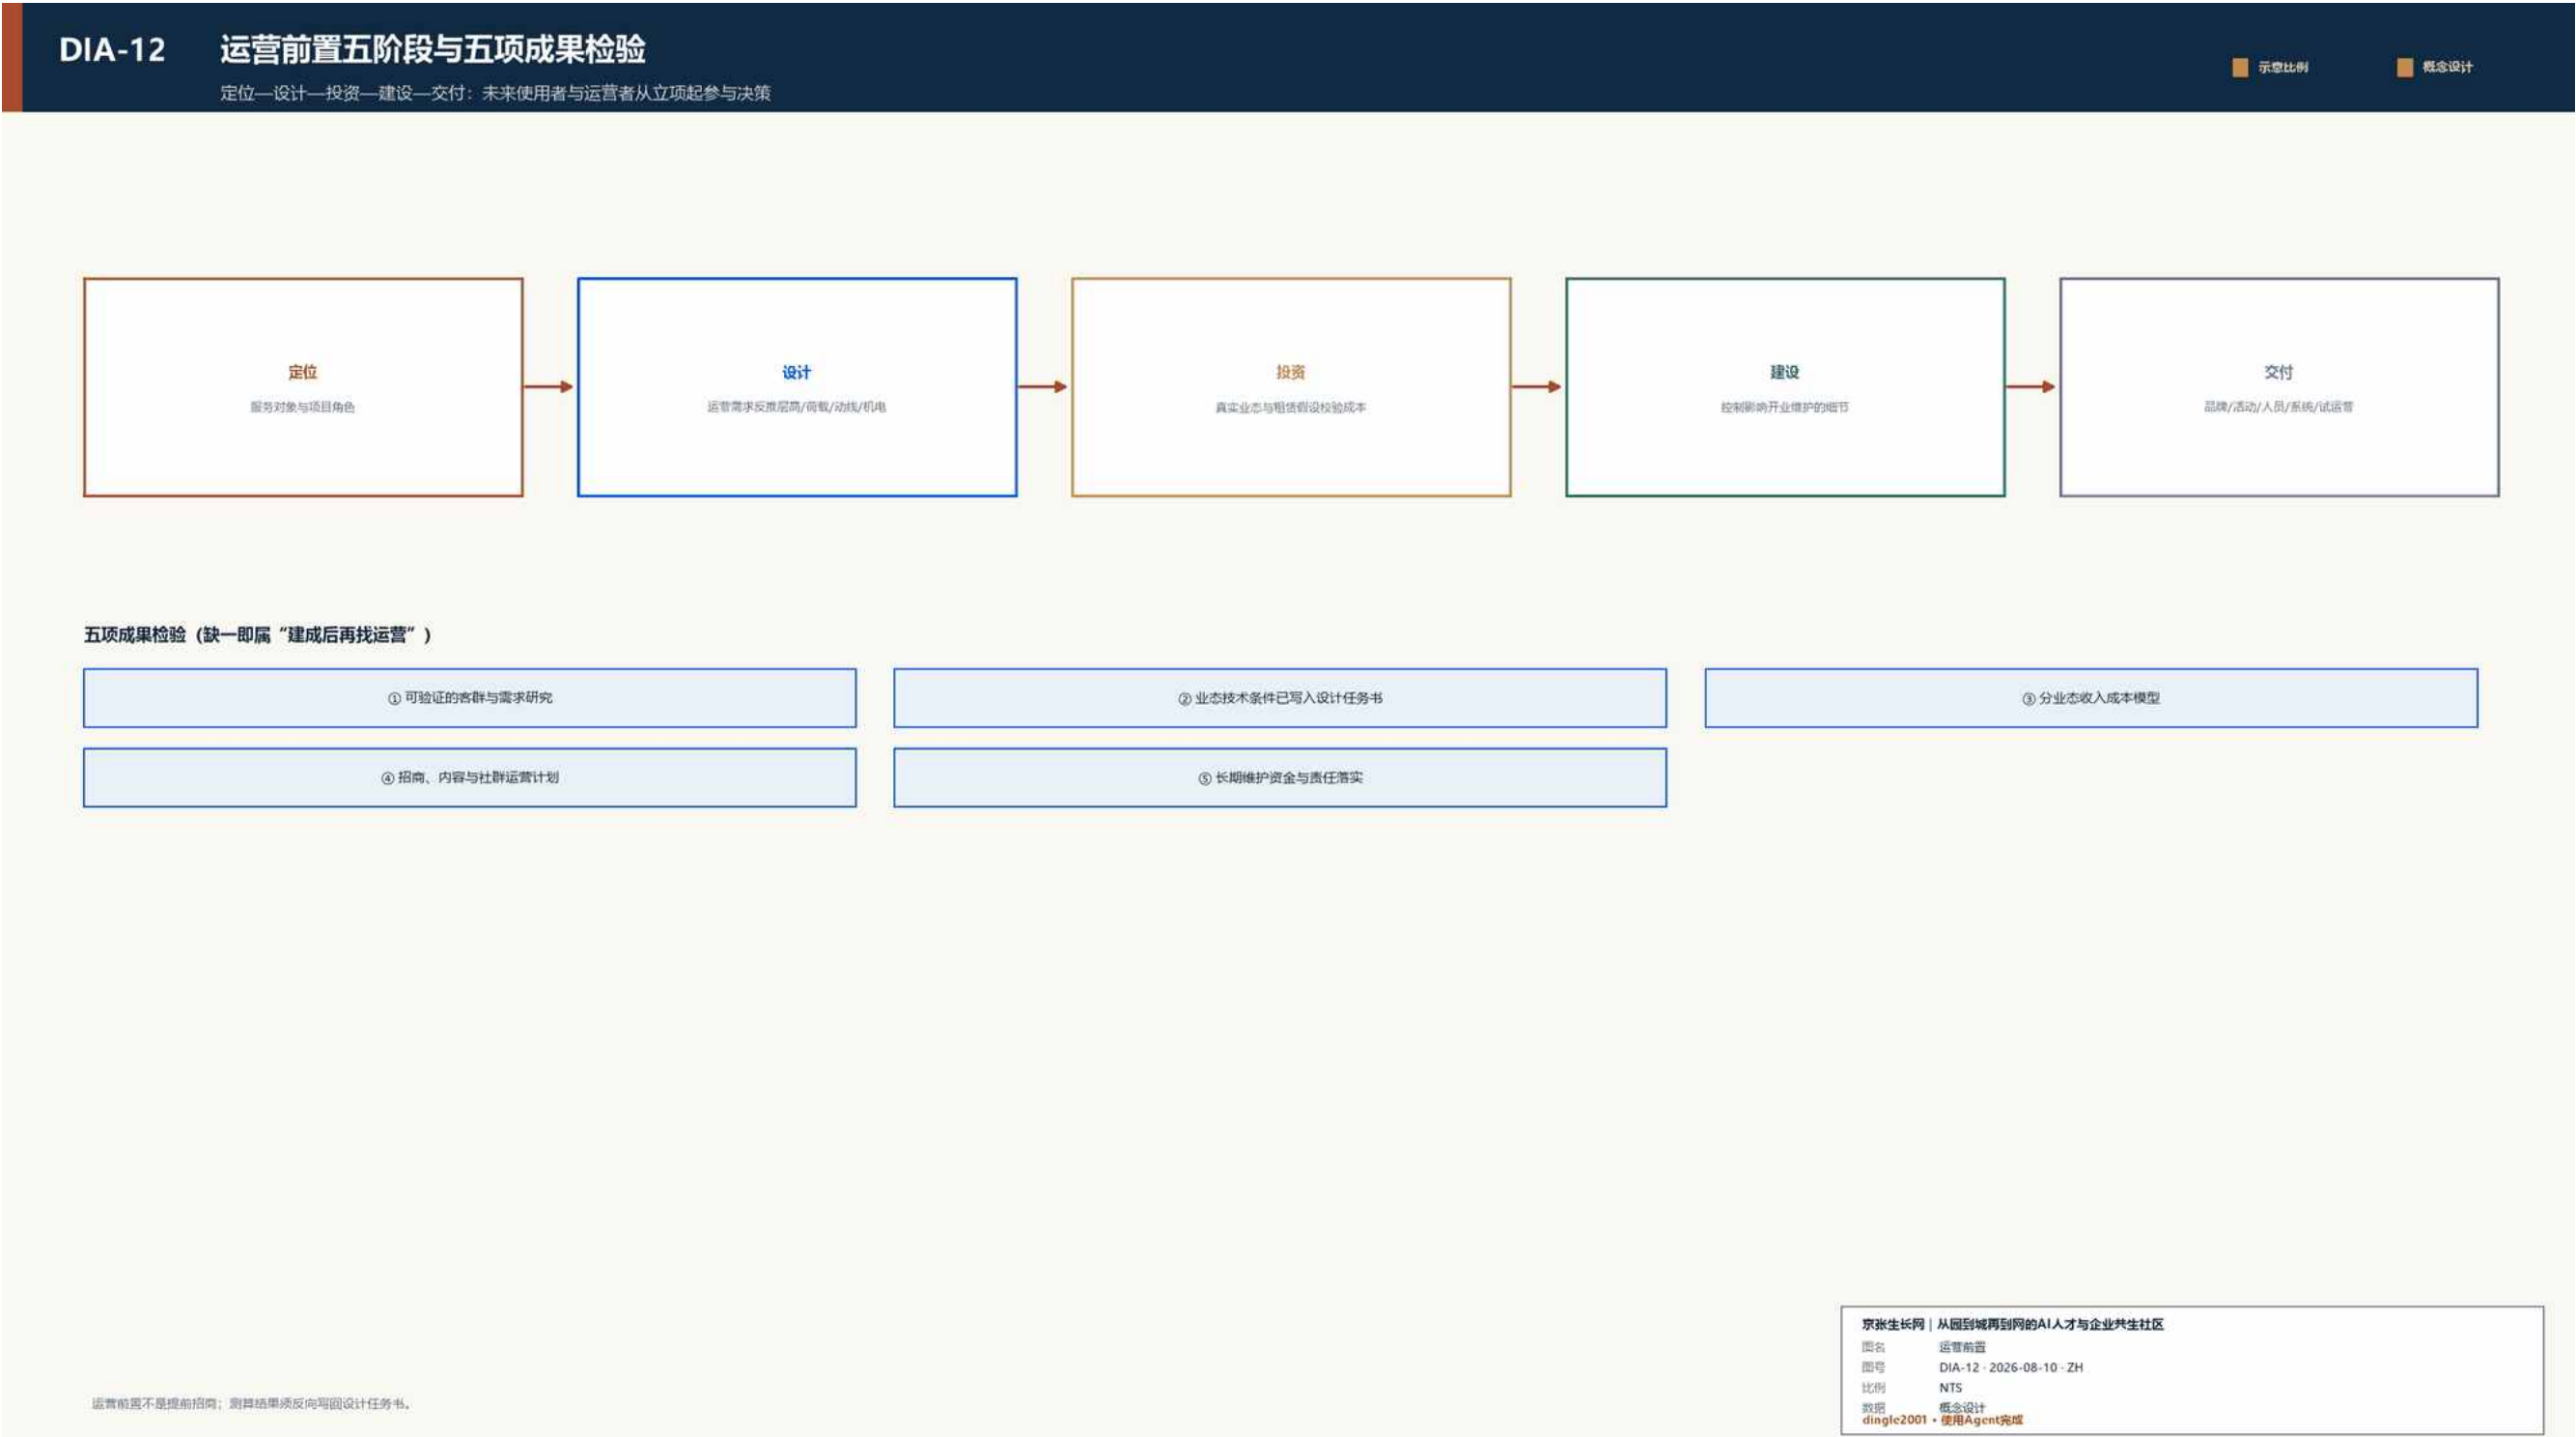

投融资与单位账户

公益、准公益、经营分账；不虚构总投资、租金或回收期。

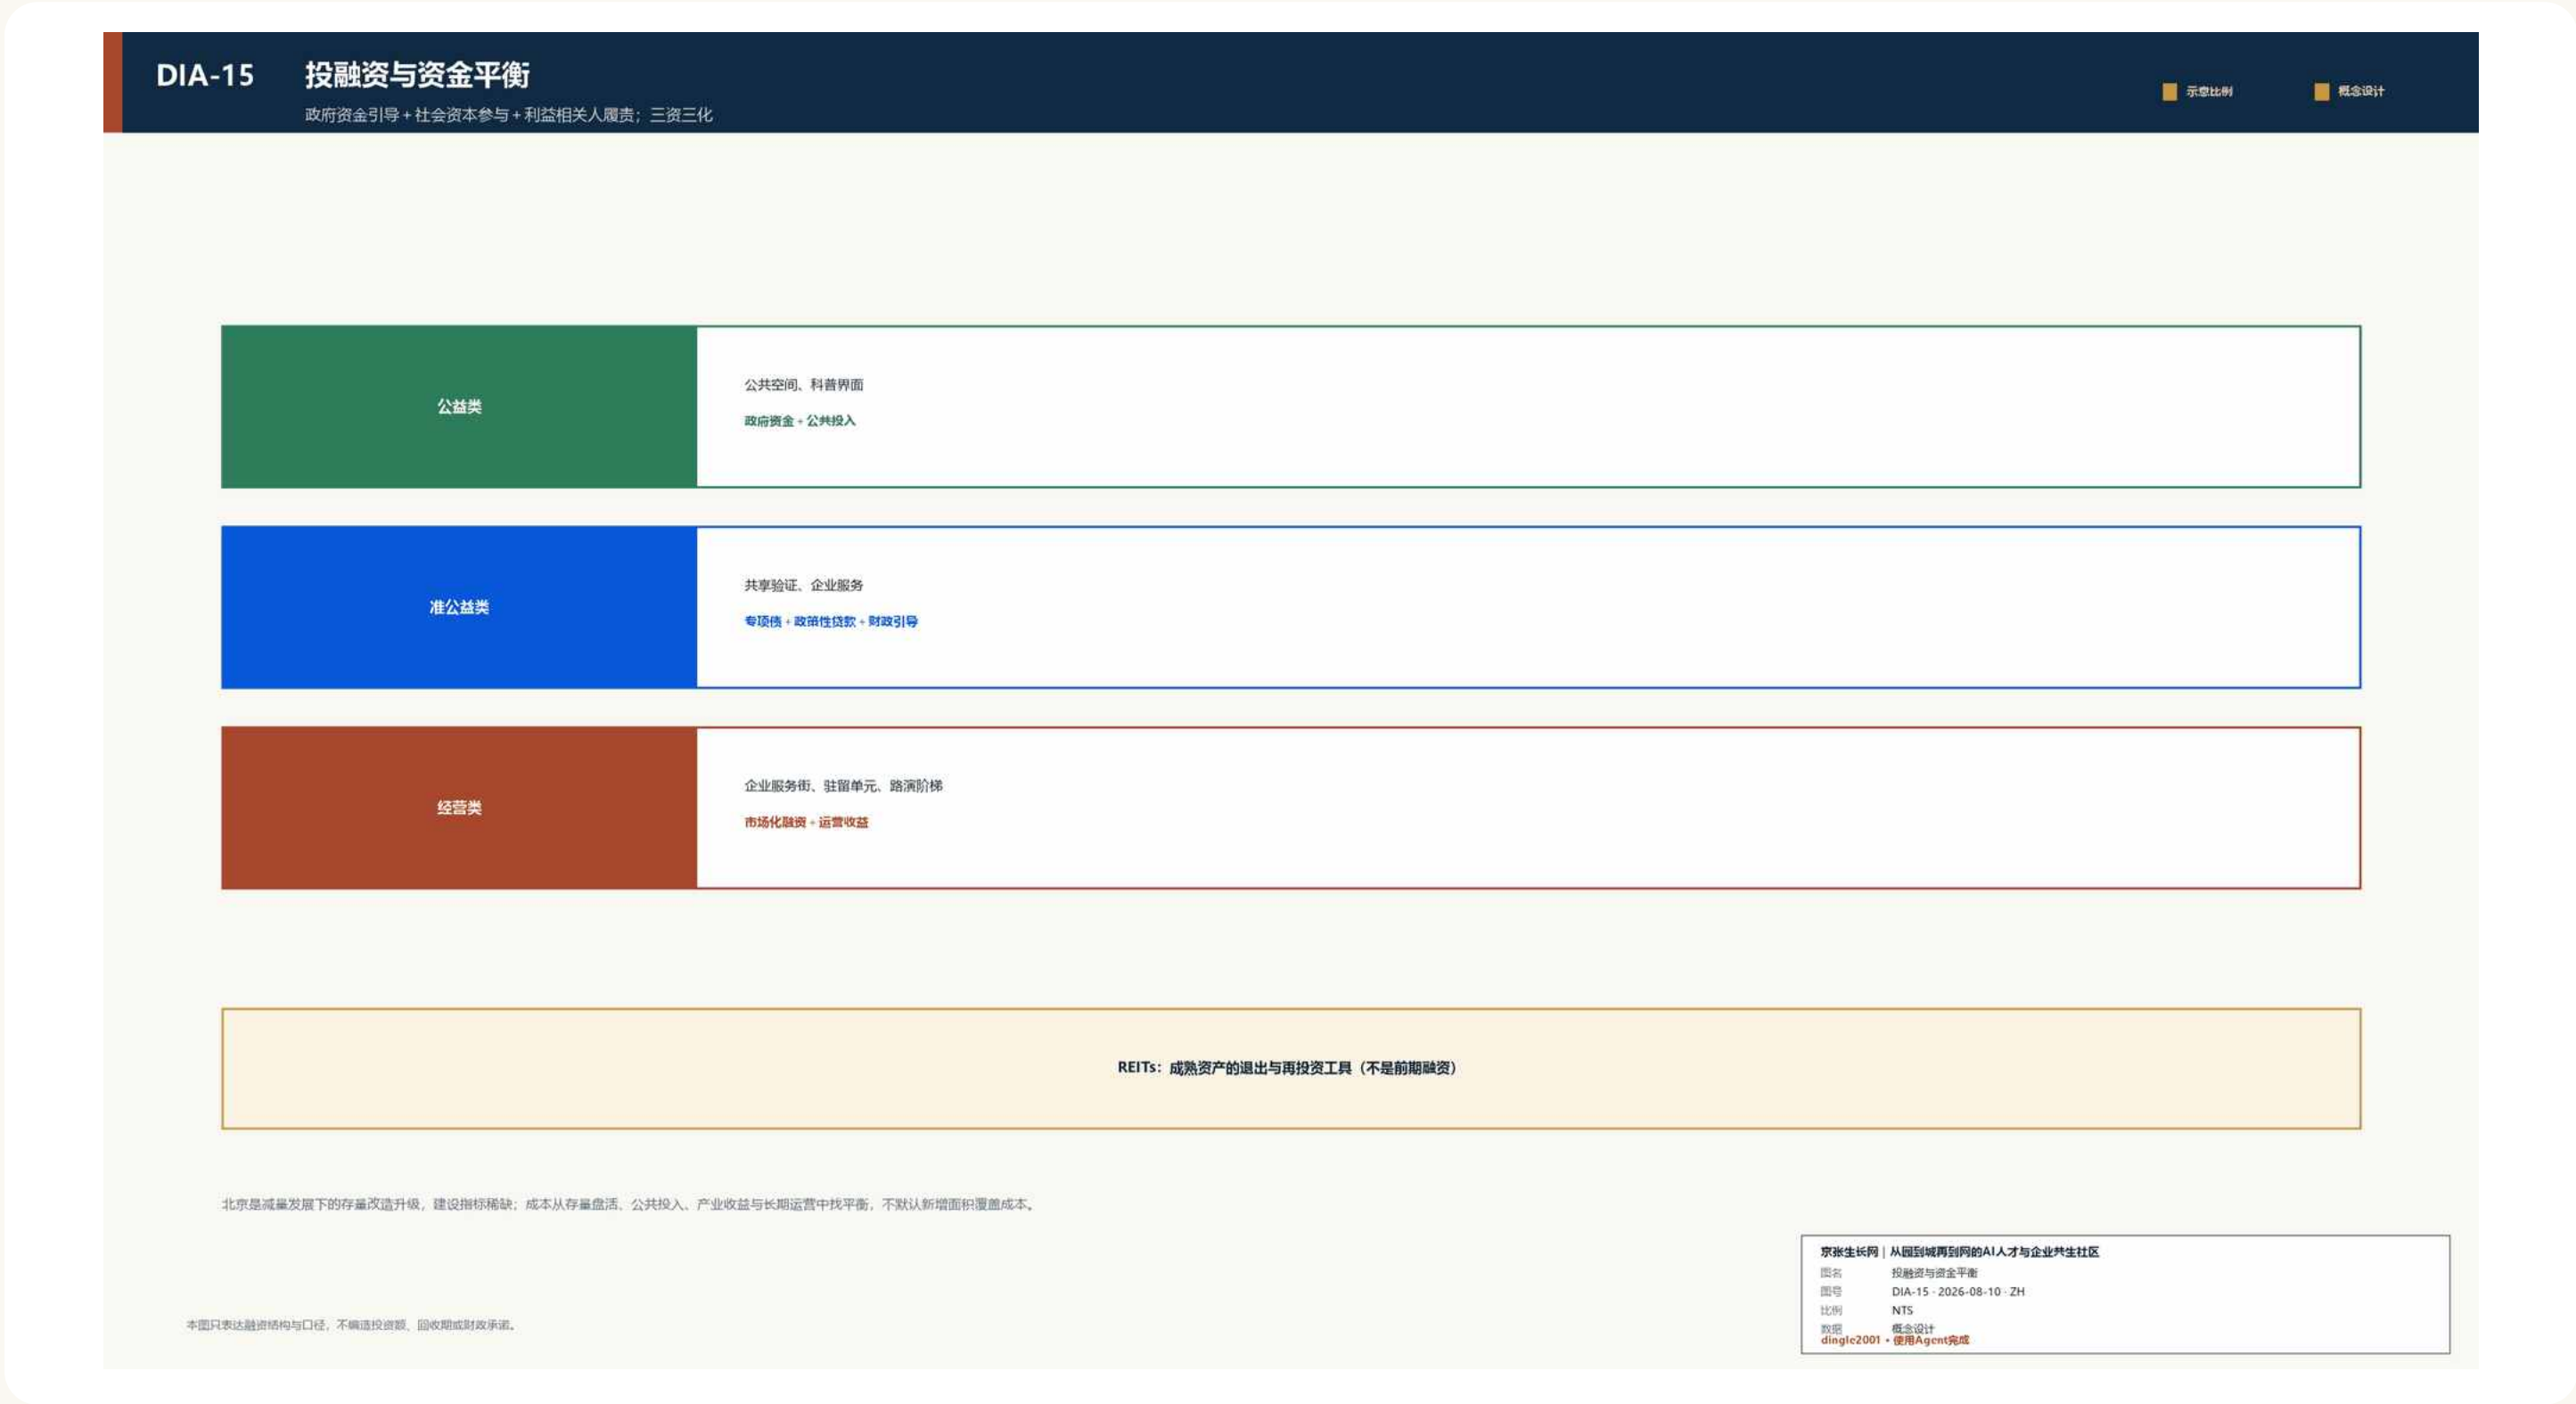

九十日最小可信试点

先验证规则、责任、人工接管、申诉和失败退出，再决定是否扩大建设。

D0—15

基线、权利、需求和风险登记；不清即停

D16—30

运营章程、数据分级、验收与申诉

D31—60

三项产业测试形成可复现实验单

D61—75

公共测试、无障碍、居民共治与首单

D76—90

匿名审计摘要和继续 / 调整 / 退出决策

开业前完整性演练

310个合成样例全部得到预期阻断 / 放行判断；这不是现场成效或政府验收。

七维体检

7份完整合同 + 42个删字段负样例 = 49例

12场景合同

12份完整合同 + 84个删字段负样例 = 96例

15项目合同

15份完整合同 + 150个删字段负样例 = 165例

判定


310 / 310符合预期；缺任一字段即退回清单 / 项目库

真实结果

0项；运行前保持空值，不用合成检查冒充现场绩效

长效运营与绩效复评

从物业运营到产业运营，以工程、使用、综合效益和可持续性四层复评。

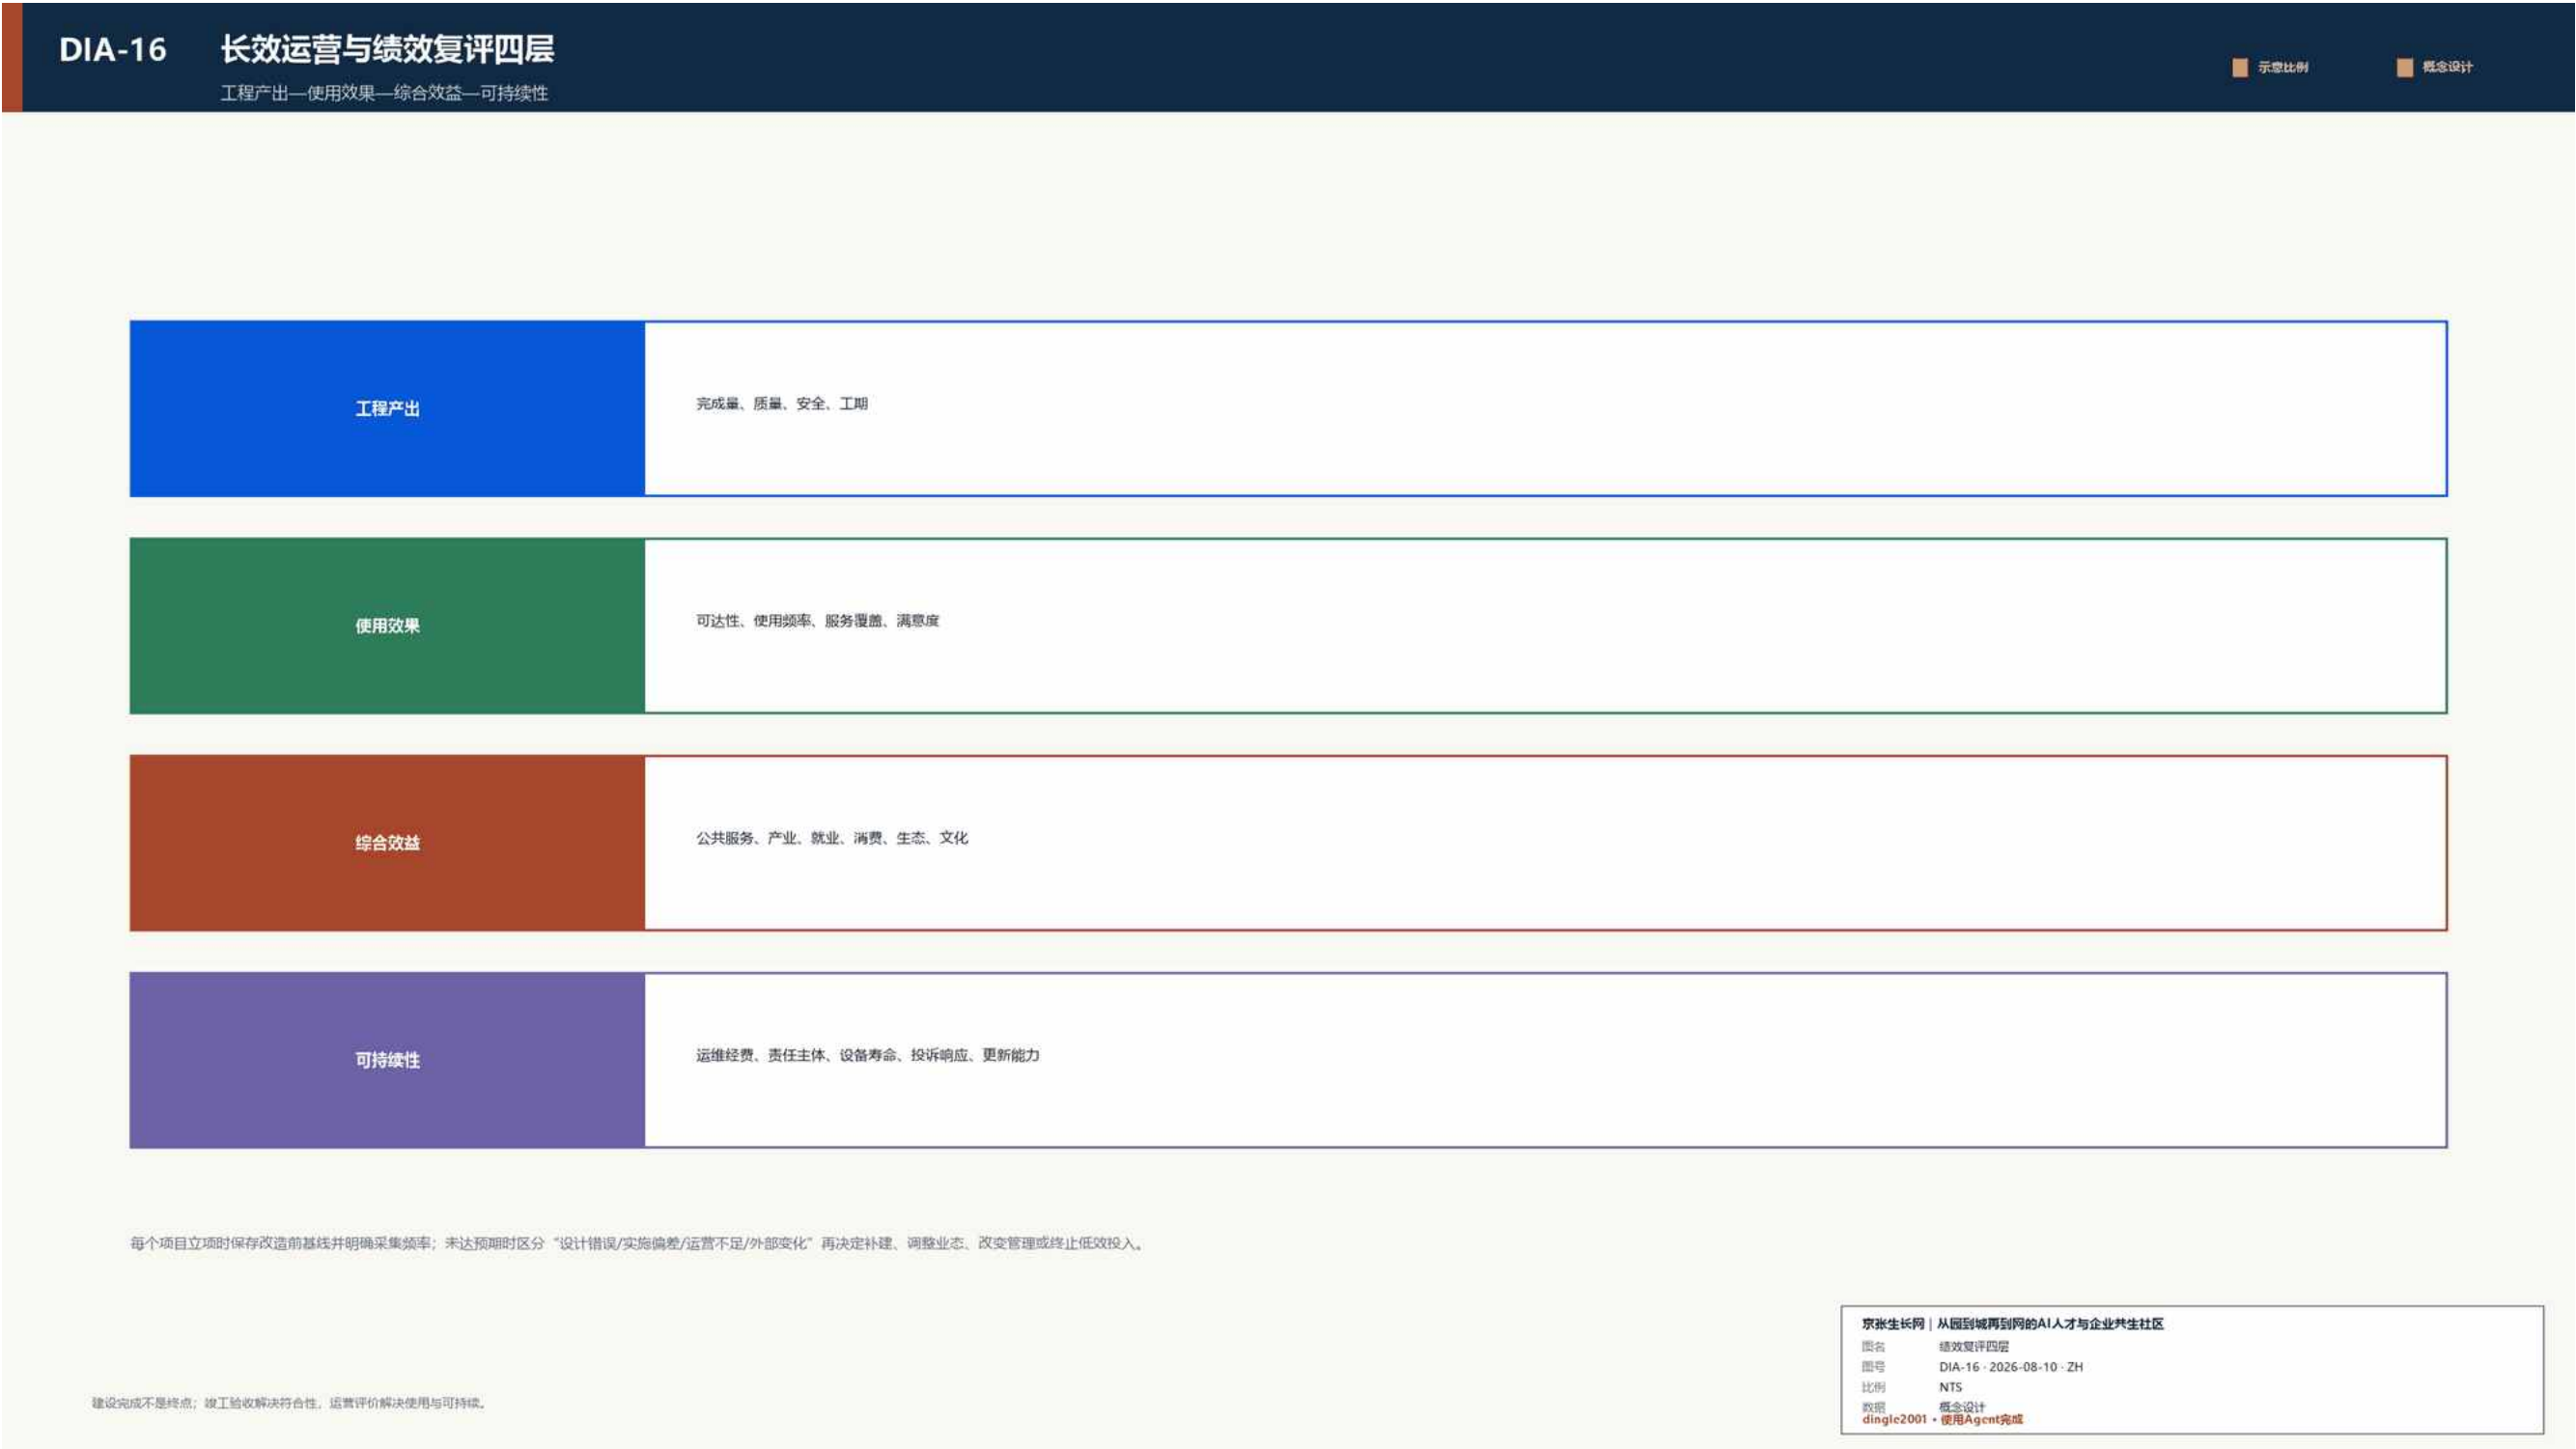

文化一 | 京张铁路：连接

自主建造、工程攻坚与线性连接构成公共叙事底图。

空间

遗产轴、构件索引、年代节点与观察界面

规则

先调查、后展示；不拆真建假、不过度商业化

活动

工程故事步行、开源里程碑和公众科普

文化二 | 中关村：接力

从电子一条街到科学城，把敢闯、容错、开放、共享转成空间制度。

空间

开源客厅、项目诊所、标准共创与首单大厅

制度

贡献记录、失败复盘、专业签发和公共回流

边界

不以个人英雄或企业Logo替代城市创新文化

文化三 | AI新文化：生长

开源协作、开发者社区与全球知识网络让生长过程可见。

记录

贡献、验证、首单、反哺四类可核验证据

传播

From Railway to Growth Mesh双语母题

权利

授权—验证—展示—撤回；不展示未经授权个人信息

公共节点命名与导视体系

沿“轨迹—原点—生长—交换”形成可记忆、可分级的名称系统。

京张轨迹

遗产步道、工程刻度、开源里程碑

原点里巷

共创厅、项目诊所、夜校、家庭支持站

生长门户

首单厅、合规站、路演阶梯、企业年轮

交换节点

两翼服务点、无障碍导览和全球节点墙

荣誉展示系统

展示公共贡献，不做商业评级、投资推荐或未经授权的品牌共现。

开源里程碑

许可清楚、可复核、具公共回流的贡献

全球节点墙

书面确认的协作节点和可撤回内容

企业生长年轮

匿名聚合验证、首单、成长与反哺阶段

流程

授权—验证—展示—年度复核—撤回

公共空间组件库

组件可组合、可维修、可拆除，基础可达优先于炫技。

A 可达

连续铺装、坡道、触觉与实体导视

B 停留

座椅、遮阴、照明、饮水与充电

C 遗产

构件展示柜、年代索引与可更换内容板

D 场景

可关闭接口、明确采集状态和线下兜底

E 运营

维护编号、责任人、巡检周期和更换记录

年度活动与开发者社群

活动服务于项目生成，不以场次和客流替代成果。

春 | 开放验证周

设备目录、三项产业测试和安全复盘

夏 | 原点开源季

项目诊所、驻留成果与代际共创

秋 | 首单与标准月

需求发布、验证、采购评估和标准共创

冬 | 京张开发者周

铁路文化策展、双语交换和年度复评

国际吸引与转化

国际化不是会展化，而是把双语问题、许可、验证和后续责任做完整。

入口

双语问题目录、无障碍信息和联系人

协作

开源许可、数据边界、导师回避与专业签发

转化

验证报告、首单评估、90日跟进和退出

边界

未经书面确认不使用机构名标或暗示合作

边界、责任与下一步

本方案可作为调查、论证和试点任务书，不是控规、施工图、资金承诺或政府审批。

立即可做

正式边界替换、七维调查、权利台账、需求访谈、90日协议

专业签发

规划、建筑、结构、消防、无障碍、交通、造价、法务与数据

禁止误读

企业参与、资源开放、投资额、租金、工期、政府承诺

复评

交付、运营半年、一年、三年按同口径复评



让主体生长

城市更新的上半场是让空间变新；下半场，是让主体生长。

Completed using Agent · concept proposal only
