

V4 评审导航：一个核心，完整证据

核心设计不变 · 当前证据与未来触发条件分离

1 · 3 · 6 · 12

一脊 · 三院 · 六门 · 十二场景

72 m²

可撤离城市校译 MVP

8 · 7 · 8

启动门 · RACI 角色 · 验收指标

16/16

结构检查 · 非现场结果

六项任务 / 31 个 REQUIRED OUTPUTS

agent.1

概念、品牌、空间统筹

一脊三院六门 + 双轨译括号

agent.2

全栈创新生态

六案例 + 三译院 + 五接口

agent.3

AI+ 场景

12 场景 + 3 验证 + 12 路径

agent.4

公共空间与地标

六组件 + 三地标 + 可撤离单元

agent.5

文化与国际传播

铁路 × 中关村 × 可解释 AI

agent.6

活动与长期运营

年度循环 + 回执 + 退出审计

当前证据

四门 PASS · 7/7 + 12/12 匿名合成

未来条件

9 项 trigger · owner · action · 当前阻断 = 否

TG-PILOT-01: 可逆 MVP 实施契约

启动 · 责任 · 异常 · 验收 · 退场

八项启动门

L1 场地/可撤离

L2 普通服务基线

L3 实名角色/RACI

L4 最小数据/权利

L5 专业安全

L6 异常/回退演练

L7 双语无障碍回执

L8 物理停止/公共复用

七角色 RACI — 供应方永不成成为放行责任人



最小数据

用途 + 最少内容 + 自选可达通道 + 八字段匿名回执
默认禁入姓名 / 面部 / 生物特征 / 连续位置

AI / 人工 / 无 AI

AI 草拟并暴露不确定性
人工放行、申诉、停止、退场
有人纸质通道始终保留

八项验收指标

普通服务1.0 · 接管≤120秒* · 撤回≤1班次*
回执8/8 · 六门6/6 · 合成12/12
停止1/1* · 禁入字段0

退场 → 公共复用

移除 AI / 凭据 / 缓存
保留服务台 / 安静申诉 / 无障碍导引 / 公共家具
无供应方锁定

* 未实测现场目标 · 现场状态 NOT_STARTED · 合成证据不是绩效

六项任务 → 31 个成果 → 可追溯证据

每项 REQUIRED OUTPUT 同时具有人类阅读路径和机器审计路径

agent.1

概念 / 品牌 / 空间统筹

一脊三院六门 · 双轨译话号 · 五接口

总览 + 识别 + compliance

agent.2

全栈 / 创新生态

六案例 · 三译院 · 五要素接口

重点区 + 案例来源 + metrics

agent.3

AI+ 场景

12 场景 · 3 验证 · 7 人物 · 12 路径

包容路径 + pilot plan + GeoJSON

agent.4

公共空间 / 地标

六组件 · 三地标 · 72m²可撤离单元

慢行蓝绿 + public space + landmarks

agent.5

文化 / 国际传播

铁路 × 中关村 × 可解释 AI · 双语导视

识别系统 + 版权 + 绿地证据

agent.6

活动 / 长期运营

年度循环 · 回执 · 维护与退场

分期 + pilot contract + 12周指标

京张译场：每项 AI 先成为可纠错的城市校样

一条公共基线 · 三座译院 · 六道非补偿校译门


城市先后顺序

永久：铁路记忆 / 慢行 / 蓝绿 / 无障碍

限时：可逆 AI 服务校样

缺一门 → 重译；普通服务继续

7/7 本地合成路径符合预期

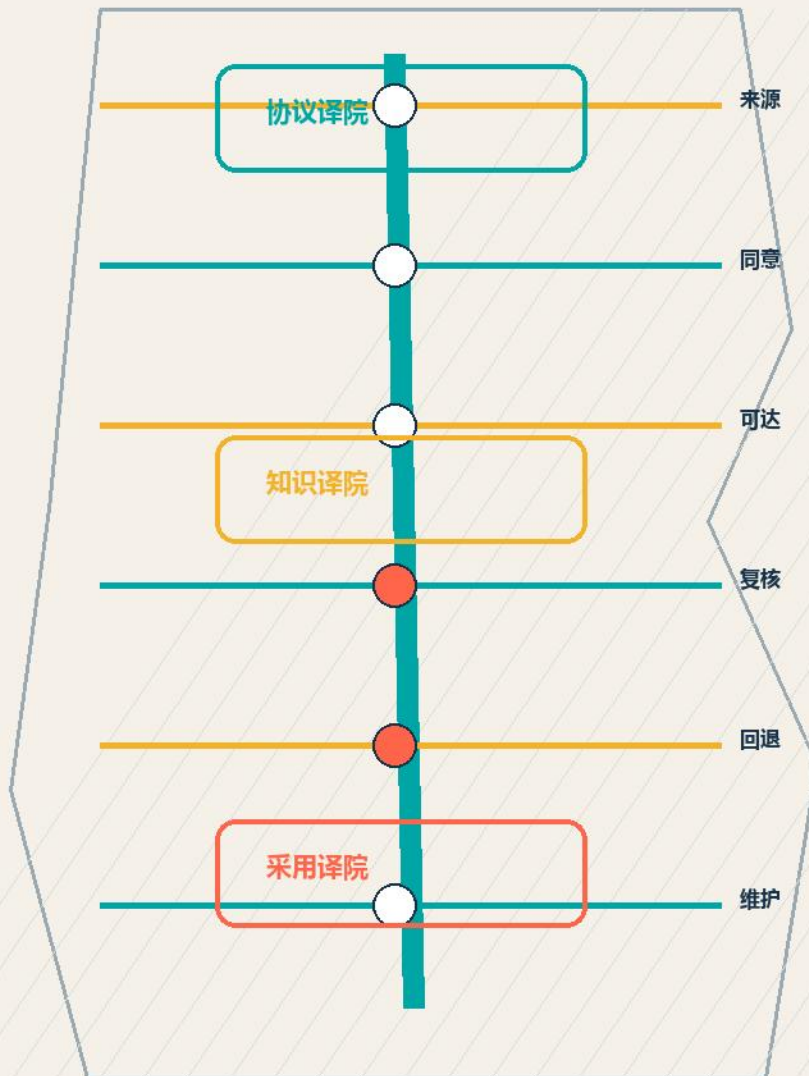

六门校译法

来源 · 同意 · 可达

复核 · 回退 · 维护

六项互不补偿

策略比选

× 单一科技展示带

× 三个孤立产业园

□ 同一协议贯穿研发—采用

五个区域接口

北纬 / 未来科学城 / 怀柔科学城

经开区 / 京津冀

仅概念输入输出，无合作承诺

TG-PILOT-01: 72 平方米可撤离校译单元

12m × 6m 设计原型 · 五区 · AI 拆除后普通服务继续

12.0 m



开放班次概念最低配置

- 2 名在场人员 (职责分离)
- 1 名专业复核员待命
- 1 台隔离终端
- 1 个物理停止键
- 2 套触觉 / 大字导引
- 1 个上锁证据柜

以上均为未实测概念目标，须由运营与专业团队校准。

五个运行状态

- S0 普通基线
- S1 隔离校译
- S2 影子平行
- S3 公众校样
- S4 决定 / 退场

城市校样回执：把退出权交还给使用者

八项字段 · 无姓名 · 无面部 · 无连续位置 · 无区块链身份

城市校样回执

TG · 04A7

1 匿名令牌

TG-04A7

2 服务目的

CROSS-LANGUAGE SERVICE / 跨语服务

3 六门状态

● ● ● ● ● ●

4 人工责任角色

SERVICE OPERATOR / 服务运营人

5 有效期

END OF CURRENT TRIAL CYCLE / 本轮结束

6 普通服务路径

STAFFED COUNTER Z1 / Z1 人工窗口

7 申诉路径

QUIET DESK Z5 / Z5 安静申诉

8 回退状态

READY / 可立即恢复

返回重译

六门不补偿

01 来源

02 同意

03 可达

04 复核

05 回退

06 维护

物理停止键

无需供应方许可，立即把校译单元恢复为普通服务。

六类包容性路径：校译服务，不识别人


12 条匿名合成用例 · 12 个预期判断 · 0 名真实参与者

合成人物	必要通道	通道存在	通道缺失
无智能手机居民	纸质 + 人工	可进入校样	返回重译
轮椅访客	无台阶 + 人工	可进入校样	返回重译
低视力研究者	音频 + 大字	可进入校样	返回重译
国际访客	双语 + 人工	可进入校样	返回重译
青年 + 监护人	监护告知	可进入校样	返回重译
初创测试者	技术日志 + 人工	可进入校样	返回重译

12/12 只表示规则结果符合预期，不代表公众认可或现场绩效。

识别系统：双轨译括号

一个原创符号 · 三种城市状态 · 不使用官方徽记

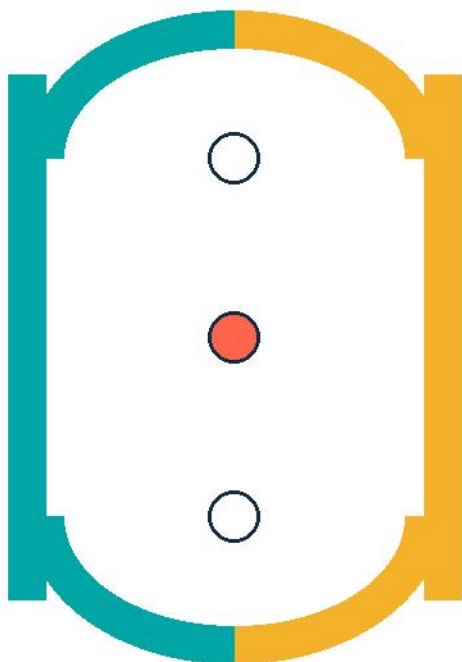

京张译场

先校样，再采用

中英文字标

TRANSLATION GROUNDS

京张译场

颜色契约



TRACEABLE / 可追溯



STOP / 停止



HUMAN JUDGMENT / 人的判断



ORDINARY BASE / 普通基线

三种应用状态

等待校样

返回重译

普通服务开放

本识别系统为方案原创，不是政府徽记、审批标志或官方背书。


三座译院：同一校译协议，三种空间职责

序列 + 概念断面 + 首证据 + 停止条件 + 普通服务基线

众智园 | 协议译院

模型门诊 → 隔离测试庭

失败展廊 → 协议签发台



2.4m 通行 / 1.8m 服务 / 2.4m 停留

首证据：失败样本 + 复测条件

停止：来源 / 隔离 / 安全责任缺失

基线：人工登记 + 线下技术评审

AI 原点 | 知识译院

成果街 → 权利台

共享中试 → 开放发布阶



2.4m 通行 / 1.8m 服务 / 2.4m 停留

首证据：来源—许可—撤回版本链

停止：权利或维护责任不清

基线：纸质咨询 + 普通展廊

大钟寺 | 采用译院*

普通服务台 → 平行校译台

公众校样庭 → 申诉回退廊



2.4m 通行 / 1.8m 服务 / 2.4m 停留

首证据：人工接管 + 服务恢复演练


停止：转人工 / 申诉 / 普通通道失败

基线：有人值守普通服务台

* 临时重点区尚未锚定大钟寺站；不表示工程线位

公共翻译层：永久城市基线先于 AI

完整共享边界分区 · 三层空间产业融合 · 资源等级

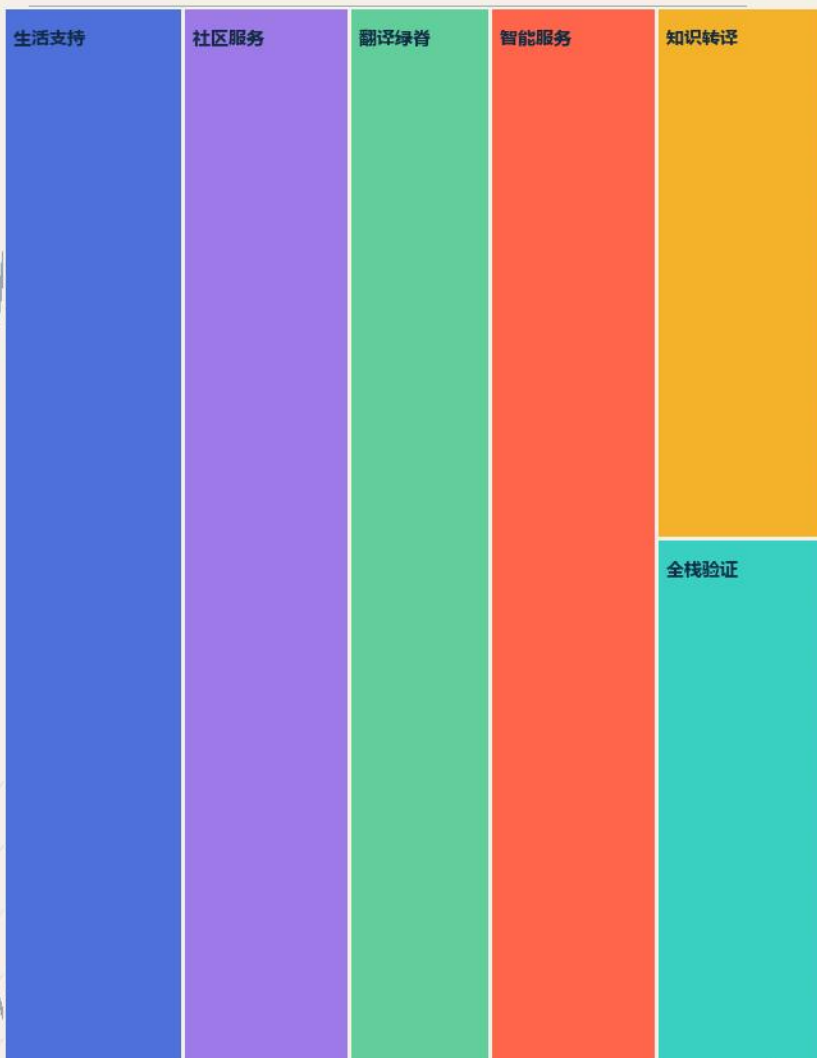

空间产业融合

研发证据 → 知识包 → 公共采用
公共翻译层始终保留普通城市功能

R0

流程 / 人员 / 纸质材料

R1

可撤家具 / 标识 / 离线终端


R2

建筑 / 市政 / 系统接口，待审批

法定 FAR / 高度 / 密度 / 退线：待正式资料

六门校译路径：任一缺失即恢复普通服务

慢行蓝绿基线 + 东西公共门 + 无障碍 / 申诉 / 物理停止

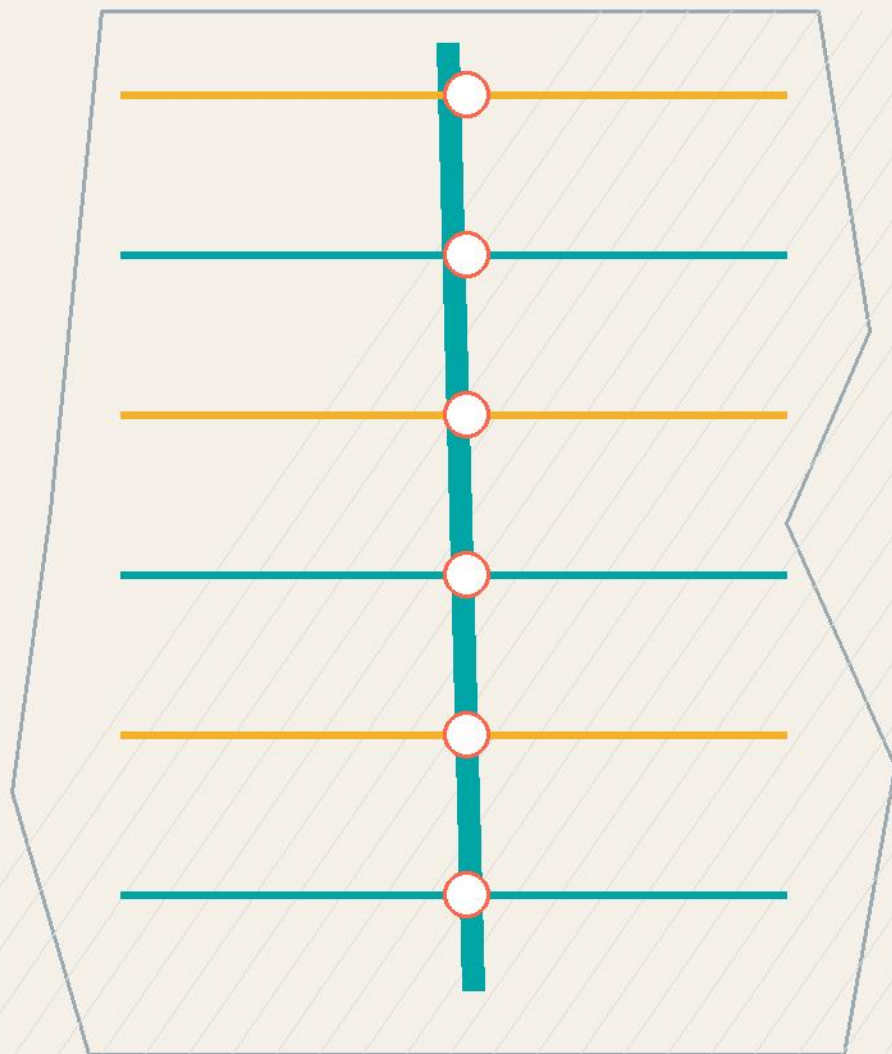

01 来源

02 同意

03 可达

04 复核

05 回退

06 维护

不是道路红线、桥隧或轨道工程方案

普通服务基线

有人值守
纸质 / 离线
无障碍连续
AI 拆除后仍运行

六类停止

来源不清 / 撤回失效
可达中断 / 人工接管失败
回退失败 / 无维护责任
→ 返回重译

最小城市校样：采用之前先可计量

设计常数 · 合成校验 · 尚未实测的现场目标

72 m²

可撤离校译单元

5

运营状态

8

回执字段

12/12

合成旅程

五态证据梯子

S0

普通服务基线

S1

隔离校样

S2

影子平行服务

S3

公众校样

S4

采纳 / 重译 / 退场

当前可复算

- 8/8 项试点计划结构检查
- 12/12 条匿名合成旅程
- 7/7 条六门合成路径
- 0 名真实参与者、0 条现场观测

必须现场实测

- 普通服务可用率目标 = 1.00
- 人工接管 ≤ 120 秒概念目标
- 撤回确认 ≤ 1 个开放班次
- 选址、运营方、预算与审批：均待落实
